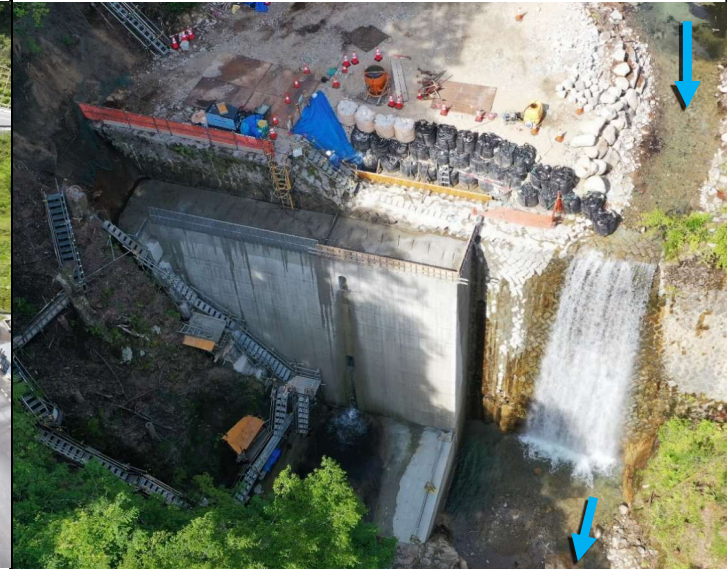


工事進捗状況（令和7年5月末）

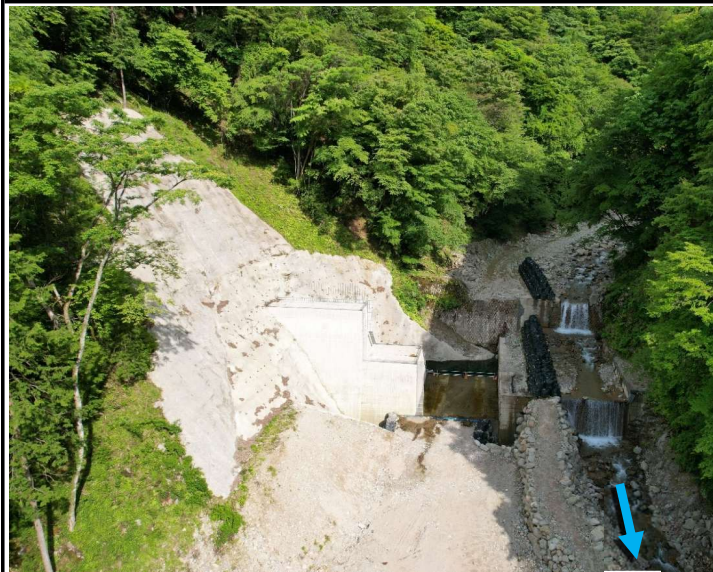
中津川出張所

①		②		③		④	
工事名	令和6年度 木曽川水系和田沢第2砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 木曽川水系中津川護岸整備工事	工事名	令和6年度 木曽川水系アラクラ沢砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 木曽川水系正ヶ根第2砂防堰堤改築工事
工期	当初 R6. 8. 20～R7. 3. 14 変更 R7. 6. 30	工期	当初 R6. 8. 20～R7. 3. 19 変更 R7. 6. 30	工期	当初 R6. 8. 24～R7. 3. 19 変更 R7. 7. 31	工期	当初 R6. 10. 10～R7. 6. 30 変更
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)中島工務店
今月作業	道路工 As舗装工・防護柵工	今月作業	巨石積・路体盛土・仮設工	今月作業	砂防土工、コンクリート堰堤工、流路護岸工、排水構造物工	今月作業	堰堤本体工
来月作業	片付け 準備工	来月作業	As舗装工 防護柵工 片付け	来月作業	砂防土工、コンクリート堰堤工、道路土工、舗装工	来月作業	堰堤本体工 堤冠コンクリート
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 中津川出張所管内整備工事	工事名	令和6年度 木曽川水系新梨沢砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 木曽川水系荒道谷砂防施設改築工事	工事名	令和6年度 木曽川水系地獄谷除石工事
工期	当初 R6. 12. 13～R7. 11. 28 変更	工期	当初 R7. 4. 1～R8. 1. 30 変更	工期	当初 R7. 4. 1～R8. 1. 30 変更	工期	当初 R7. 4. 1～R8. 1. 30 変更
受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	(株)鳴海組	受注者名	(株)吉川工務店
今月作業	砂防教室、四ツ目遊砂工整備、天王平道路拡幅	今月作業	準備工、砂防土工、仮設工	今月作業	側壁工 床堀・型枠・打設	今月作業	準備工 伐採・機材搬入
来月作業	砂防教室、湯舟沢安全施設整備 等	来月作業	砂防土工、法面工	来月作業	側壁工・水叩き 型枠・打設	来月作業	仮水路工 掘削工 運搬 クレーン運搬
							

工事進捗状況（令和7年5月末）

中津川出張所

⑨							
工事名	令和7年度 木曽川水系本谷砂防堰堤施設改築工事	工事名		工事名		工事名	
工期	当初 R7. 5. 12～R8. 2. 27 変更	工期		工期		工期	
受注者名	(株)鳴海組	受注者名		受注者名		受注者名	
受注金額	当初 165,000,000 変更	受注金額		受注金額		受注金額	
進捗率	予定 1.1 実施 1.1 差 0.0	進捗率		進捗率		進捗率	

今月作業	準備工				今月作業					今月作業					今月作業				
来月作業	準備工、構造物撤去工、仮設工				来月作業					来月作業					来月作業				
懸案事項等	側壁工の人工地山（砂防ソイルセメント）施工について工務第一課からの回答待ち。				懸案事項等					懸案事項等					懸案事項等				
																			
工事名					工事名					工事名					工事名				
工期					工期					工期					工期				
受注者名					受注者名					受注者名					受注者名				
受注金額					受注金額					受注金額					受注金額				
進捗率					進捗率					進捗率					進捗率				
今月作業					今月作業					今月作業					今月作業				
来月作業					来月作業					来月作業					来月作業				
懸案事項等					懸案事項等					懸案事項等					懸案事項等				

①		②		③		④	
工事名	令和6年度 妻木出張所管内整備工事	工事名	令和6年度庄内川水系星ヶ台砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 庄内川水系富士下第2第3寺下第3砂防堰堤改築工事	工事名	
工期	当初 R6. 12. 2 ~R7. 11. 28 変更	工期	当初 R7. 4. 1~R7. 12. 19 変更	工期	当初 R7. 5. 26 ~R8. 2. 27 変更	工期	当初 変更
受注者名	(株) 藤本組	受注者名	(株) 吉川組	受注者名	(株) 藤本組	受注者名	
今月作業	鍛冶ヶ入_防草工、市之倉第3・4_防草工	今月作業	準備工、仮設工、工場製作工	今月作業	施工計画、準備工	今月作業	
来月作業	市之倉第3・4_防草工、深山谷第1_防草工、転落防止柵工、各所_砂防施設標識設置	来月作業	工場製作工、構造物撤去工、仮設工	来月作業	仮設工、コンクリート堰堤工	来月作業	
指示：9【鍛冶ヶ入整備】防草シート・かごマット		星ヶ台公園【仮設工】敷鉄板等設置		寺下砂防堰堤			
 指示：11【市之倉第3・4】防草シート							
				 富士下第3砂防堰堤		 富士下第2砂防堰堤	

星ヶ台：職員の見学随時受付中！事務所から約2.5km



砂防堰堤をつくり土砂災害を防ぎます



工事進捗状況 (令和7年 5月末)

上松出張所 NO.1

① 工事名 令和6年度 木曾川水系 小梨子沢第4砂防堰堤流路工事 工期 当初 R6.8.19～R7.3.14 変更 R7.10.31 受注者名 木曾土建工業(株) 今月作業 側壁工(掘削、型枠、打設)、水叩工(型枠、打設) 来月作業 側壁工(型枠、打設)、砂防土工(掘削)	② 工事名 令和6年度 木曾川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 工期 当初 R6.8.26～R7.3.19 変更 R7.6.30 受注者名 神福建設(株) 今月作業 擁壁工(天端コン・盛土)・堰堤工(打設・埋戻し)・仮設工(工事用道路) 来月作業 仮設工(工事用道路・整地等)・片付け	③ 工事名 令和6年度 上松出張所管内整備工事 工期 当初 R6.11.1～R7.11.28 変更 受注者名 奥田工業(株) 今月作業 十王沢第2砂防堰堤上流整備・戦沢管理用道路木くず運搬処理 来月作業 戦沢・地蔵沢 舗装修繕	④ 工事名 令和6年度 木曾川水系 太田第1砂防堰堤流路工事 工期 当初 R6.11.22～R7.6.30 変更 R7.12.25 受注者名 奥田工業(株) 今月作業 砂防土工(掘削工) 法面工(法面吹付、鉄筋挿入) 来月作業 砂防土工(掘削工) 流路護岸工(作業土工)
			
⑤ 工事名 令和6年度 木曾川水系 地蔵沢第1砂防堰堤管理用道路工事 工期 当初 R7.3.6～R8.2.27 変更 受注者名 大宗土建(株) 今月作業 伐採、掘削・路体盛土 来月作業 伐採、掘削・路体盛土、排水構造物	⑥ 工事名 令和6年度 木曾川水系 深沢砂防堰堤工事 工期 当初 R7.4.1～R8.1.30 変更 受注者名 奥田工業(株) 今月作業 起工測量 仮設工 砂防土工 コンクリート堰堤工 来月作業 仮設工 砂防土工 コンクリート堰堤工	⑦ 工事名 令和6年度 木曾川水系 浦川第2砂防堰堤施設改築工事 工期 当初 R7.5.12～R8.2.27 変更 受注者名 奥田工業(株) 今月作業 施工計画、準備工 来月作業 準備工、作業土工	⑧ 工事名 令和7年度 木曾川水系 戦沢第2砂防堰堤管理用道路工事 工期 当初 R7.5.20～R8.2.27 変更 受注者名 大宗土建(株) 今月作業 準備工 来月作業 準備工・道路土工 掘削工
			

工事進捗状況 (令和7年 5月末)

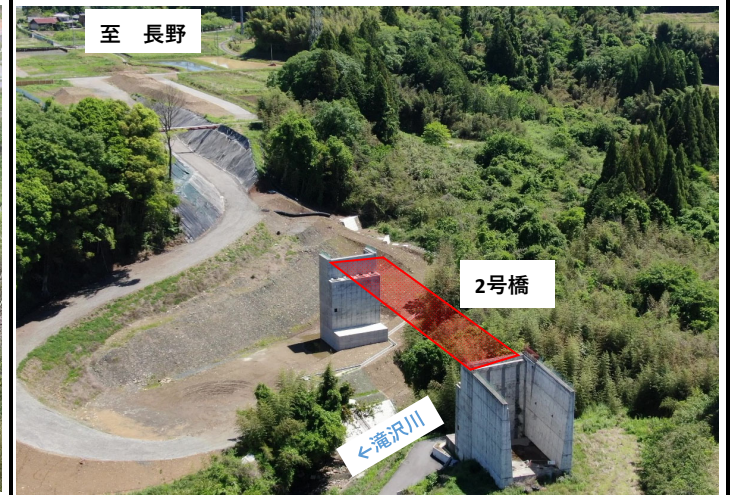
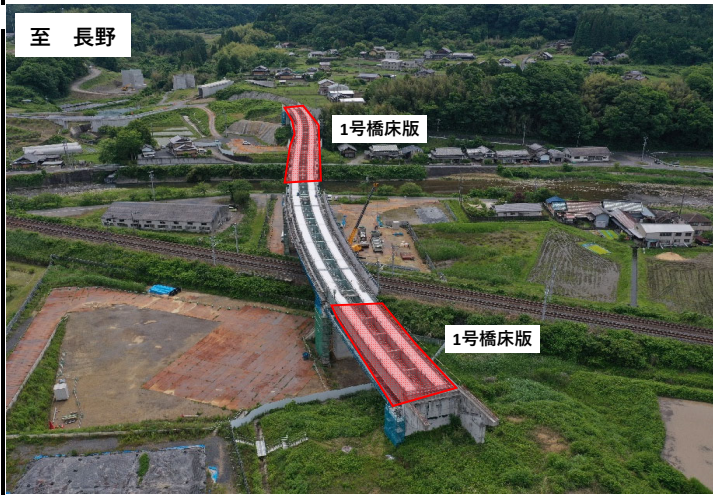
上松出張所

NO, 2

[illegible]

工事進捗状況（令和7年5月末）

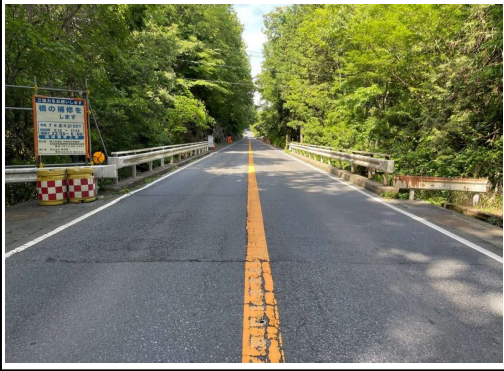
瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①		②		③		④	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 下沢地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪2号橋鋼上部工事
工期	当初 R4. 9. 27～R7. 2. 28 変更 R7. 6. 30	工期	当初 R6. 7. 31～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R6. 8. 30～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R6. 8. 30～R8. 2. 27 変更
受注者名	瀧上工業(株)	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	板垣建設(株)	受注者名	駒井ハルテック
今月作業	現場塗装、ジョイント足場解体	今月作業	カルバート工、擁壁工、排水構造物工	今月作業	2号橋ヤード造成、1号本線函渠埋戻し	今月作業	工場製作
来月作業	現場塗装	来月作業	カルバート工、擁壁工、排水構造物工	来月作業	1号函渠工 埋戻し、土留・仮締切工	来月作業	工場製作
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋床版工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 芝原地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 上平地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 中大島地区道路建設工事
工期	当初 R7. 4. 1～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7. 4. 18～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7. 4. 1～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7. 4. 1～R8. 2. 27 変更
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	板垣建設(株)	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)鳴海組
今月作業	準備工	今月作業	置換工(7号横断管渠)、カルバート工、舗装工	今月作業	準備工 仮設道路 伐採	今月作業	準備工
来月作業	準備工、型枠組立	来月作業	カルバート工、床版工	来月作業	準備工 伐採	来月作業	準備工（伐採）
							

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 恵那地区整備工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 新田地区西道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 新田地区道路建設工事	工事名	
工期	当初 R7. 4. 1～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7. 4. 1～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7. 4. 15～R8. 2. 27 変更	工期	
受注者名	㈱吉川工務店	受注者名	㈱中島工務店	受注者名	恵中建設㈱	受注者名	
今月作業	準備工	今月作業	カルバート工 床掘	今月作業	準備工	今月作業	
来月作業	準備工	来月作業	カルバート工 躯体	来月作業	準備工・構造物撤去工	来月作業	
						写真	
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期		工期		工期		工期	
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
写真		写真		写真		写真	

工事進捗状況 (令和7年5月末)

瑞浪国道維持出張所

①		②		③		④	
工事名	令和5年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和6年度 多治見国道東部維持修繕工事	工事名	令和5年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和6年度 多治見国道舗装修繕工事
工期	当初 R5. 10. 1～R7. 10. 31 変更	工期	当初 R6. 10. 1～R9. 10. 31 変更	工期	当初 R6. 5. 7～R7. 2. 28 変更 R7. 8. 29	工期	当初 R6. 11. 01～R7. 06. 30 変更 R7. 9. 26
受注者名	日本ハイウェイサービス（株）	受注者名	（有）木曾ハイウェーサービス	受注者名	㈱加藤工務店	受注者名	大林道路（株）
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	今月作業	・	今月作業	地山補強土工（ルートバイル）	今月作業	連続鉄筋コンクリート舗装工、切削オーバーレイ工
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱敷） 舗装修繕工	来月作業	地山補強土工（キャベツンギピーム）	来月作業	連続鉄筋コンクリート舗装工
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 多治見国道管内橋梁補修工事	工事名	令和6年度 多治見国道管内整備工事	工事名	令和6年度 多治見道路情報表示設備工事	工事名	令和6年度 多治見国道CCTV設置工事
工期	当初 R7. 3. 27～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7. 4. 1～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7. 4. 21～R8. 1. 30 変更	工期	当初 R7. 4. 1～R8. 1. 30 変更
受注者名	梅田組㈱	受注者名	セントラル建設（株）	受注者名	（株）ナガシマ電子	受注者名	エフコム（株）
今月作業	瑞浪地区 舗装工 中津川地区 足場工	今月作業	準備工	今月作業	準備工	今月作業	準備工
来月作業	瑞浪地区 橋梁付属物工、中津川地区 石積補修工	来月作業	瑞浪地区：準備工 御嵩地区：仮設工、足場工	来月作業	準備工	来月作業	準備工
							

⑨							
工事名	令和7年度 多治見国道交通事故対策工事						
工期	当初 R7. 4. 18～R7. 12. 26 変更						
受注者名	セントラル建設（株）						
今月作業	準備工						
来月作業	区画線工、道路付属施設工						
							
