

工事進捗状況（令和7年8月末）

中津川出張所

①		②		③		④	
工事名	令和6年度 木曽川水系和田沢第2砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 木曽川水系中津川護岸整備工事	工事名	令和6年度 木曽川水系アクラ沢砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 木曽川水系正ヶ根第2砂防堰堤改築工事
工期	当初 R6. 8. 20～R7. 3. 14 変更 R7. 6. 30	工期	当初 R6. 8. 20～R7. 3. 19 変更 R7. 6. 30	工期	当初 R6. 8. 24～R7. 3. 19 変更 R7. 7. 31	工期	当初 R6. 10. 10～R7. 6. 30 変更 R7. 8. 29
今月作業		今月作業		今月作業	砂防土工、法面工、砂防堰堤付属物工、舗装工、後片付け	今月作業	片付け、準備工
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
完成 		完成 		完成 		完成 	
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 中津川出張所管内整備工事	工事名	令和6年度 木曽川水系新梨沢砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 木曽川水系荒道谷砂防施設改築工事	工事名	令和6年度 木曽川水系地獄谷除石工事
工期	当初 R6. 12. 13～R7. 11. 28 変更	工期	当初 R7. 4. 1～R8. 1. 30 変更	工期	当初 R7. 4. 1～R8. 1. 30 変更	工期	当初 R7. 4. 1～R8. 1. 30 変更
今月作業	天王平工事用道路拡幅、アクラ沢法面排水処理	今月作業	砂防土工、コンクリート堰堤工、仮設工	今月作業	側壁工 打設・埋戻し 側壁・副堤 床堀 仮設工	今月作業	掘削工 運搬・投下 仮置き運搬
来月作業	天王平工事用道路拡幅、湯舟沢安全施設整備 等	来月作業	砂防土工、コンクリート堰堤工	来月作業	側壁(3)・副堤 床堀 型枠 生コン打設	来月作業	掘削工 運搬・投下 仮置き運搬
 天王平工事用道路拡幅							

工事進捗状況（令和7年8月末）

中津川出張所

⑨		⑩		⑪			
工事名	令和7年度 木曽川水系本谷砂防堰堤施設改築工事	工事名	令和7年度 木曽川水系和田沢第2砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 多治見砂防電気通信設備工事	工事名	
工期	当初 R7.5.12～R8.2.27 変更	工期	当初 R7.8.20～R8.6.30 変更	工期	当初 R4.7.8～R8.2.28 変更	工期	
今月作業	砂防土工、コンクリート堰堤工準備工、仮設工	今月作業	準備工	今月作業	準備工	今月作業	
来月作業	コンクリート堰堤工、仮設工	来月作業	準備工、伐採	来月作業	準備工	来月作業	
		準備中					
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期		工期		工期		工期	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	

工事進捗状況（令和7年8月末）

旧妻木出張所

①		②		③		④	
工事名	令和6年度 妻木出張所管内整備工事	工事名	令和6年度庄内川水系星ヶ台砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 庄内川水系富士下第2第3寺下第3砂防堰堤改築工事	工事名	
工期	当初 R6. 12. 2 ～R7. 11. 28 変更	工期	当初 R7. 4. 1～R7. 12. 19 変更	工期	当初 R7. 5. 26 ～R8. 2. 27 変更	工期	当初 変更
受注者名	(株) 藤本組	受注者名	(株) 吉川組	受注者名	(株) 藤本組	受注者名	
今月作業	【西蔵連・方月・草口整備】防草工、【各所】標識付属物工、 【各所】除草工、その他	今月作業	工場製作工、鋼製堰堤工（基礎Co一次打設）	今月作業	砂防土工、コンクリート堰堤工（本堤打設）	今月作業	
来月作業	【各所】完了確認	来月作業	鋼製堰堤工（フェンス組立、基礎Co二次打設）、砂防土工	来月作業	コンクリート堰堤工（本堤打設）	来月作業	
     							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	

工事進捗状況 (令和7年 8月末)

上松出張所

NO.1

①		②		③		④	
工事名	令和6年度 木曽川水系 小梨子沢第4砂防堰堤流路工事	工事名	令和6年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 上松出張所管内整備工事	工事名	令和6年度 木曽川水系 太田第1砂防堰堤流路工事
工期	当初 R6.8.19～R7.3.14 変更 R7.10.31	工期	当初 R6.8.26～R7.3.19 変更 R7.6.30	工期	当初 R6.11.1～R7.11.28 変更	工期	当初 R6.11.22～R7.6.30 変更 R7.12.25
受注者名	木曽土建工業(株)	受注者名	神稲建設(株)	受注者名	奥田工業(株)	受注者名	奥田工業(株)
今月作業	流路護岸工(ブロック積み)、帯工(掘削、型枠、打設)	今月作業	-	今月作業	上松町 板橋沢他資材運搬路舗装修繕	今月作業	砂防土工(掘削、残土処理) 流路護岸工(作業土工) 床固め工(作業土工、垂直壁工)
来月作業	流路護岸工(ブロック積み)、帯工(型枠、打設)、モルタル吹付(準備工)	来月作業	-	来月作業	南木曽・大桑 砂防教室	来月作業	砂防土工(掘削、残土処理) 流路護岸工(7'0砂積み) 床固め工(作業土工、垂直壁工)
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 木曽川水系 地藏沢第1砂防堰堤管理用道路工事	工事名	令和6年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤施設改築工事	工事名	令和7年度 木曽川水系 戦沢第2砂防堰堤管理用道路工事
工期	当初 R7.3.6～R8.2.27 変更	工期	当初 R7.4.1～R8.1.30 変更	工期	当初 R7.5.12～R8.2.27 変更	工期	当初 R7.5.20～R8.2.27 変更
受注者名	大宗土建(株)	受注者名	奥田工業(株)	受注者名	奥田工業(株)	受注者名	大宗土建(株)
今月作業	伐採、路体盛土、排水構造物、構造物取壊し	今月作業	砂防土工 コンクリート堰堤工	今月作業	構造物撤去工(取壊し～般運搬) 作業土工	今月作業	掘削工、法面整形工、残土処理工、仮設工
来月作業	伐採、路体盛土、排水構造物、構造物取壊し	来月作業	砂防土工 コンクリート堰堤工	来月作業	コンクリート堰堤工	来月作業	掘削工、法面整形工、残土処理工、仮設工
							

工事進捗状況 (令和7年 8月末)

上松出張所

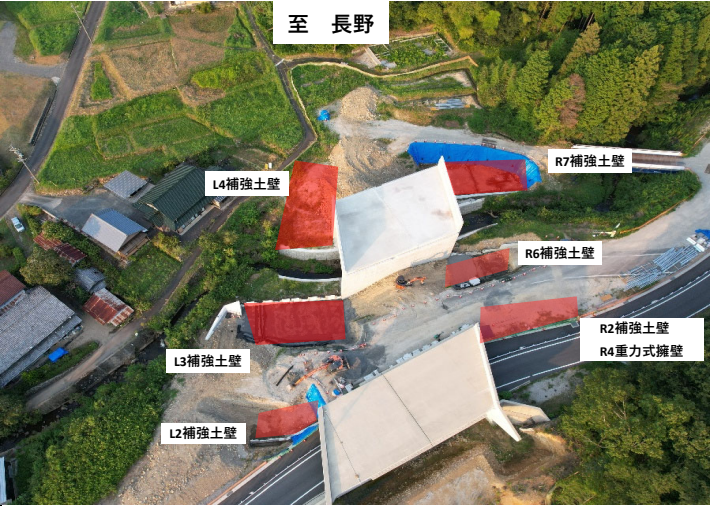
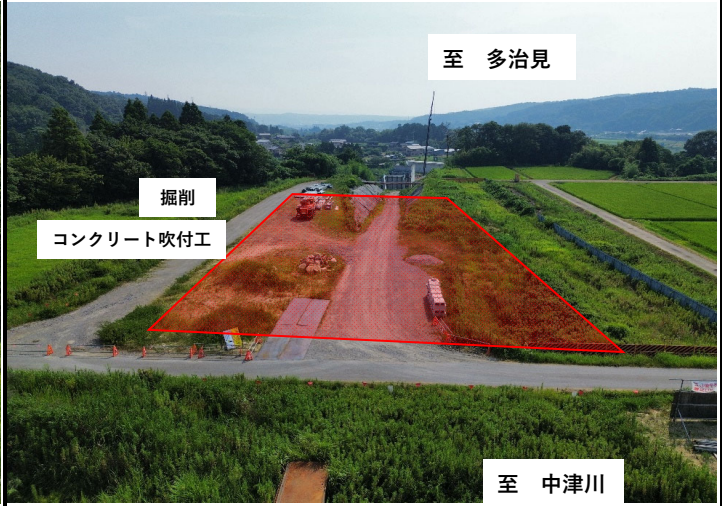
NO, 2

[illegible]

工事進捗状況（令和7年8月末）

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①		②		③		④	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 下沢地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪2号橋鋼上部工事
工期	当初 R4. 9. 27～R7. 2. 28 変更 R7. 6. 30	工期	当初 R6. 7. 31～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R6. 8. 30～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R6. 8. 30～R8. 2. 27 変更
受注者名	瀧上工業(株)	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	板垣建設(株)	受注者名	(株)駒井ハルテック
今月作業		今月作業	カルバート工、舗装工	今月作業	2号橋ヤード造成、1号本線函渠埋戻し	今月作業	ベント組立、桁地組立、桁架設
来月作業		来月作業	後片付け	来月作業	1号本線函渠工 壁高欄工	来月作業	二次部材架設、吊足場組立、HTB本締め、ベント解体、支承モルタル
完成							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋床版工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 芝原地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 上平地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 中大島地区道路建設工事
工期	当初 R7. 4. 1～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7. 4. 18～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7. 4. 1～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7. 4. 1～R8. 2. 27 変更
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	板垣建設(株)	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)鳴海組
今月作業	鉄筋組立	今月作業	カルバート工、床版工、22・23号補強土壁工	今月作業	地盤改良工 徐石作業	今月作業	仮設工、擁壁工
来月作業	鉄筋組立、型枠組立	来月作業	カルバート工、床版工、22・23号補強土壁工	来月作業	地盤改良工 除石作業 中層混合処理	来月作業	擁壁工、準備工（伐採）

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 恵那地区整備工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 新田地区西道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 新田地区道路建設工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 整備工事
工期	当初 R7. 4. 1～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7. 4. 1～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7. 4. 15～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7. 7. 3～R8. 1. 30 変更
受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	恵中建設(株)	受注者名	宮島建設(株)
今月作業	路体盛土工、擁壁工	今月作業	カルバート工(足場・鉄筋・型枠組立、コンクリート打設)	今月作業	地盤改良工	今月作業	掘削工、土砂運搬工
来月作業	路体盛土工、擁壁工	来月作業	カルバート工(鉄筋・型枠組立、コンクリート打設)	来月作業	地盤改良工 擁壁工(重力式擁壁)	来月作業	掘削工、土砂運搬工
							
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 下沢地区道路建設工事	工事名		工事名		工事名	
工期	当初 R7. 9. 2～R9. 2. 26 変更	工期		工期		工期	
受注者名	(株)中島工務店	受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業	準備工	来月作業		来月作業		来月作業	
		写真		写真		写真	

工事進捗状況（令和7年8月末）

瑞浪国道維持出張所

①		②		③		④	
工事名	令和5年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和6年度 多治見国道東部維持修繕工事	工事名	令和5年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和6年度 多治見国道舗装修繕工事
工期	当初 R5. 10. 1～R7. 10. 31 変更	工期	当初 R6. 10. 1～R9. 10. 31 変更	工期	当初 R6. 5. 7～R7. 2. 28 変更 R7. 8. 29	工期	当初 R6. 11. 01～R7. 06. 30 変更 R7. 9. 26
受注者名	日本ハイウェイサービス（株）	受注者名	（有）木曾ハイウェーサービス	受注者名	㈱加藤工務店	受注者名	大林道路（株）
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工	今月作業	完成	今月作業	連続鉄筋コンクリート舗装工、構造物撤去工、道路土工
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工	来月作業		来月作業	連続鉄筋コンクリート舗装工、区画線工、仮設撤去工
							
R19 52.2kp下り 道路除草		R19 70.900kp下 防草シート工				多治見(1)地区	
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 多治見国道管内橋梁補修工事	工事名	令和6年度 多治見国道管内整備工事	工事名	令和6年度 多治見道路情報表示設備工事	工事名	令和6年度 多治見国道CCTV設置工事
工期	当初 R7. 3. 27～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7. 4. 1～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7. 4. 21～R8. 1. 30 変更	工期	当初 R7. 4. 1～R8. 1. 30 変更
受注者名	梅田組㈱	受注者名	セントラル建設（株）	受注者名	（株）ナガシマ電子	受注者名	エフコム（株）
今月作業	御嵩地区 現場塗装工、土岐地区 準備工	今月作業	御嵩地区：法枠工	今月作業	準備工（地質調査）	今月作業	準備工
来月作業	御嵩地区 現場塗装工、土岐地区 橋梁補修工	来月作業	御嵩地区：法枠工、仮設工 恵那地区：準備工、試掘 地区：準備工、伐採	来月作業	準備工	来月作業	準備工・試掘
							
御嵩地区		御嵩地区				御嵩地区	

