

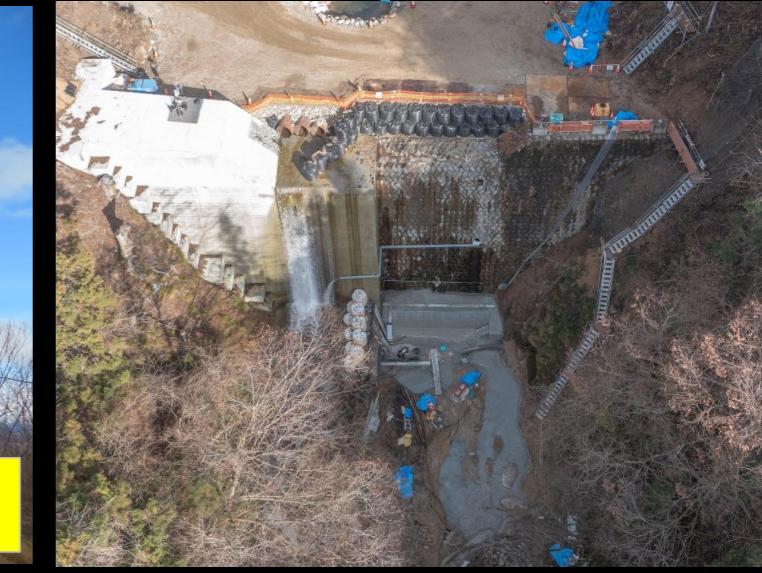
工事進捗状況 (令和7年12月末)

中津川出張所

①		②		③		④	
工事名	令和6年度 木曽川水系和田沢第2砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 木曽川水系中津川護岸整備工事	工事名	令和6年度 木曽川水系アラクラ沢砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 木曽川水系正ヶ根第2砂防堰堤改築工事
工期	当初 R6.8.20～R7.3.14 変更 R7.6.30	工期	当初 R6.8.20～R7.3.19 変更 R7.6.30	工期	当初 R6.8.24～R7.3.19 変更 R7.7.31	工期	当初 R6.10.10～R7.6.30 変更 R7.8.29
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)中島工務店
今月作業		今月作業		今月作業	砂防土工、法面工、砂防堰堤付属物工、舗装工、後片付け	今月作業	片付け、準備工
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 中津川出張所管内整備工事	工事名	令和6年度 木曽川水系新梨沢砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 木曽川水系荒道谷砂防施設改築工事	工事名	令和6年度 木曽川水系地獄谷除石工事
工期	当初 R6.12.13～R7.11.28 変更	工期	当初 R7.4.1～R8.1.30 変更	工期	当初 R7.4.1～R8.1.30 変更	工期	当初 R7.4.1～R8.1.30 変更
受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	(株)鳴海組	受注者名	(株)吉川工務店
今月作業	後片付け	今月作業	砂防土工、法面工、コンクリート堰堤工、仮設工	今月作業	砂防土工 残土運搬 片付け	今月作業	残土処理運搬 片付け
来月作業	—	来月作業	砂防土工、コンクリート堰堤工	来月作業	片付け	来月作業	片付け

工事進捗状況 (令和7年12月末)

中津川出張所

(9)		(10)		(11)		(12)	
工事名	令和7年度 木曽川水系本谷砂防堰堤施設改築工事	工事名	令和7年度 木曽川水系和田沢第2砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 多治見砂防電気通信設備工事	工事名	令和7年度 木曽川水系 正ヶ根第2砂防堰堤改築工事
工期	当初 R7.5.12～R8.2.27 変更	工期	当初 R7.8.20～R8.6.30 変更	工期	当初 R4.7.8～R8.2.28 変更	工期	当初 R7.10.20～R8.6.30 変更
受注者名	(株)鳴海組	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)ミライ・ワン	受注者名	(株)中島工務店
今月作業	コンクリート堰堤工、仮設工	今月作業	掘削工 残土運搬 堤工 型枠・Co打設	今月作業	準備工(現地調査、占用協議)、機器製作	今月作業	土砂掘削 置換Co Co堰堤工
来月作業	砂防土工、コンクリート堰堤工、仮設工	来月作業	堰堤工 型枠・Co打設	来月作業	準備工(現地調査、占用協議)	来月作業	置換Co Co堰堤工 堤復旧工
							
(13)							
工事名	令和7年度 中津川出張所管内整備工事	工事名		工事名		工事名	
工期	当初 R7.12.1～R8.11.30 変更	工期		工期		工期	
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業	温川第4砂防堰堤作業	今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業	温川第4砂防堰堤作業、土砂運搬	来月作業		来月作業		来月作業	
							

工事進捗状況 (令和7年12月末)

旧妻木出張所

①		②		③		④	
工事名 完 令和6年度 妻木出張所管内整備工事		工事名 完 令和6年度 庄内川水系星ヶ台砂防堰堤工事		工事名 令和7年度 庄内川水系富士下第2第3寺下第3砂防堰堤改築工事		工事名 令和7年度 妻木管内整備工事	
工期 当初 R6.12.2 ~R7.11.28 変更		工期 当初 R7.4.1~R7.12.19 変更		工期 当初 R7.5.26 ~R8.2.27 変更		工期 当初 R7.12.1 ~R8.11.30 変更	
受注者名 (株) 藤本組		受注者名 (株) 吉川組		受注者名 (株) 藤本組		受注者名 (株) 藤本組	
今月作業 -----		今月作業 -----		今月作業 砂防土工、コンクリート堰堤工		今月作業 12/2施工計画書提出、12/11 3者合同現地確認、指示1、2、3 準備工	
来月作業 -----		来月作業 -----		来月作業 砂防堰堤付属物設置工、法面工		来月作業 指示：2 岩山第4砂防堰堤整備 指示：3 岩山備蓄倉庫整備	
 		 					
				 			
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期 当初 変更		工期 当初 変更		工期 当初 変更		工期 当初 変更	
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	

工事進捗状況 (令和7年 12月末)

上松出張所

NO. 1

①					②					③					④					
工事名	令和6年度 木曽川水系 小梨子沢第4砂防堰堤流路工事				工事名	令和6年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事				工事名	令和6年度 上松出張所管内整備工事				工事名	令和6年度 木曽川水系 太田第1砂防堰堤流路工事				
工期	当初 R6.8.19～R7.3.14 変更 R7.10.31				工期	当初 R6.8.26～R7.3.19 変更 R7.6.30				工期	当初 R6.11.1～R7.11.28 変更				工期	当初 R6.11.22～R7.6.30 変更 R7.12.25				
受注者名	木曾土建工業(株)				受注者名	神堀建設(株)				受注者名	奥田工業(株)				受注者名	奥田工業(株)				
進捗率	予定	100.0	実施	100.0	差	0.0	進捗率	予定	100.0	実施	100.0	差	0.0	進捗率	予定	100.0	実施	100.0	差	0.0
今月作業	-				今月作業	-				今月作業	-				今月作業	流路護岸工(ブロック積擁壁工)、片付け				
来月作業	-				来月作業	-				来月作業	-				来月作業	1月6日完成検査				
																				

⑤					⑥					⑦					⑧									
工事名	令和6年度 木曽川水系 地蔵沢第1砂防堰堤管理用道路工事				工事名	令和6年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤工事				工事名	令和7年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤施設改築工事				工事名	令和7年度 木曽川水系 戰沢第2砂防堰堤管理用道路工事								
工期	当初 R7.3.6～R8.2.27 変更				工期	当初 R7.4.1～R8.1.30 変更				工期	当初 R7.5.12～R8.2.27 変更				工期	当初 R7.5.20～R8.2.27 変更								
受注者名	大宗土建(株)				受注者名	奥田工業(株)				受注者名	奥田工業(株)				受注者名	大宗土建(株)								
進捗率	予定	91.3	実施	88.5	差	-2.8	進捗率	予定	80.0	実施	78.6	差	-1.4	進捗率	予定	83.7	実施	76.5	差	-7.2				
今月作業	管理用道路(掘削、残土運搬、排水路工、下層路盤、伐倒木運搬)				今月作業	コンクリート堰堤工、仮設工				今月作業	コンクリート堰堤工(土工、差筋、型枠、打設)				今月作業	コンクリート副堰堤工(土工、差筋、型枠、打設) 仮設土工				今月作業	掘削工、法面整形工、残土処理工、仮設工			
来月作業	管理用道路(排水路工、路床造土(置換工)、舗装工、植生マット) 工事用道路(舗装工)				来月作業	コンクリート堰堤工、仮設工				来月作業	コンクリート副堰堤工(土工、差筋、型枠、打設) 仮設土工				来月作業	掘削工、法面整形工、残土処理工、仮設工								



工事進捗状況（令和7年12月末）

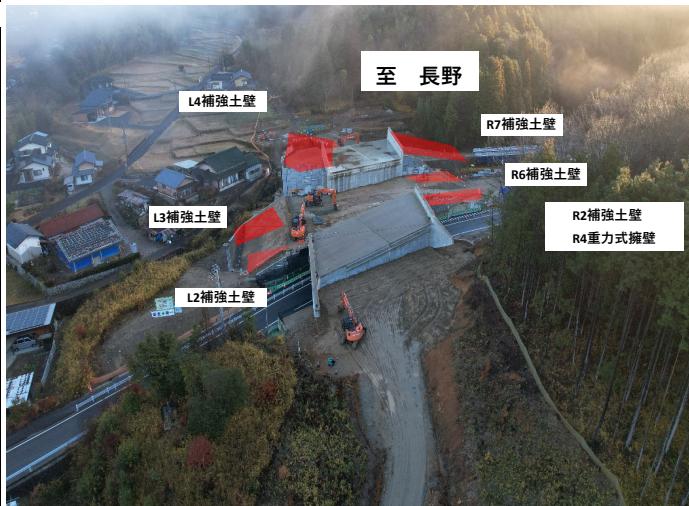
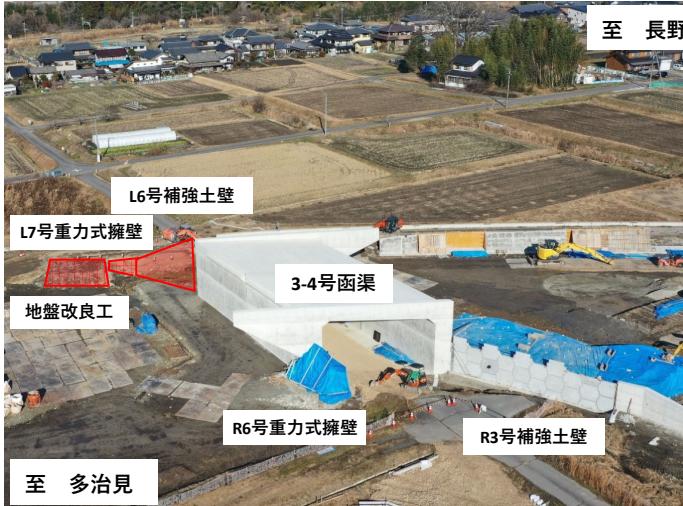
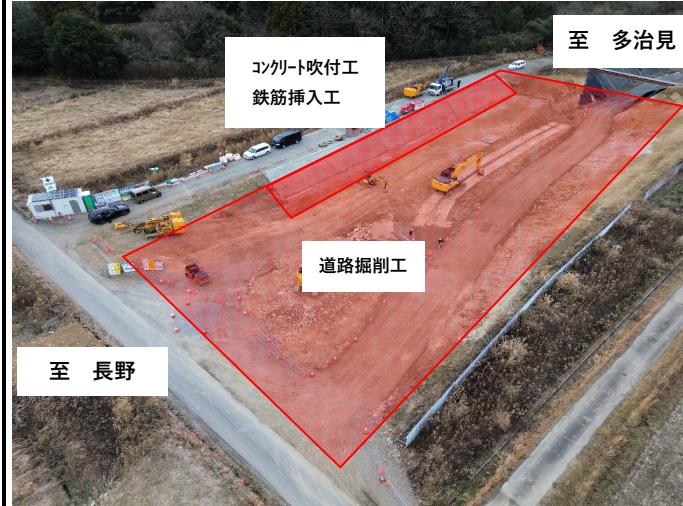
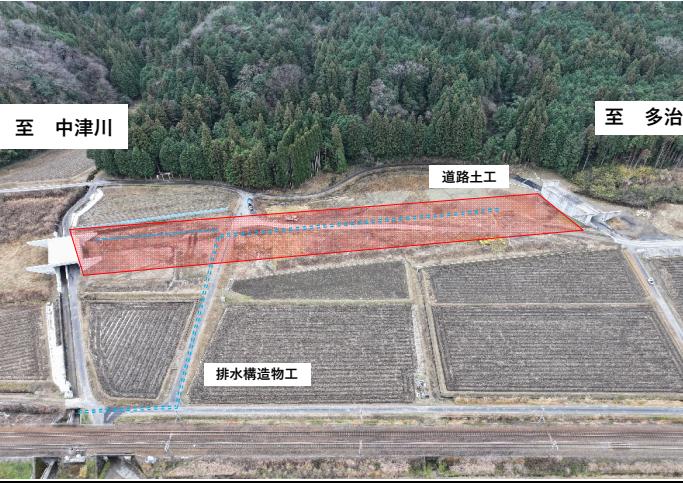
上松出張所

NO. 2

工事進捗状況 (令和7年12月末)

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①		②		③		④	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 下沢地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪2号橋鋼上部工事
工期	当初 R4.9.27~R7.2.28 変更 R7.6.30	工期	当初 R6.7.31~R8.2.27 変更 R7.9.30	工期	当初 R6.8.30~R8.2.27 変更 R7.12.25	工期	当初 R6.7.25~R8.2.27 変更 R7.11.28
受注者名	瀧上工業株	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	板垣建設株	受注者名	(株)駒井ハルテック
今月作業		今月作業		今月作業	後片付け	今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
完成 		完成 		完成 		完成 	
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋床版工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 芝原地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 上平地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 中大島地区道路建設工事
工期	当初 R7.4.1~R8.2.27 変更	工期	当初 R7.4.18~R8.2.27 変更 R8.3.27	工期	当初 R7.4.1~R8.2.27 変更	工期	当初 R7.4.1~R8.2.27 変更
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	板垣建設株	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)鳴海組
今月作業	床版工(表面保護、弹性シール材)、橋梁付属物工(排水装置工)	今月作業	19号・30号重力式擁壁	今月作業	2-3号横断函渠工、2-5号補強土壁工	今月作業	擁壁工、工事用道路工、伐採
来月作業	情報ポッケ工、鋼橋足場等設置工	来月作業	19号・30号重力式擁壁	来月作業	2-3号横断函渠工、2-5号補強土壁工	来月作業	擁壁工、工事用道路工、伐採
							

⑨	⑩	⑪	⑫
工事名 令和6年度 瑞浪恵那道路 恵那地区整備工事 工期 当初 R7.4.1~R8.2.27 変更 受注者名 (株)吉川工務店 今月作業 路体盛土工、擁壁工、排水構造物工 来月作業 路体盛土工、擁壁工、排水構造物工	工事名 令和6年度 瑞浪恵那道路 新田地区西道路建設工事 工期 当初 R7.4.1~R8.2.27 変更 受注者名 (株)中島工務店 今月作業 擁壁工(R3号補強土壁、L7号重力式擁壁、L6号補強土壁) 来月作業 擁壁工(L6号補強土壁)、排水構造物工(PL-BOX、台付管)	工事名 令和6年度 瑞浪恵那道路 新田地区道路建設工事 工期 当初 R7.4.15~R8.2.27 変更 受注者名 惠中建設(株) 今月作業 地盤改良工 拥壁工(重力式擁壁) 来月作業 地盤改良工 拥壁工(重力式擁壁)	工事名 令和7年度 瑞浪恵那道路 整備工事 工期 当初 R7.7.3~R8.1.30 変更 R8.2.20 受注者名 宮島建設(株) 今月作業 掘削工、土砂運搬工、コンクリート吹付工 来月作業 コンクリート吹付工、後片付け
			
⑬	⑭	⑮	⑯
工事名 令和7年度 瑞浪恵那道路 下沢地区道路建設工事 工期 当初 R7.9.2~R9.2.26 変更 受注者名 (株)中島工務店 今月作業 2号橋 床版工(型枠・鉄筋組立) 拥壁工 作業土工(床掘) 来月作業 2号橋 床版工(コン打設)、擁壁工 作業土工(床掘)、仮設工	工事名 令和7年度 瑞浪恵那道路 公文垣内地区道路建設工事 工期 当初 R7.10.20~R9.2.26 変更 受注者名 (株)加藤工務店 今月作業 道路土工 地盤改良工 排水構造物工 仮設工 来月作業 道路土工 地盤改良工 排水構造物工 仮設工	工事名 令和7年度 瑞浪恵那道路 恵那地区橋梁下部工事 工期 当初 R7.10.29~R9.2.26 変更 受注者名 株鳴海組 今月作業 準備工 来月作業 準備工、仮設工	
			写真

工事進捗状況 (令和7年12月末)

瑞浪国道維持出張所

①		②		③		④	
工事名	令和7年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和6年度 多治見国道東部維持修繕工事	工事名	令和5年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和6年度 多治見国道舗装修繕工事
工期	当初 R7.10.1~R10.10.31 変更	工期	当初 R6.10.1~R9.10.31 変更	工期	当初 R6.5.7~R7.2.28 変更 R7.8.29	工期	当初 R6.11.01~R7.06.30 変更 R7.12.19
受注者名	日本ハイウェイサービス（株）	受注者名	(有)木曾ハイウェイサービス	受注者名	株加藤工務店	受注者名	大林道路（株）
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設 (柱類) 舗裝修繕工	今月作業	完成	今月作業	準備工
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設 (柱類) 舗裝修繕工	来月作業		来月作業	準備工
							
R19(下) 50.2kp 道路除草		R19 69.550上 損傷復旧工		完		多治見(1)地区 完	
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 多治見国道管内橋梁補修工事	工事名	令和6年度 多治見国道管内整備工事	工事名	令和6年度 多治見道路情報表示設備工事	工事名	令和6年度 多治見国道CCTV設置工事
工期	当初 R7.3.27~R8.2.27 変更 R8.5.29	工期	当初 R7.4.1~R8.2.27 変更	工期	当初 R7.4.21~R8.1.30 変更	工期	当初 R7.4.1~R8.1.30 変更
受注者名	梅田組（株）	受注者名	セントラル建設（株）	受注者名	（株）ナガシマ電子	受注者名	エフコム（株）
今月作業	土岐地区 現場塗装工、橋梁補修工(地覆補修)	今月作業	恵那地区：舗装工、区画線工	今月作業	道路情報表示設備更新	今月作業	試掘・支柱設置工・光ケーブル敷設工
来月作業	土岐地区 橋梁補修工(地覆補修、当て板補修)	来月作業		来月作業		来月作業	支柱設置工・光ケーブル敷設工・CCTV装置設置工
							
御嵩地区		恵那地区		恵那地区(長島)		御嵩地区	

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和7年度 多治見国道交通事故対策工事	工事名	令和7年度 多治見国道御嵩地区亜炭坑充填工事	工事名	令和7年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和7年度 多治見国道東部除雪作業
工期	当初 R7.4.18~R7.12.26 変更 R8.3.27	工期	当初 R7.07.14~R8.02.27 変更 R8.3.24	工期	当初 R7.10.1~R8.2.27 変更	工期	当初 R7.11.01~R8.03.31 変更
受注者名	セントラル建設（株）	受注者名	徳倉建設（株）	受注者名	株加藤工務店	受注者名	（株）加藤工務店
今月作業	恵那(1)地区 防護柵工 補装工 構造物撤去工 仮設工	今月作業	充填孔設置工、家屋調査、技術管理（準備）	今月作業	擁壁工（2号地山補強土工）	今月作業	一般除雪工、凍結防止工、環境整備
来月作業	恵那(1)地区 防護柵工 補装工 区画線工 構造物撤去工	来月作業	充填孔設置工、充填工、技術管理	来月作業	擁壁工（2号地山補強土工）	来月作業	一般除雪工、凍結防止工、環境整備
							
恵那(1)地区		御嵩地区					
⑬							
工事名	令和7年度 多治見国道西部除雪作業						
工期	当初 R7.11.01~R8.03.31 変更						
受注者名	（株）藤本組						
今月作業	一般除雪工、凍結防止工、環境整備工						
来月作業	一般除雪工、凍結防止工						
							
