


工事進捗状況 (令和8年1月末)

中津川出張所

①		②		③		④	
工事名	令和6年度 木曾川水系和田沢第2砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 木曾川水系中津川護岸整備工事	工事名	令和6年度 木曾川水系アラクラ沢砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 木曾川水系正ヶ根第2砂防堰堤改築工事
工期	当初 R6.8.20~R7.3.14 変更 R7.6.30	工期	当初 R6.8.20~R7.3.19 変更 R7.6.30	工期	当初 R6.8.24~R7.3.19 変更 R7.7.31	工期	当初 R6.10.10~R7.6.30 変更 R7.8.29
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)中島工務店
今月作業		今月作業		今月作業	砂防土工、法面工、砂防堰堤付属物工、舗装工、後片付け	今月作業	片付け、準備工
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	

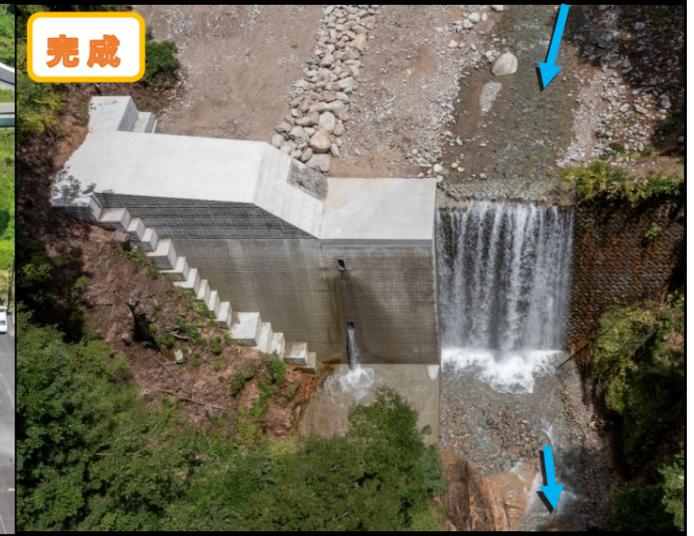

⑤	
工事名	令和6年度 中津川出張所管内整備工事
工期	当初 R6.12.13~R7.11.28 変更
受注者名	(株)吉川工務店
今月作業	後片付け
来月作業	—

⑥	
工事名	令和6年度 木曾川水系新梨沢砂防堰堤工事
工期	当初 R7.4.1~R8.1.30 変更 R8.2.27
受注者名	(株)吉川工務店
今月作業	砂防土工、法面工、コンクリート堰堤工、仮設工
来月作業	砂防土工、仮設工、後片付け

⑦	
工事名	令和6年度 木曾川水系荒道谷砂防施設改築工事
工期	当初 R7.4.1~R8.1.30 変更
受注者名	(株)鳴海組
今月作業	片付け
来月作業	

⑧	
工事名	令和6年度 木曾川水系地獄谷除石工事
工期	当初 R7.4.1~R8.1.30 変更
受注者名	(株)吉川工務店
今月作業	片付け
来月作業	



湯舟沢安全施設整備

工事進捗状況 (令和8年1月末)

中津川出張所

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和7年度 木曾川水系本谷砂防堰堤施設改築工事	工事名	令和7年度 木曾川水系和田沢第2砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 多治見砂防電気通信設備工事	工事名	令和7年度 木曾川水系 正ヶ根第2砂防堰堤改築工事
工期	当初 R7.5.12~R8.2.27 変更	工期	当初 R7.8.20~R8.6.30 変更	工期	当初 R4.7.8~R8.2.27 変更 R8.6.26	工期	当初 R7.10.20~R8.6.30 変更
受注者名	(株)鳴海組	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)ミライト・ワン	受注者名	(株)中島工務店
今月作業	コンクリート堰堤工、仮設工	今月作業	掘削工 残土運搬 堰堤工 型枠・Co打設	今月作業	準備工(現地調査、占用協議)	今月作業	置換Co Co堰堤工 洗掘対策工
来月作業	砂防土工、コンクリート堰堤工、後片付け	来月作業	掘削工 残土運搬 堰堤工 型枠・Co打設 法面工	来月作業	上松地区：地中配管、ハンドホール設置	来月作業	Co堰堤工 洗掘対策工
				 <p>現地調査 (日和田カメラ更新)</p>			
⑬							
工事名	令和7年度 中津川出張所管内整備工事	工事名	令和7年度 木曾川水系荒道谷砂防施設改築工事	工事名		工事名	
工期	当初 R7.12.1~R8.11.30 変更	工期	当初 R8.2.16~R9.1.29 変更	工期		工期	
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)鳴海組	受注者名		受注者名	
今月作業	温川第4砂防堰堤災害旧作業、本谷土砂搬出作業	今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業	本谷土砂搬出作業	来月作業		来月作業		来月作業	
		<p>準備中</p>					

工事進捗状況 (令和7年1月末)

旧妻木出張所

①		②		③		④	
工事名	令和6年度 妻木出張所管内整備工事	工事名	令和6年度 庄内川水系星ヶ台砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 庄内川水系富士下第2第3寺下第3砂防堰堤改築工事	工事名	令和7年度 妻木管内整備工事
工期	当初 R6. 12. 2 ~R7. 11. 28 変更	工期	当初 R7. 4. 1~R7. 12. 19 変更	工期	当初 R7. 5. 26 ~R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7. 12. 1 ~R8. 11. 30 変更
受注者名	(株) 藤本組	受注者名	(株) 吉川組	受注者名	(株) 藤本組	受注者名	(株) 藤本組
今月作業	----	今月作業	----	今月作業	砂防堰堤付属物設置工	今月作業	指示3【砦山資材置き場整備】除草工
来月作業	----	来月作業	----	来月作業	法面工	来月作業	指示：2 砦山第4砂防堰堤整備 指示：3 砦山資材置き場整備
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	

工事進捗状況 (令和8年 1月末)

上松出張所 NO.1

①						②						③						④									
工事名	令和6年度 木曾川水系 小梨子沢第4砂防堰堤流路工事					工事名	令和6年度 木曾川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事					工事名	令和6年度 上松出張所管内整備工事					工事名	令和6年度 木曾川水系 太田第1砂防堰堤流路工事								
工期	当初 R6.8.19~R7.3.14 変更 R7.10.31					工期	当初 R6.8.26~R7.3.19 変更 R7.6.30					工期	当初 R6.11.1~R7.11.28 変更					工期	当初 R6.11.22~R7.6.30 変更 R7.12.25								
受注者名	木曾土建工業(株)					受注者名	神福建設(株)					受注者名	奥田工業(株)					受注者名	奥田工業(株)								
進捗率	予定	100.0	実施	100.0	差	0.0	進捗率	予定	100.0	実施	100.0	差	0.0	進捗率	予定	100.0	実施	100.0	差	0.0	進捗率	予定	100.0	実施	100.0	差	0.0
今月作業	-					今月作業	-					今月作業	-					今月作業	-								
来月作業	-					来月作業	-					来月作業	-					来月作業	-								
																											
完成						完成						完成						完成									
⑤						⑥						⑦						⑧									
工事名	令和6年度 木曾川水系 地藏沢第1砂防堰堤管理用道路工事					工事名	令和6年度 木曾川水系 深沢砂防堰堤工事					工事名	令和7年度 木曾川水系 浦川第2砂防堰堤施設改築工事					工事名	令和7年度 木曾川水系 職沢第2砂防堰堤管理用道路工事								
工期	当初 R7.3.6~R8.2.27 変更 R8.3.19					工期	当初 R7.4.1~R8.1.30 変更 R8.3.19					工期	当初 R7.5.12~R8.2.27 変更 R8.3.19					工期	当初 R7.5.20~R8.2.27 変更 R8.3.19								
受注者名	大宗土建(株)					受注者名	奥田工業(株)					受注者名	奥田工業(株)					受注者名	大宗土建(株)								
進捗率	予定	98.6	実施	99.8	差	1.3	進捗率	予定	99.1	実施	99.1	差	0.0	進捗率	予定	95.1	実施	90.9	差	-4.2	進捗率	予定	97.9	実施	89.6	差	-8.3
今月作業	管理用道路(排水路工、路床盛土(置換え)、舗装工、補土マット)工事用道路(舗装工)					今月作業	コンクリート堰堤工、仮設工					今月作業	コンクリート副堰堤工(土工、差筋、型枠、打設)					今月作業	掘削工、法面整形工、残土処理工、仮設工								
来月作業	片付け、書類整理					来月作業	コンクリート堰堤工、仮設工					来月作業	コンクリート副堰堤工(脱枠)、仮設土工					来月作業	法面工								
																											

工事進捗状況 (令和8年 1月末)

上松出張所 NO.2

⑨					⑩					⑪					⑫													
工事名	令和7年度 木曾川水系 桂川第1砂防堰堤法面工事				工事名	令和7年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂地工事				工事名	令和7年度 木曾川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事				工事名	令和7年度 上松出張所管内整備工事												
工期	当初 R7.5.22~R8.2.27 変更 R8.3.19				工期	当初 R7.6.5~R8.2.27 変更				工期	当初 R7.9.1~R8.6.30 変更				工期	当初 R7.10.29~R8.11.30 変更												
受注者名	大宗土建(株)				受注者名	大宗土建(株)				受注者名	神福建設(株)				受注者名	大宗土建(株)												
進捗率	予定	92.0	実施	89.4	差	-2.6	進捗率	予定	99.3	実施	99.4	差	0.1	進捗率	予定	47.5	実施	55.5	差	8.0	進捗率	予定	-	実施	38.9	差	-	
今月作業	構造物取壊し工、かご工				今月作業	工事中道路工・仮設工・片付け				今月作業	コンクリート堰堤工(型枠・打設)				今月作業	指示1(読書残土L型埋戻し)、指示2(地蔵沢舗装)												
来月作業	かご工、側溝工				来月作業	2月24日完成検査				来月作業	コンクリート堰堤工(型枠・打設)				来月作業	指示1(L型掘付・埋戻し)												
																												
工事名	令和7年度 木曾川水系 小梨子沢第4砂防堰堤流路工事				工事名	令和7年度 木曾川水系 太田第1砂防堰堤管理用道路工事																						
工期	当初 R8.1.30~R8.9.30 変更				工期	当初 R8.1.30~R8.9.30 変更																						
受注者名	木曾土建工業(株)				受注者名	奥田工業(株)																						
進捗率	予定	0.0	実施	0.0	差	0.0	進捗率	予定	0.0	実施	0.0	差	0.0															
今月作業	-				今月作業	準備工(現地踏査・施工計画作成)																						
来月作業	準備工、仮設工、伐採工、流路護岸工、				来月作業	準備工(現地踏査・施工計画作成)																						
																												

工事進捗状況 (令和8年1月末)


瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①		②		③		④	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 下沢地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪2号橋鋼上部工事
工期	当初 R4.9.27~R7.2.28 変更 R7.6.30	工期	当初 R6.7.31~R8.2.27 変更 R7.9.30	工期	当初 R6.8.30~R8.2.27 変更 R7.12.25	工期	当初 R6.7.25~R8.2.27 変更 R7.11.28
受注者名	瀧上工業(株)	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	板垣建設(株)	受注者名	(株)駒井ハルテック
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
<p>完成</p>		<p>完成</p>		<p>完成</p>		<p>完成</p>	
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋床版工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 芝原地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 上平地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 中大島地区道路建設工事
工期	当初 R7.4.1~R8.2.27 変更	工期	当初 R7.4.18~R8.2.27 変更 R8.3.27	工期	当初 R7.4.1~R8.2.27 変更	工期	当初 R7.4.1~R8.2.27 変更
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	板垣建設(株)	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)鳴海組
今月作業	情報ボックス工、鋼橋足場等設置工	今月作業	19号・30号重力式擁壁	今月作業	2-3号横断函渠工、2-5号補強土壁工	今月作業	擁壁工、工事用道路工
来月作業	仮設工	来月作業	19号・30号重力式擁壁 埋戻し	来月作業	2-3号横断函渠工、2-5号補強土壁工	来月作業	擁壁工、工事用道路工

⑨	
工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 恵那地区整備工事
工期	当初 R7. 4. 1~R8. 2. 27 変更 R8. 3. 27
受注者名	(株)吉川工務店
今月作業	路体盛土工、擁壁工、排水構造物工
来月作業	路体盛土工、擁壁工、排水構造物工



⑩	
工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 新田地区西道路建設工事
工期	当初 R7. 4. 1~R8. 2. 27 変更 R8. 3. 27
受注者名	(株)中島工務店
今月作業	擁壁工(L6号補強土壁)、排水構造物工
来月作業	排水構造物工、片付け

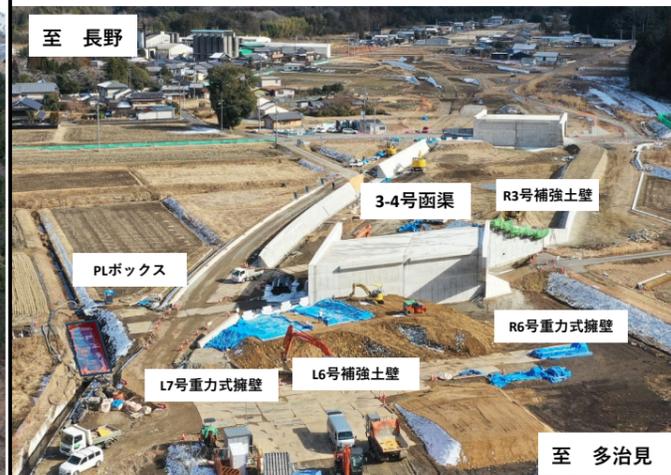


⑪	
工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 新田地区道路建設工事
工期	当初 R7. 4. 15~R8. 2. 27 変更
受注者名	恵中建設(株)
今月作業	地盤改良工 擁壁工(重力式擁壁)
来月作業	擁壁工(重力式擁壁) 後片付け




⑫	
工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 整備工事
工期	当初 R7. 7. 3~R8. 1. 30 変更 R8. 2. 20
受注者名	宮島建設(株)
今月作業	コンクリート吹付工、後片付け
来月作業	



⑬	
工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 下沢地区道路建設工事
工期	当初 R7. 9. 2~R9. 2. 26 変更
受注者名	(株)中島工務店
今月作業	2号橋 床版工(コン打設)、擁壁工 作業土工(床掘)、仮設工
来月作業	2号橋 床版工(地覆壁高欄工コン打設)、擁壁工 6号重力式擁壁 コン打設

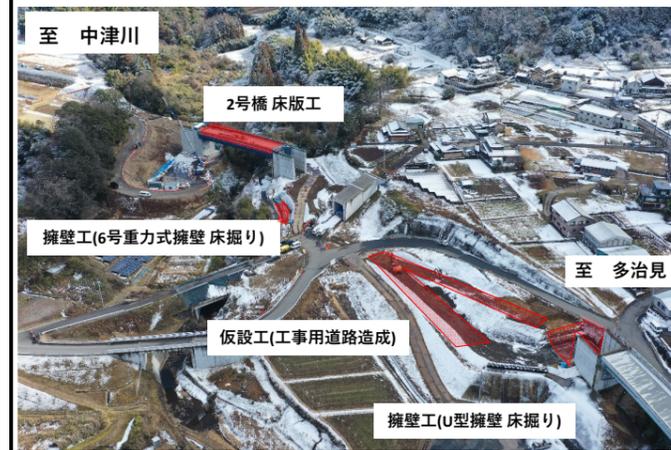

⑭	
工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 公文垣内地区道路建設工事
工期	当初 R7. 10. 20~R9. 2. 26 変更
受注者名	(株)加藤工務店
今月作業	道路土工 地盤改良工 排水構造物工 仮設工
来月作業	道路土工 地盤改良工 排水構造物工 仮設工

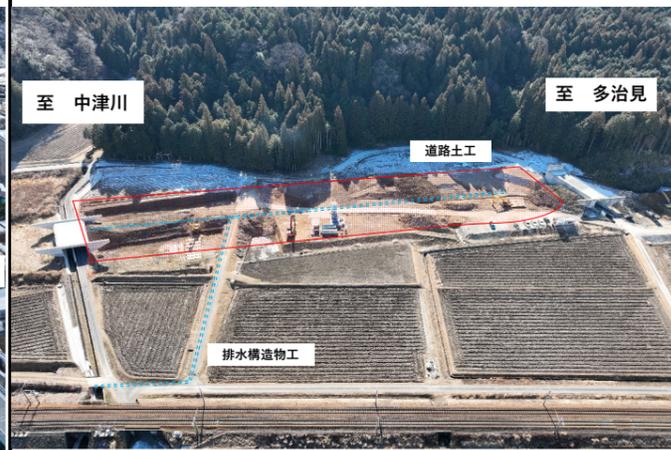

⑮	
工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 恵那地区橋梁下部工事
工期	当初 R7. 10. 29~R9. 2. 26 変更
受注者名	(株)鳴海組
今月作業	準備工、仮設工(作業ヤード設置、工事用道路)
来月作業	準備工、仮設工(仮橋・仮栈橋工、仮締切工)



⑯	
工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 町屋地区道路建設工事
工期	当初 R8. 1. 23~R9. 2. 26 変更
受注者名	板垣建設(株)
今月作業	準備工
来月作業	準備工、起工測量、仮設工



⑰		⑱		⑲		⑳	
工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 恵那7号橋下部工事	工事名		工事名		工事名	
工期	当初 R8.1.23~R9.2.26 変更	工期		工期		工期	
受注者名	(株)吉川工務店	受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業	準備工	今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業	準備工・仮設工・橋台工・擁壁工	来月作業		来月作業		来月作業	
		写真		写真		写真	
㉑		㉒		㉓		㉔	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期		工期		工期		工期	
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
写真		写真		写真		写真	

工事進捗状況 (令和8年1月末)

瑞浪国道維持出張所

①		②		③		④	
工事名	令和7年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和6年度 多治見国道東部維持修繕工事	工事名	令和5年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和6年度 多治見国道舗装修繕工事
工期	当初 R7. 10. 1~R10. 10. 31 変更	工期	当初 R6. 10. 1~R9. 10. 31 変更	工期	当初 R6. 5. 7~R7. 2. 28 変更 R7. 8. 29	工期	当初 R6. 11. 01~R7. 06. 30 変更 R7. 12. 19
受注者名	日本ハイウェイサービス(株)	受注者名	(有)木曾ハイウェーサービス	受注者名	株加藤工務店	受注者名	大林道路(株)
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 舗装修繕工	今月作業	完成	今月作業	準備工
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 舗装修繕工	来月作業		来月作業	準備工
							
R19(上) 34.35kp 欠損部補修		R19 78.100上緑地管理工 道路除草		完		多治見(1)地区 完	
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 多治見国道管内橋梁補修工事	工事名	令和6年度 多治見国道管内整備工事	工事名	令和6年度 多治見道路情報表示設備工事	工事名	令和6年度 多治見国道CCTV設置工事
工期	当初 R7. 3. 27~R8. 2. 27 変更 R8. 5. 29	工期	当初 R7. 4. 1~R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7. 4. 21~R8. 1. 30 変更	工期	当初 R7. 4. 1~R8. 1. 30 変更 R8. 3. 19
受注者名	梅田組(株)	受注者名	セントラル建設(株)	受注者名	(株)ナガシマ電子	受注者名	エフコム(株)
今月作業	土岐地区 橋梁補修工(地覆補修、当て板補修)	今月作業	恵那地区: 舗装工、区画線工、薄層カラー舗装工	今月作業	道路情報表示設備更新	今月作業	支柱設置工・光ケーブル敷設工・CCTV装置設置工
来月作業	土岐地区 現場塗装工	来月作業		来月作業		来月作業	CCTV装置設置工(SI作業)
							
土岐地区		恵那地区		完		御高地区	

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和7年度 多治見国道交通事故対策工事	工事名	令和7年度 多治見国道御嵩地区垂炭坑充填工事	工事名	令和7年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和7年度 多治見国道東部除雪作業
工期	当初 R7. 4. 18~R7. 12. 26 変更 R8. 3. 27	工期	当初 R7. 07. 14~R8. 02. 27 変更 R8. 3. 24	工期	当初 R7. 10. 1~R8. 2. 27 変更 R8. 4. 30	工期	当初 R7. 11. 01~R8. 03. 31 変更
受注者名	セントラル建設(株)	受注者名	徳倉建設(株)	受注者名	株加藤工務店	受注者名	(株)加藤工務店
今月作業	恵那(1)地区 防護柵工 舗装工 区画線工 構造物撤去工	今月作業	充填孔設置工、充填工、技術管理	今月作業	擁壁工(2号地山補強土工)	今月作業	一般除雪工、凍結防止工、環境整備
来月作業	恵那(1)地区 防護柵工 舗装工 区画線工	来月作業	充填工、家屋調査、技術管理	来月作業	準備工	来月作業	一般除雪工、凍結防止工、環境整備
							
恵那(1)地区		御嵩地区					
⑬		⑭					
工事名	令和7年度 多治見国道西部除雪作業	工事名	令和7年度 多治見国道管内橋梁補修工事				
工期	当初 R7. 11. 01~R8. 03. 31 変更	工期	当初 R8. 1. 8~R9. 7. 30 変更				
受注者名	(株)藤本組	受注者名	梅田組株				
今月作業	一般除雪工、凍結防止工	今月作業	準備工(施工計画)				
来月作業	一般除雪工、凍結防止工	来月作業	準備工(補修箇所調査)				
							
