

工事進捗状況 (令和8年3月末)

中津川出張所

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和7年度 木曾川水系本谷砂防堰堤施設改築工事	工事名	令和7年度 木曾川水系和田沢第2砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 多治見砂防電気通信設備工事	工事名	令和7年度 木曾川水系 正ヶ根第2砂防堰堤改築工事
工期	当初 R7.5.12~R8.2.27 変更 R8.3.19	工期	当初 R7.8.20~R8.6.30 変更	工期	当初 R4.7.8~R8.2.27 変更 R8.6.26	工期	当初 R7.10.20~R8.6.30 変更
受注者名	(株)鳴海組	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)ミライト・ワン	受注者名	(株)中島工務店
今月作業	後片付け	今月作業	掘削工 残土運搬 堰堤工 型枠・Co打設 法面工	今月作業	上松地区：地中配管、ハンドホール設置	今月作業	Co堰堤工
来月作業		来月作業	掘削工 堰堤工 型枠・Co打設 法面工	来月作業	上松地区：地中配管、ハンドホール設置	来月作業	Co堰堤工 構造物撤去工



⑬	
工事名	令和7年度 中津川出張所管内整備工事
工期	当初 R7.12.1~R8.11.30 変更
受注者名	(株)加藤工務店
今月作業	本谷土砂搬出作業
来月作業	中津川第2砂防堰堤残土処理場整備

⑭	
工事名	令和7年度 木曾川水系荒道谷砂防施設改築工事
工期	当初 R8.2.16~R9.1.29 変更
受注者名	(株)鳴海組
今月作業	堰堤工 差し筋・型枠・Co打設 構造物取壊し 殻運搬
来月作業	堰堤工 型枠・Co打設 構造物取壊し 殻運搬

⑮	
工事名	令和7年度 木曾川水系地獄谷除石工事
工期	当初 R8.3.23~R9.1.29 変更
受注者名	(株)吉川工務店
今月作業	準備工
来月作業	掘削工

⑯	
工事名	令和7年度 木曾川水系新梨沢砂防堰堤工事
工期	当初 R8.4.1~R9.1.29 変更
受注者名	(株)吉川工務店
今月作業	準備工
来月作業	準備工



準備工






工事進捗状況 (令和8年3月末)

庄内川水系砂防

①		②		③		④	
工事名	令和6年度 妻木出張所管内整備工事	工事名	令和6年度 庄内川水系星ヶ台砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 庄内川水系富士下第2第3寺下第3砂防堰堤改築工事	工事名	令和7年度 妻木管内整備工事
工期	当初 R6.12.2 ~R7.11.28 変更	工期	当初 R7.4.1~R7.12.19 変更	工期	当初 R7.5.26 ~R8.2.27 変更	工期	当初 R7.12.1 ~R8.11.30 変更
受注者名	(株) 藤本組	受注者名	(株) 吉川組	受注者名	(株) 藤本組	受注者名	(株) 藤本組
今月作業	----	今月作業	----	今月作業	----	今月作業	指示3 砦山資材置き場整備、指示4 おりべ砂防堰堤整備、指示5 生田遊砂工整備
来月作業	----	来月作業	----	来月作業	----	来月作業	指示6 富士下第2砂防堰堤整備、指示9 天狗沢砂防堰堤整備、指示8 山長第2砂防堰堤整備
 						  	
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	









工事進捗状況 (令和8年 3月末)

上松出張所 NO.1

①		②		③		④	
工事名	令和6年度 木曾川水系 小梨子沢第4砂防堰堤流路工事	工事名	令和6年度 木曾川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 上松出張所管内整備工事	工事名	令和6年度 木曾川水系 太田第1砂防堰堤流路工事
工期	当初 R6.8.19~R7.3.14 変更 R7.10.31	工期	当初 R6.8.26~R7.3.19 変更 R7.6.30	工期	当初 R6.11.1~R7.11.28 変更	工期	当初 R6.11.22~R7.6.30 変更 R7.12.25
受注者名	木曾土建工業(株)	受注者名	神福建設(株)	受注者名	奥田工業(株)	受注者名	奥田工業(株)
今月作業	-	今月作業	-	今月作業	-	今月作業	-
来月作業	-	来月作業	-	来月作業	-	来月作業	-
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 木曾川水系 地蔵沢第1砂防堰堤管理用道路工事	工事名	令和6年度 木曾川水系 深沢砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 木曾川水系 蒲川第2砂防堰堤施設改築工事	工事名	令和7年度 木曾川水系 戦沢第2砂防堰堤管理用道路工事
工期	当初 R7.3.6~R8.2.27 変更 R8.3.19	工期	当初 R7.4.1~R8.1.30 変更 R8.3.19	工期	当初 R7.5.12~R8.2.27 変更 R8.3.19	工期	当初 R7.5.20~R8.2.27 変更 R8.3.19
受注者名	大宗土建(株)	受注者名	奥田工業(株)	受注者名	奥田工業(株)	受注者名	大宗土建(株)
今月作業	3/17完成検査	今月作業	3/9完成検査	今月作業	3/19完成検査	今月作業	3/19完成検査
来月作業	-	来月作業	-	来月作業	-	来月作業	-
							

工事進捗状況 (令和8年 3月末)

上松出張所 NO.2

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和7年度 木曾川水系 桂川第1砂防堰堤法面工事	工事名	令和7年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂地工事	工事名	令和7年度 木曾川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 上松出張所管内整備工事
工期	当初 R7.5.22~R8.2.27 変更 R8.3.19	工期	当初 R7.6.5~R8.2.27 変更	工期	当初 R7.9.1~R8.6.30 変更	工期	当初 R7.10.29~R8.11.30 変更
受注者名	大宗土建(株)	受注者名	大宗土建(株)	受注者名	神稲建設(株)	受注者名	大宗土建(株)
今月作業	3/17完成検査	今月作業	-	今月作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工(打設・脱型・埋戻し)・片付け	今月作業	指示1(読書残土処理場整地)
来月作業	-	来月作業	-	来月作業	書類作成	来月作業	指示1(読書残土処理場整地)
							
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名	令和7年度 木曾川水系 小梨子沢第4砂防堰堤流路工事	工事名	令和7年度 木曾川水系 太田第1砂防堰堤管理用道路工事	工事名	令和7年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂地施設整備工事	工事名	令和7年度 木曾川水系 桂川第1砂防堰堤工事
工期	当初 R8.1.30~R8.9.30 変更	工期	当初 R8.1.30~R8.9.30 変更	工期	当初 R8.3.12~R9.1.31 変更	工期	当初 R8.3.18~R9.2.26 変更
受注者名	木曾土建工業(株)	受注者名	奥田工業(株)	受注者名	大宗土建(株)	受注者名	大宗土建(株)
今月作業	仮設工・流路護岸工(ブロック積工)	今月作業	準備工(起工測量) 道路土工(掘削) 仮設工(工事用道路)	今月作業	施工計画・準備工(工事看板設置等)	今月作業	準備工
来月作業	仮設工・流路護岸工(ブロック積工)	来月作業	道路土工(掘削) 法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付、鉄筋挿入)	来月作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本體工	来月作業	準備工
							



工事進捗状況 (令和8年3月末)

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①		②		③		④	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 下沢地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪2号橋鋼上部工事
工期	当初 R4.9.27~R7.2.28 変更 R7.6.30	工期	当初 R6.7.31~R8.2.27 変更 R7.9.30	工期	当初 R6.8.30~R8.2.27 変更 R7.12.25	工期	当初 R6.7.25~R8.2.27 変更 R7.11.28
受注者名	瀧上工業(株)	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	板垣建設(株)	受注者名	(株)駒井ハルテック
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
<p><b>完成</b></p>		<p><b>完成</b></p>		<p><b>完成</b></p>		<p><b>完成</b></p>	
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋床版工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 芝原地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 上平地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 中大島地区道路建設工事
工期	当初 R7.4.1~R8.2.27 変更 R8.3.11	工期	当初 R7.4.18~R8.2.27 変更 R8.3.27	工期	当初 R7.4.1~R8.2.27 変更 R8.3.19	工期	当初 R7.4.1~R8.2.27 変更 R8.3.27
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	板垣建設(株)	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)鳴海組
今月作業	後片付け	今月作業	後片付け	今月作業	後片付け	今月作業	擁壁工(2-8号補強土壁・2-8号重力式擁壁)、工事用道路工、後片付け
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
<p><b>完成</b></p>		<p><b>完成</b></p>		<p><b>完成</b></p>		<p><b>完成</b></p>	

工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 恵那地区整備工事
工期	当初 R7. 4. 1~R8. 2. 27 変更 R8. 3. 27
受注者名	(株)吉川工務店
今月作業	仮棧橋撤去、後片付け
来月作業	



工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 新田地区西道路建設工事
工期	当初 R7. 4. 1~R8. 2. 27 変更 R8. 3. 27
受注者名	(株)中島工務店
今月作業	道路土工、舗装工、排水構造物工、後片付け
来月作業	



工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 新田地区道路建設工事
工期	当初 R7. 4. 15~R8. 2. 27 変更
受注者名	恵中建設(株)
今月作業	
来月作業	



工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 整備工事
工期	当初 R7. 7. 3~R8. 1. 30 変更 R8. 2. 20
受注者名	宮島建設(株)
今月作業	
来月作業	



工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 下沢地区道路建設工事
工期	当初 R7. 9. 2~R9. 2. 26 変更
受注者名	(株)中島工務店
今月作業	2号橋 床版工(足場解体)、擁壁工 U型擁壁 コンクリート打設
来月作業	擁壁工 U型擁壁 コンクリート打設 補強土壁工(1, 2, 18, 19号)




工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 公文垣内地区道路建設工事
工期	当初 R7. 10. 20~R9. 2. 26 変更
受注者名	(株)加藤工務店
今月作業	道路土工 排水構造物工 仮設工
来月作業	道路土工 排水構造物工 仮設工




工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 恵那地区橋梁下部工事
工期	当初 R7. 10. 29~R9. 2. 26 変更
受注者名	(株)鳴海組
今月作業	橋台工、河川土工、仮設工(仮橋・仮棧橋工、仮締切工)
来月作業	橋台工、法覆護岸工、仮設工(仮締切工)



工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 町屋地区道路建設工事
工期	当初 R8. 1. 23~R9. 2. 26 変更
受注者名	板垣建設(株)
今月作業	排水構造物工
来月作業	道路土工、排水構造物工、舗装工、ブロック積工

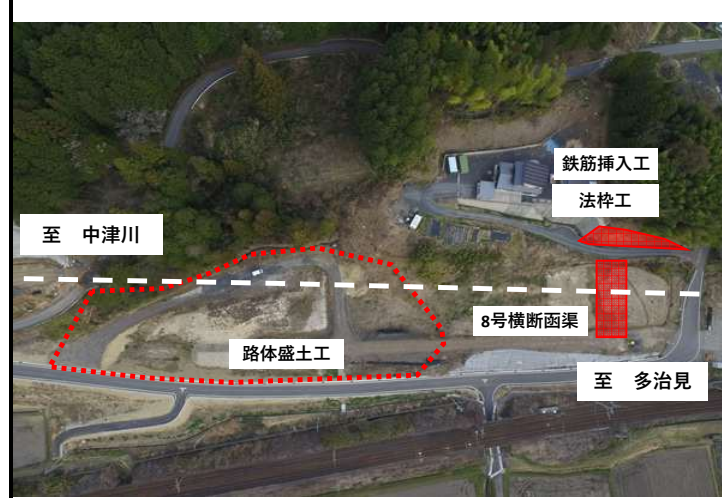

⑰		⑱		⑲		⑳	
工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 公文垣内地区整備工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 上平地区整備工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 恵那7号橋下部工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 建設工事
工期	当初 R8.4.1~R9.2.26 変更	工期	当初 R8.4.1~R9.2.26 変更	工期	当初 R8.1.23~R9.2.26 変更	工期	当初 R8.4.1~R9.2.26 変更
受注者名	㈱加藤工務店	受注者名	㈱中島工務店	受注者名	㈱吉川工務店	受注者名	セントラル建設㈱
今月作業		今月作業		今月作業	準備工・仮設工・橋台工・擁壁工	今月作業	
来月作業	準備工	来月作業	準備工	来月作業	仮設工・橋台工・擁壁工	来月作業	準備工
写真		写真				写真	
⑳		㉑		㉒		㉓	
工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 早曾洞地区整備工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 早曾洞地区道路建設工事	工事名		工事名	
工期	当初 R8.4.1~R9.2.26 変更	工期	当初 R8.4.1~R9.2.26 変更	工期		工期	
受注者名	㈱吉川工務店	受注者名	恵中建設㈱	受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業	準備工	来月作業	準備工	来月作業		来月作業	
写真		写真		写真		写真	

工事進捗状況 (令和8年3月末)

瑞浪国道維持出張所

①		②		③		④	
工事名	令和7年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和6年度 多治見国道東部維持修繕工事	工事名	令和6年度 多治見国道管内橋梁補修工事	工事名	令和7年度 多治見国道中津川地区整備工事
工期	当初 R7. 10. 1~R10. 10. 31 変更	工期	当初 R6. 10. 1~R9. 10. 31 変更	工期	当初 R7. 3. 27~R8. 2. 27 変更 R8. 5. 29	工期	当初 R7. 10. 1~R8. 2. 27 変更 R8. 4. 30
受注者名	日本ハイウェイサービス(株)	受注者名	(有)木曾ハイウェーサービス	受注者名	梅田組(株)	受注者名	(株)加藤工務店
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 舗装修繕工	今月作業	土岐地区 橋梁補修工(夜間)、現場塗装工(夜間)	今月作業	標識工、擁壁工(7号地山補強土工)
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 舗装修繕工	来月作業	準備工	来月作業	擁壁工(7号地山補強土工:空洞対策)
							
R21(下) 7.25kp 欠損部補修、区画線設置		19 63.550上 防護柵設置工(置き式Gr基礎設置)		R19 42.5kp 日の出第1橋側歩道橋(下)			
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和7年度 多治見国道橋梁補修工事	工事名	令和7年度 多治見国道道路照明設備工事	工事名	令和7年度 多治見国道亜炭坑充填工事	工事名	令和7年度 多治見国道CCTV設置工事
工期	当初 R8. 1. 8~R9. 7. 30 変更	工期	当初 R8. 3. 26~R9. 2. 26 変更	工期	当初 R8. 4. 1~R8. 10. 26 変更	工期	当初 R8. 4. 1~R9. 2. 26 変更
受注者名	(株)梅田組	受注者名	NDS(株)	受注者名	徳倉建設(株)	受注者名	エフコム(株)
今月作業	準備工(補修箇所調査)、仮設工(シート張防護)	今月作業	施工計画、設計照査	今月作業	施工計画、設計照査	今月作業	施工計画、設計照査
来月作業	仮設工(シート張防護)、橋梁塗装工	来月作業	準備工	来月作業	準備工	来月作業	準備工
		写真		写真		写真	
R19 47.87kp 明世高架橋(上り)							

⑨					
工事名	令和7年度 多治見国道管内橋梁補修工事				
工期	当初 R8. 4. 1~R9. 2. 26 変更				
受注者名	梅田組(株)				
今月作業	施工計画				
来月作業	施工計画、設計照査				
写真		写真		写真	
写真					
