

工事進捗状況（令和8年7月末）

中津川出張所

①		②		③		④	
工事名	令和7年度 木曽川水系和田沢第2砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 多治見砂防電気通信設備工事	工事名	令和7年度 木曽川水系 正ヶ根第2砂防堰堤改築工事	工事名	令和7年度 中津川出張所管内整備工事
工期	当初 R7. 8. 20～R8. 6. 30 変更	工期	当初 R4. 7. 8～R8. 2. 27 変更 R8. 11. 20	工期	当初 R7. 10. 20～R8. 6. 30 変更 R8. 9. 11	工期	当初 R7. 12. 1～R8. 11. 30 変更
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)ミライト・ワン	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)加藤工務店
今月作業	準備工	今月作業	上松地区：埋設配管工、準備工	今月作業	法面吹付工 仮設工 工事用道路工 砂防締切工 仮水路工	今月作業	天王平道路整備、恵那山林道整備
来月作業		来月作業	上松地区：埋設配管工	来月作業	仮設工 工事用道路工 砂防締切工 仮水路工	来月作業	天王平道路整備、恵那山林道整備
完成		 【木曽維持出張所】光成端箱確		 恵那山林道整備			
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和7年度 木曽川水系荒道谷砂防施設改築工事	工事名	令和7年度 木曽川水系地獄谷除石工事	工事名	令和7年度 木曽川水系新梨沢砂防堰堤工事	工事名	令和8年度 木曽川水系本谷砂防堰堤施設改築工事
工期	当初 R8. 2. 16～R9. 1. 29 変更	工期	当初 R8. 3. 23～R9. 1. 29 変更	工期	当初 R8. 4. 1～R9. 1. 29 変更	工期	当初 R8. 5. 11～R9. 2. 26 変更
受注者名	(株)鳴海組	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	(株)鳴海組
今月作業	堰堤工 型枠 Co打設 鉄筋 構造物取壊し 殻運搬	今月作業	掘削工 残土処理工 仮設工 仮水路工	今月作業	コンクリート堰堤工（コンクリート打設）	今月作業	砂防土工、コンクリート堰堤工、仮設工
来月作業	堰堤工 型枠 Co打設 鉄筋 構造物取壊し 殻運搬	来月作業	掘削工 残土処理工	来月作業	コンクリート堰堤工（コンクリート打設）	来月作業	コンクリート堰堤工
		 玉石(仮置)					

工事進捗状況 (令和8年7月末)

庄内川水系砂防

①		②		③		④	
工事名	令和7年度 妻木出張所管内整備工事	工事名	令和7年度 庄内川水系富士下第4第5砂防堰堤管理用道路工事	工事名	令和8年度 庄内川水系砂防施設改築工事		
工期	当初 R7.12.1 ~R8.11.30 変更	工期	当初 R8.4.20~R8.12.18 変更	工期	当初 R8.4.20 ~R9.2.26 変更		
受注者名	(株) 藤本組	受注者名	(株) 吉川組	受注者名	(株) 藤本組		
今月作業	指示17 妻木管内通信ケーブル支障木撤去作業	今月作業	構造物撤去工、石・ブロック積(張)工	今月作業	コンクリート堰堤工		
来月作業	指示16 下原川流路整備 指示6 富士下第2砂防堰堤整備	来月作業	構造物撤去工、石・ブロック積(張)工	来月作業	コンクリート堰堤工		
指示17 妻木管内通信ケーブル支障木撤去作 							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	

工事進捗状況 (令和8年 7月末)

上松出張所 NO.1

①		②		③		④	
工事名	令和7年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 上松出張所管内整備工事	工事名	令和7年度 木曽川水系 小梨子沢第4砂防堰堤流路工事	工事名	令和7年度 木曽川水系 太田第1砂防堰堤管理用道路工事
工期	当初 R7.9.1～R8.6.30 変更	工期	当初 R7.10.29～R8.11.30 変更	工期	当初 R8.1.30～R8.9.30 変更	工期	当初 R8.1.30～R8.9.30 変更
受注者名	神稲建設(株)	受注者名	大宗土建(株)	受注者名	木曽土建工業(株)	受注者名	奥田工業(株)
今月作業	—	今月作業	指示11(中越残土処理場整備)・指示12(滑川林道修繕、かみ基礎修復)	今月作業	流路護岸工(ブロック積工)、残土運搬	今月作業	道路土工(掘削、残土処理) 法面工(コンクリート吹付、鉄筋挿入)
来月作業	—	来月作業	指示11(中越残土処理場整備)	来月作業	流路護岸工(ブロック積工)、2号床固め、工残土運搬	来月作業	道路土工(掘削、残土処理) 法面工(植生マット) 排水構造物工(暗渠排水)
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和7年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂地施設整備工事	工事名	令和7年度 木曽川水系 桂川第1砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 木曽川水系 地蔵沢第1砂防堰堤工事	工事名	令和8年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤工事
工期	当初 R8.3.12～R9.1.31 変更	工期	当初 R8.3.18～R9.2.26 変更	工期	当初 R8.3.23～R9.1.29 変更	工期	当初 R8.5.7～R9.2.26 変更
受注者名	大宗土建(株)	受注者名	大宗土建(株)	受注者名	大宗土建(株)	受注者名	奥田工業(株)
今月作業	作業土工・仮設工・構造物撤去工	今月作業	コンクリート堰堤本体工	今月作業	立木伐採・木根等処分、仮水路工	今月作業	コンクリート堰堤工
来月作業	作業土工・仮設工・コンクリート副堰堤工	来月作業	コンクリート堰堤本体工	来月作業	立木伐採・木根等処分、仮水路工、掘削、転石破碎	来月作業	コンクリート堰堤工
							

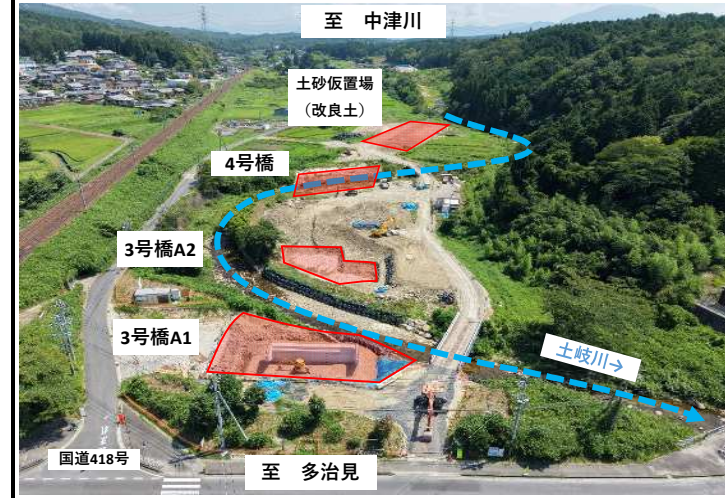
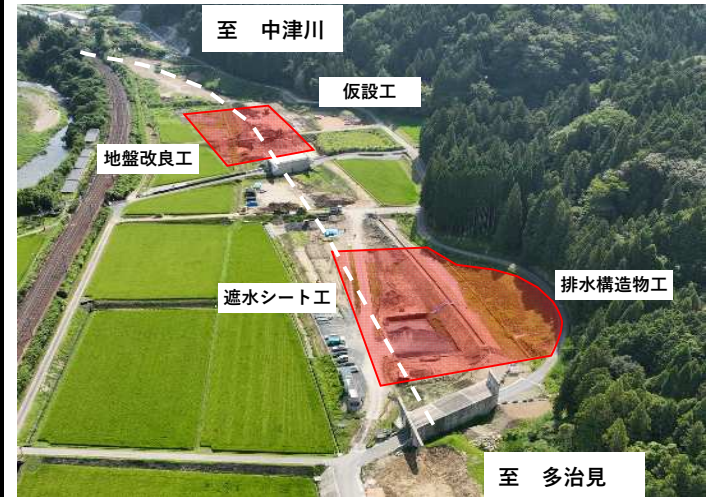
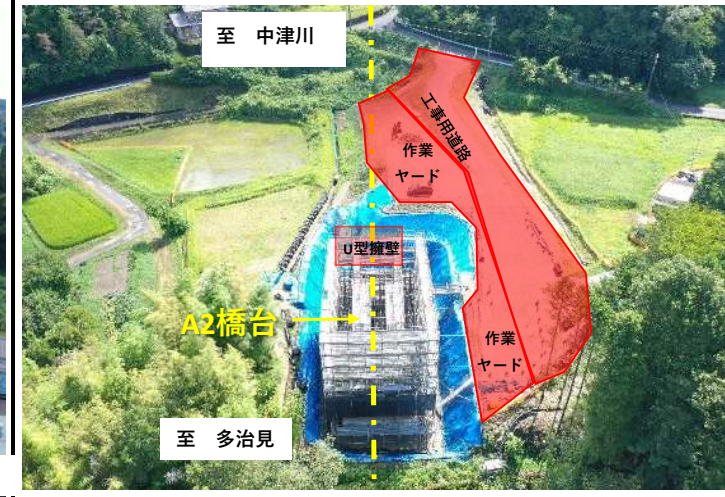
工事進捗状況 (令和8年 7月末)

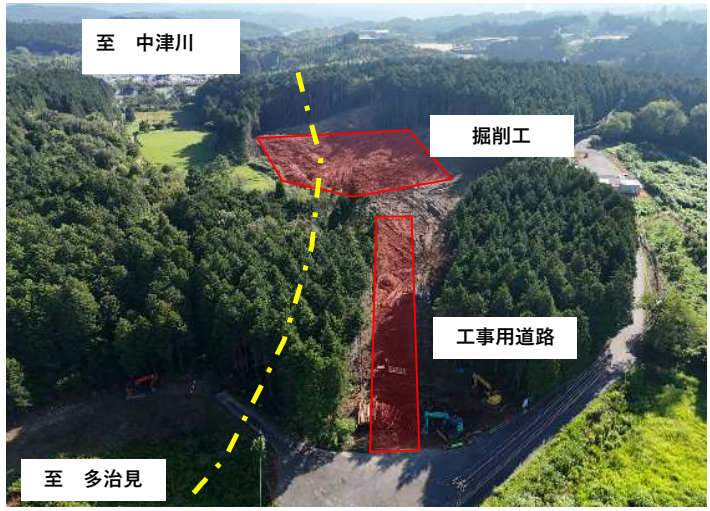
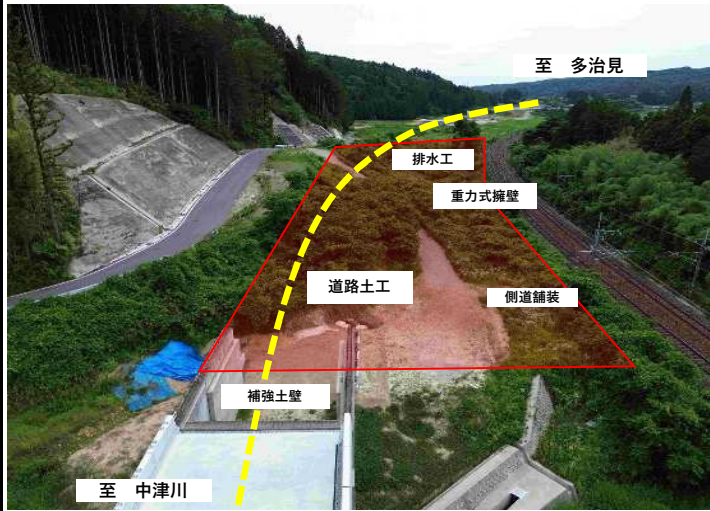
上松出張所 NO. 2

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和8年度 木曾川水系 戦沢第2砂防堰堤工事	工事名	令和8年度 木曾川水系 浦川第2砂防堰堤施設改築工事	工事名	令和7年度 多治見砂防電気通信設備工事	工事名	
工期	当初 R8. 6. 1～R9. 2. 26 変更	工期	当初 R8. 6. 8～R9. 2. 26 変更	工期	当初 R7. 7. 8～R8. 2. 27 変更 R8. 11. 20	工期	
受注者名	木曾土建工業(株)	受注者名	奥田工業(株)	受注者名	(株)ミライト・ワン	受注者名	
今月作業	道路土工、立木伐採	今月作業	コンクリート堰堤工(作業土工、チップング)	今月作業	HH設置場所変更に伴う現地確認	今月作業	
来月作業	道路土工、法面工、排水構造物工	来月作業	コンクリート堰堤工(作業土工、チップング、差し筋、型枠、打設)	来月作業	HH設置及び配管埋設作業	来月作業	
							
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期		工期		工期		工期	
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	

工事進捗状況（令和8年7月末）

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①		②		③		④	
工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 下沢地区道路建設工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 公文垣内地区道路建設工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 恵那地区橋梁下部工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 町屋地区道路建設工事
工期	当初 R7.9.2～R9.2.26 変更	工期	当初 R7.10.20～R9.2.26 変更	工期	当初 R7.10.29～R9.2.26 変更 R7.10.29～R9.3.26	工期	当初 R8.1.23～R9.2.26 変更
受注者名	㈱中島工務店	受注者名	㈱加藤工務店	受注者名	㈱鳴海組	受注者名	板垣建設㈱
今月作業	擁壁工 補強土壁工(1,2,3,4号)	今月作業	道路土工 排水構造物工 仮設工	今月作業	道路土工(土質改良)、橋台工(3号橋A1,A2)、L型擁壁	今月作業	土工、仮設工、法面工
来月作業	擁壁工 補強土壁工(1,2,3,4,18,19,20,21号)、仮設工 法面工(5,6号)	来月作業	道路土工 排水構造物工 仮設工	来月作業	道路土工(土質改良,残土処理)、橋台工(3号橋A2,4号橋A1)	来月作業	法面工、土工
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 公文垣内地区整備工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 上平地区整備工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 恵那7号橋下部工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 建設工事 R8.4.1～R9.3.30
工期	当初 R8.4.1～R9.2.26 変更	工期	当初 R8.4.1～R9.2.26 変更	工期	当初 R8.1.23～R9.2.26 変更	工期	当初 R8.4.1～R9.2.26 変更
受注者名	㈱加藤工務店	受注者名	㈱中島工務店	受注者名	㈱吉川工務店	受注者名	セントラル建設㈱
今月作業	地盤改良工、仮設工	今月作業	準備工、道路土工	今月作業	橋台工	今月作業	早曾洞地区：伐採、構造物撤去工、道路土工 鶴城地区：砕石搬出 踏掛版
来月作業	道路土工、地盤改良工、排水構造物工	来月作業	準備工、地盤改良工、石・ブロック積工	来月作業	橋台工	来月作業	早曾洞地区：道路土工 鶴城地区：踏掛版
							

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 早曽洞地区整備工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 早曽洞地区道路建設工事	工事名	令和8年度 瑞浪恵那道路 名滝地区東部道路建設工事	工事名	令和8年度 瑞浪恵那道路 公文垣内地区東部道路建設工事
工期	当初 R8. 4. 1～R9. 2. 26 変更 R8. 4. 1～R9. 3. 30	工期	当初 R8. 4. 1～R9. 2. 26 変更 R8. 4. 1～R9. 3. 30	工期	当初 R8. 6. 2～R9. 1. 29 変更	工期	当初 R8. 6. 15～R9. 1. 29 変更
受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	恵中建設(株)	受注者名	板垣建設(株)	受注者名	宮島建設(株)
今月作業	早曽洞：準備工 中切：カルバート工 新田：仮排水工	今月作業	準備工(伐採、運搬、処分)	今月作業	道路土工 掘削工・法面工 法面吹付工・仮設盛土	今月作業	準備工
来月作業	早曽洞：準備工 中切：カルバート工、重力式擁壁工 新田：仮排水工	来月作業	工事用道路工、掘削工、擁壁工	来月作業	道路土工 掘削工・法面工 法面吹付工 鉄筋挿入	来月作業	準備工(除草工)
							
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期		工期		工期		工期	
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
写真		写真		写真		写真	

工事進捗状況（令和8年7月末）

瑞浪国道維持出張所

①		②		③		④	
工事名	令和7年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和6年度 多治見国道東部維持修繕工事（R8）	工事名	令和6年度 多治見国道管内橋梁補修工事	工事名	令和7年度 多治見国道中津川地区整備工事
工期	当初 R7. 10. 1～R10. 10. 31 変更	工期	当初 R6. 10. 1～R9. 10. 31 変更	工期	当初 R7. 3. 27～R8. 2. 27 変更 R8. 5. 29	工期	当初 R7. 10. 1～R8. 2. 27 変更 R8. 9. 18
受注者名	日本ハウエイスーパーズ（株）	受注者名	（有）木曾ハイウェーサービス	受注者名	梅田組(株)	受注者名	㈱加藤工務店
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工	今月作業	完成	今月作業	擁壁工（7号地山補強土工）
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工	来月作業		来月作業	擁壁工（7号地山補強土工：伐採工）
							
R19(下) 43.6kp 欠損部補修工		R19 79.250上 構造物補修工（張コシ処理）		R19 42.5kp 日の出第2橋側歩道橋（上）			
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和7年度 多治見国道橋梁補修工事	工事名	令和7年度 多治見国道道路照明設備工事	工事名	令和7年度 多治見国道亜炭坑充填工事	工事名	令和7年度 多治見国道CCTV設置工事
工期	当初 R8. 1. 8～R9. 7. 30 変更	工期	当初 R8. 3. 26～R9. 2. 26 変更	工期	当初 R8. 4. 1～R8. 10. 26 変更	工期	当初 R8. 4. 1～R9. 2. 26 変更
受注者名	㈱梅田組	受注者名	NDS（株）	受注者名	徳倉建設（株）	受注者名	エフコム（株）
今月作業	現場塗装工、鋼桁工	今月作業	現地調査、設計照査	今月作業	地下空洞充填工（充填孔・充填到達確認孔設置工）	今月作業	現地調査、設計照査
来月作業	橋梁地覆補修工（P2-P5径間）、鋼桁工、排水施設工	来月作業	現地調査、資材手配	来月作業	地下空洞充填工（充填孔・充填到達確認孔設置工）	来月作業	現地調査、設計照査
							
R19 47.87kp 明世高架橋（上り）		池田町地下道		R21 15.1kp 充填孔削孔状況		R19(下) 73.0kp 付近	

⑨		⑩					
工事名	令和7年度 多治見国道管内橋梁補修工事	工事名	令和8年度 多治見国道交通事故対策工事				
工期	当初 R8. 4. 1～R9. 2. 26 変更	工期	当初 R8. 5. 11～R8. 12. 25 変更				
受注者名	梅田組(株)	受注者名	セントラル建設（株）				
今月作業	縁石工、橋梁補修工	今月作業	準備工、道路付属施設工、区画線工				
来月作業	橋梁床版工、橋梁補修工	来月作業	道路付属施設工、区画線工、薄層カラー舗装工				
				写真		写真	
R19 70.99kp恵那大橋(上り)		上恵土地区					
写真							
