



※作業日予定のない、日曜・祝日および年末年始は、通行規制を行いません。

1

完成

| | |
|----------|--|
| 業者名 | (株)栗山組 |
| 工事名 | 平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 新小和沢橋下部工事 |
| 工事期間 | 平成25年10月29日～平成26年 9月30日 |
| 工事内容 | 新小和沢橋 橋脚 1基 |
| 10月の作業内容 | 昨年の12月より着工しました本工事も、9月末をもちまして完成しました。工事期間中、大型車両の通行及び発破作業等で、地元の皆様には大変ご迷惑お掛け致しましたが、無事故・無災害で工事を終了することが出来ました。皆様のご理解、ご協力が有難うございました。 |
| お問い合わせ先 | 現場事務所 監理技術者 山添 0574-43-1665 |

<進捗状況> 進捗率 100% (H26.9月末)



着工前



9月末

発注者

国土交通省 中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)

工事課

新丸山ダム

井尻八百津線関連工事だより(10月度)

皆様には日頃から、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。


工事の近況状況及び平成26年10月度の工事予定をお知らせ致します。

ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工しますので、ご理解とご協力の程お願い申し上げます。

又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解を賜りますようお願い致します。

尚、何かお気づきの点などがございましたら、遠慮なくお申し付け下さい。

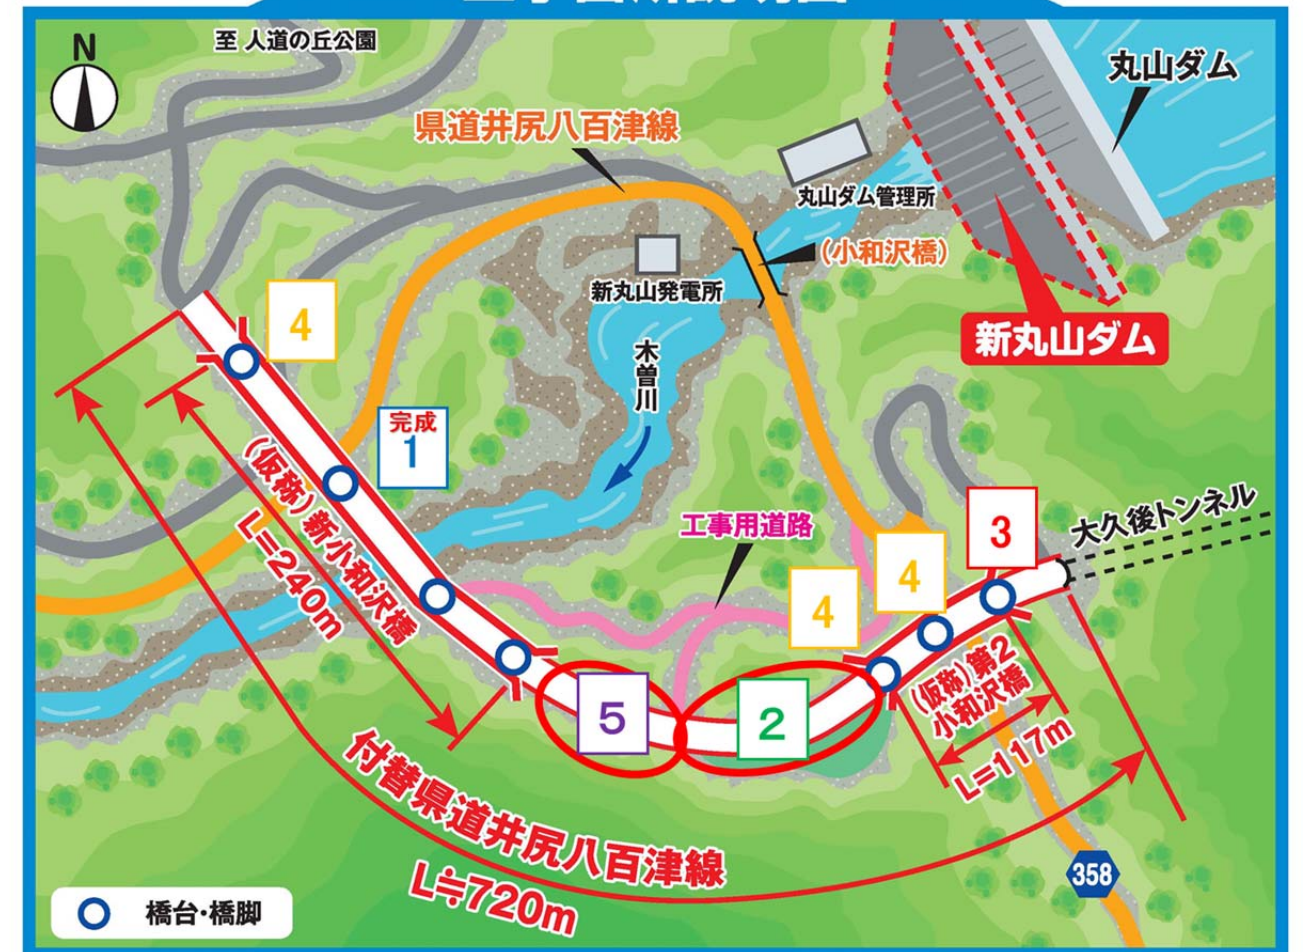


工事箇所説明図






2

| | |
|---|---|
| 業者名 | (株)土谷組 |
| 工事名 | 平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 改良工事 |
| 工事期間 | 平成25年11月22日～平成26年11月28日 |
| 工事内容 | 道路改良(土工等)1式 |
| 10月の作業内容 | 主に本線の路盤工及び工事用道路の舗装工を行います。 1日当たり10台程度のダンプトラックが通行します。 ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 |
| お問い合わせ先 | 現場事務所 現場代理人 大島 0574-50-2739 |
| <p><進捗状況> 進捗率 90.0% (H26.9月末)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 着工前 9月末 </div> | |



4

| | |
|--|---|
| 業者名 | 日産工業(株) |
| 工事名 | 平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 橋梁下部工事 |
| 工事期間 | 平成26年 3月14日～平成27年 1月16日 |
| 工事内容 | 新小和沢橋 橋台 1基、第2小和沢橋 橋台 1基、橋脚 1基 |
| 10月の作業内容 | (仮称)第2小和沢橋A2橋台の基礎(深礎)工事で火薬を使用して掘削作業を行います。発破作業は、1日2回から3回予定しております。 発破時間、発破に伴う規制については、お知らせ看板にてお知らせ致します。 ご迷惑をおかけいたしますがご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 |
| お問い合わせ先 | 現場事務所 現場代理人 遠藤 0574-50-8629 |
| <p><進捗状況> 進捗率 11.8% (H26.9月末)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 着工前(第2小和沢橋 A2) 9月末(第2小和沢橋 A2) </div> | |

3

| | |
|--|--|
| 業者名 | 曙開発(株) |
| 工事名 | 平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 第2小和沢橋下部工事 |
| 工事期間 | 平成25年12月 7日～平成26年10月31日 ※工期延期予定です |
| 工事内容 | 第2小和沢橋 橋台 1基、道路改良(土工等)1式 |
| 10月の作業内容 | 現在橋の台座(橋台)の基礎を完了し、本体の下の部分を施工中です。今後、上の部分を作り、順次埋戻しなどを行っていきます。 ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。 |
| お問い合わせ先 | 現場事務所 現場代理人 今井 0574-43-2650 |
| <p><進捗状況> 進捗率 65.0% (H26.9月末) 橋台施工中です。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 着工前 9月末 </div> | |

5

| | |
|---|--|
| 業者名 | 北川工務(株) |
| 工事名 | 平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線改良工事 |
| 工事期間 | 平成26年 8月20日～平成27年 3月10日 |
| 工事内容 | 道路改良(土工等)1式 |
| 10月の作業内容 | 10月より工事を着工する予定です。立木の伐採・搬出、仮水路の「ルゲートパイプ」の設置、床固め(函渠)の床掘りを行います。 ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します |
| お問い合わせ先 | 現場事務所 現場代理人 瀬瀬 0574-25-2323 |
| <p><進捗状況> 進捗率 0% (H26.9月末)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   <div style="text-align: center;"> <p>未着工</p> <p>9月末</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 着工前 </div> | |
