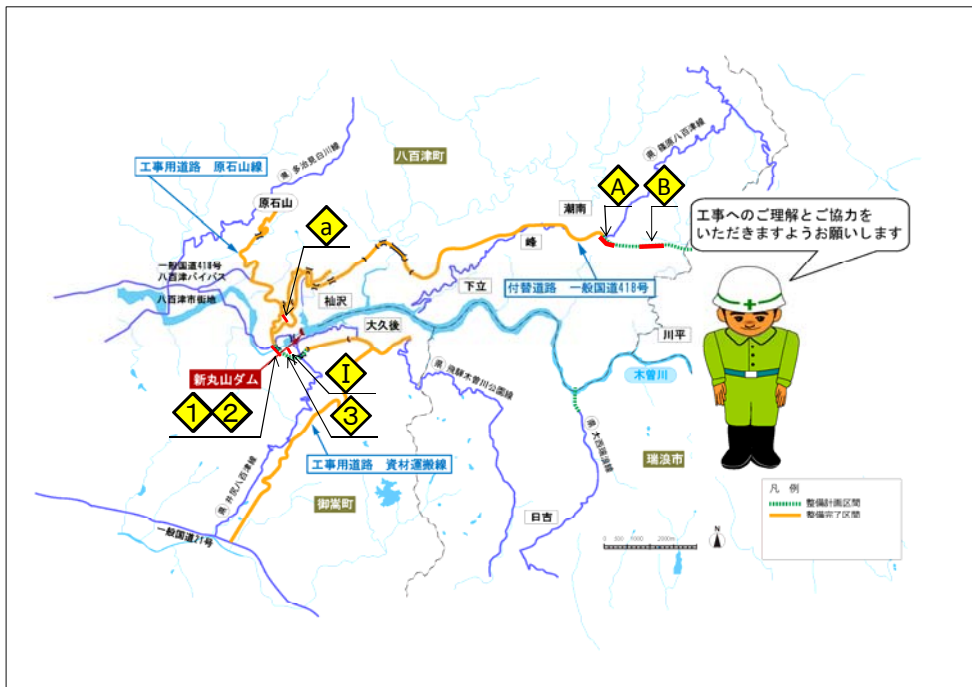


工事進捗 1 月期

新丸山ダム工事事務所 平成27年度



I

平成27年12月末時点

業者名	(株) 栗山組
工事名	平成26年度 新丸山ダム転流工進入路工事
工事期間	平成27年2月 4日～平成28年 2月 1日 ※ 工期末が延期される予定です。
工事内容	①ダム工事に必要な転流工(仮排水路)を整備するための工事用道路を作ります。 ②町道上之洞南森線の先線(未供用区間)の道路改良工事を行います。
1月の作業内容	②において道路土工、舗装工、擁壁工の施工を予定しています。 作業に伴い、大型車両が通行しますが、安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 山添 雅之 0574-43-1765
進捗率	



着工前



12月末


1

平成27年12月末時点

業者名	北川工務(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋下部工事
工事期間	平成26年10月18日～平成28年 2月 22日 ※ 工期末が変更されました
工事内容	①(仮称)新小和沢橋の左岸側の下部工(A1橋台、P1橋脚)及び擁壁工等を造ります。 ②大久後トンネル付近の擁壁等を造ります。
1月の作業内容	①については、無事完了しました。 ②引き続き擁壁・水路の施工を予定しています。 なお、工事に伴う騒音、振動及び工事用車両の安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 井戸 0574-25-2323
進捗率	
 <p style="text-align: center;"> 着工前 下部工 完成 1工区 </p> <p style="text-align: right;">12月末</p>	


2

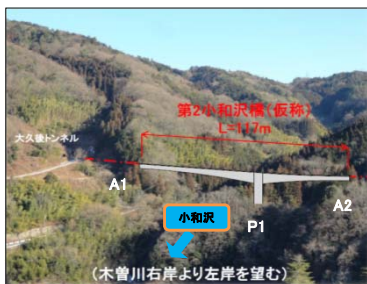
平成27年12月末時点

業者名	(株)IHインフラ建設
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋PC上部工事
工事期間	平成27年 3月12日～平成28年 9月 30日
工事内容	(仮称)新小和沢橋の上部工(橋桁)を架設します。
1月の作業内容	左岸側：P1橋脚脚頭部の施工(鉄筋、型枠、コンクリート)を行います。 右岸側：張出架設工法により、PC片持箱桁製作工を開始します。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 河合 0574-43-4650
進捗率	
 <p style="text-align: center;"> 完成イメージ 左岸側P1橋脚 足場組立状況 右岸側P2橋脚 移動作業車組立状況 </p>	

3

平成27年12月末時点

業者名	(株)安部日鋼工業
工事名	平成27年度 新丸山ダム井尻八百津線第2小和沢橋PC上部工事
工事期間	平成27年10月22日～平成28年10月14日
工事内容	(仮称)第2小和沢橋の上部工(橋桁)を架設します。
1月の作業内容	橋脚足場の組立完了に伴い、P1脚頭部の施工(鉄筋・型枠組立、コンクリート打設)を行います。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 渡邊 健治 0574-43-0201
進捗率	




完成イメージ



12月末

A

平成27年12月末時点

業者名	青協建設(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム国道418号6号橋下部工事
工事期間	平成27年1月27日～平成28年2月26日
工事内容	国道418号線6号橋のA1橋台1基、P1橋脚1基、工事用道路1式
1月の作業内容	P1橋脚は足場・支保工を解体後埋戻しを行い、排水工ではA1橋台からの縦溝を施工します。引き続き地元の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解と、ご協力の程よろしくお願いたします。
問い合わせ先	現場事務所 0575-42-1021 現場代理人 川村 雄二
進捗率	





着工前



12月末



B

平成27年12月末時点

業者名	セントラル建設(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム国道418号潮見地区改良工事
工事期間	平成27年2月 7日～平成28年3月11日
工事内容	八百津町潮見地区において、付け替え国道418号道路工事(土工、擁壁等)を行います。
1月の作業内容	町道村木谷線の排水構造物工事と舗装打換工事を行います。 現場付近は、道路幅員の狭い区間がありますが、通行車両に注意して工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 西尾 0574-42-2001
進捗率	<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 0102030405060708090100 </div> <div style="background-color: #4a86e8; width: 95%; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>着工前</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>12月末</p> </div> </div>	

a

平成27年12月末時点

業者名	曙開発(株)
工事名	平成27年度 新丸山ダム管理所敷地造成工事
工事期間	平成27年7月29日～平成28年5月26日 ※ 工期末が変更されました
工事内容	ダム管理所の敷地造成工事を行います。
1月の作業内容	土砂運搬作業と擁壁(現場制作L型擁壁、ブロック積擁壁)工事を行っています。引き続き、土砂の運搬と擁壁工事を行う予定です。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 今井 TEL:0574-43-2332
進捗率	<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 0102030405060708090100 </div> <div style="background-color: #4a86e8; width: 30%; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>着工前</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>12月末</p> </div> </div>	
