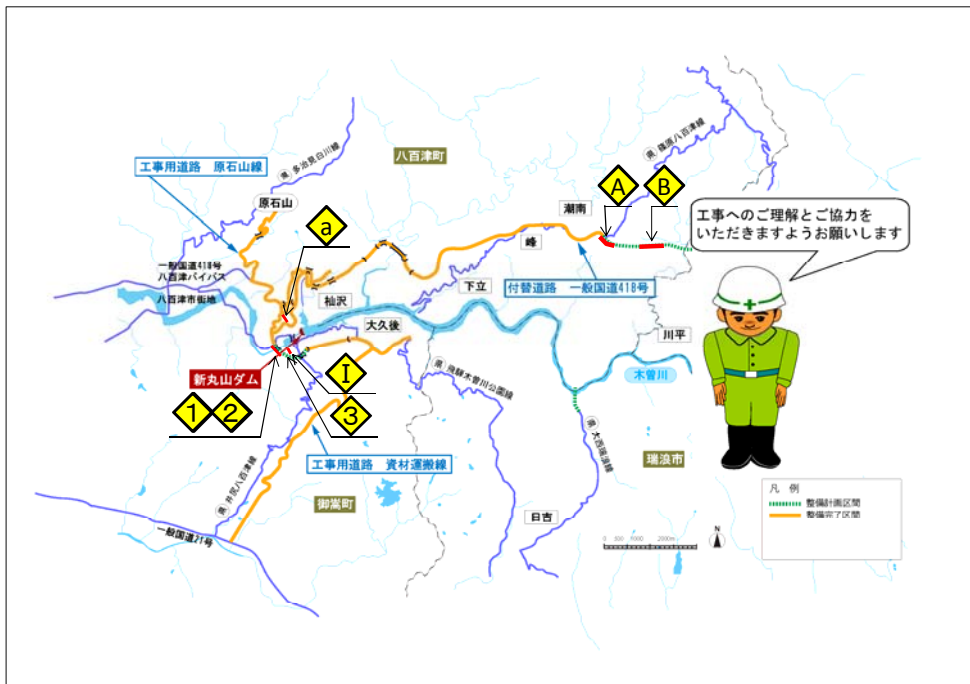


工事進捗 2月期

新丸山ダム工事事務所 平成27年度



I

平成27年1月末時点

業者名	(株) 栗山組
工事名	平成26年度 新丸山ダム転流工進入路工事
工事期間	平成27年2月 4日～平成28年 3月28日 ※ 工期末が変更されました
工事内容	①ダム工事に必要な転流工（仮排水路）を整備するための工事用道路を造ります。 ②町道上之洞南森線の先線（未供用区間）の道路改良工事を行います。
2月の作業内容	2月は、②において道路土工、擁壁工の施工を予定しています。 作業に伴い、大型車両が通行しますが、安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 山添 雅之 0574-43-1765
進捗率	




着工前



1月末

1

平成27年1月末時点

業者名	北川工務(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋下部工事
工事期間	平成26年10月18日～平成28年 2月22日
工事内容	①(仮称)新小和沢橋の左岸側の下部工(A1橋台、P1橋脚)及び擁壁等を造ります。 ②大久後トンネル付近の擁壁工等を造ります。
2月の作業内容	①については、無事完了しました。 ②については、引き続き擁壁・水路の施工を予定しています。 なお、工事に伴う騒音、振動及び工事用車両の安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 井戸 0574-25-2323
進捗率	



着工前




1月末

1工区

2

平成27年1月末時点

業者名	(株)IHインフラ建設
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋PC上部工事
工事期間	平成27年 3月12日～平成28年 9月30日
工事内容	(仮称)新小和沢橋の上部工(橋桁)を架設します。
2月の作業内容	左岸側：P1橋脚脚頭部の施工(鉄筋、型枠、コンクリート)を行います。 右岸側：張出架設工法により、PC片持箱桁製作工を開始します。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 河合 0574-43-4650
進捗率	



完成イメージ

左岸側P1橋脚



足場組立状況


右岸側P2橋脚



移動作業車組立状況

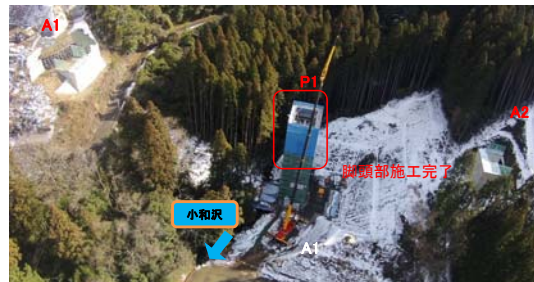
3

平成27年1月末時点

業者名	(株)安部日鋼工業
工事名	平成27年度 新丸山ダム井尻八百津線第2小和沢橋PC上部工事
工事期間	平成27年10月22日～平成28年10月14日
工事内容	(仮称)第2小和沢橋の上部工(橋桁)を架設します。
2月の作業内容	脚頭部の施工が完了し、タワークレーンの組立、柱頭部の施工(支保・型枠・鉄筋・PC組立)を行います。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 渡邊 健治 0574-43-0201
進捗率	




完成イメージ



1月末

A

平成27年1月末時点

業者名	青協建設(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム国道418号6号橋下部工事
工事期間	平成27年1月27日～平成28年2月26日
工事内容	国道418号線6号橋のA1橋台1基、P1橋脚1基、工事用道路1式
2月の作業内容	工事用道路は入口付近で植生吹付を施工し、排水工はA1橋台からの縦溝を施工します。引き続き、地元の皆様にはご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 0575-42-1021 現場代理人 川村 雄二
進捗率	





着工前



1月末


B

平成27年1月末時点

業者名	セントラル建設(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム国道418号潮見地区改良工事
工事期間	平成27年2月 7日～平成28年3月11日
工事内容	八百津町潮見地区において、付け替え国道418号道路工事(土工、擁壁等)を行います。
2月の作業内容	舗装打換工事・法面工事・後片付けを行います。工事も終盤となりました。無事故で完成するように行って参りますので、引き続きご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 西尾 0574-42-2001
進捗率	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-bottom: 1px solid black; background-color: #4a86e8; margin-right: 5px;"></div> <div style="text-align: right; margin-right: 5px;">100</div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>着工前</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>1月末</p>  </div> </div>	

a

平成27年1月末時点

業者名	曙開発(株)
工事名	平成27年度 新丸山ダム管理所敷地造成工事
工事期間	平成27年7月29日～平成28年5月26日
工事内容	新丸山ダム管理所の敷地造成工事を行います。
2月の作業内容	敷地下側のブロック積を完了しました。現在、擁壁(現場制作L型擁壁)工事を行っています。引き続き、擁壁工事を行う予定です。工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 今井 TEL:0574-43-2332
進捗率	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; border-bottom: 1px solid black; background-color: #4a86e8; margin-right: 5px;"></div> <div style="text-align: right; margin-right: 5px;">100</div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>着工前</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>1月末</p>  </div> </div>	
