


# 工事進捗 7月期

新丸山ダム工事事務所 平成28年度

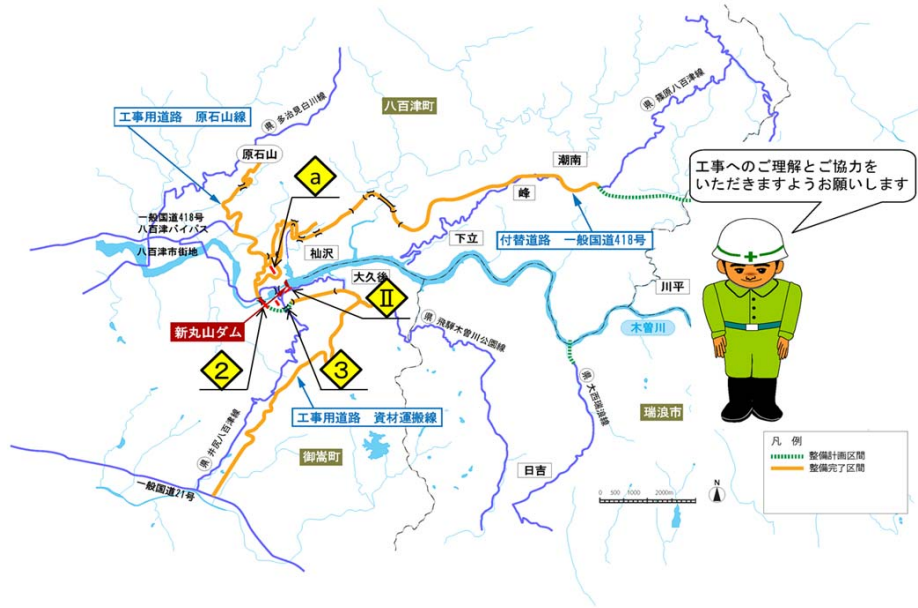

## II

平成28年6月末時点

業者名	小池土木（株）	
工事名	平成27年度 新丸山ダム転流工工事用道路工事	
工事期間	平成27年2月11日～平成28年11月17日(予定)	※ 工期末が変更されました
工事内容	新丸山ダム建設に必要な転流工（仮排水路）を整備するための工事用道路を造ります。	
7月の作業内容	山を削っていきます。 1日30台程度、ダンプトラックにて土砂の運搬を行っています。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。	
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 肥田 0574-43-0050	
進捗率		



着工前



6月末

# 2

平成28年6月末時点

業者名	(株) IHI インフラ建設
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋PC上部工事
工事期間	平成27年 3月12日～平成29年 3月 8日
工事内容	(仮称)新小和沢橋の上部工(橋桁)を架設します。
7月の作業内容	左岸側：張出架設工法により、PC片持箱桁(1,2,3ﾌﾟﾛｯｸ)製作工の施工を行います。 右岸側：張出架設工法により、PC片持箱桁(14,15,16ﾌﾟﾛｯｸ)製作工の施工を行います。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 河合 0574-43-4650
進捗率	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>左岸側P1橋脚</p> <p>17ﾌﾟﾛｯｸ施工状況</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>右岸側P2橋脚</p> <p>13ﾌﾟﾛｯｸ施工状況</p> </div> </div>	

# 3

平成28年6月末時点

業者名	(株) 安部日鋼工業
工事名	平成27年度 新丸山ダム井尻八百津線第2小和沢橋PC上部工事
工事期間	平成27年10月22日～平成28年10月14日
工事内容	(仮称)第2小和沢橋の上部工(橋桁)を架設します。
7月の作業内容	移動作業車(ワーゲン)を使用した張出し部の施工(型枠・鉄筋・PC・コンクリート)を引き続き行います。全14ブロック中6ブロックの完了予定です。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 渡邊 健治 0574-43-0201
進捗率	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>完成イメージ</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>6月末</p> </div> </div>	

a

平成28年6月末時点

業 者 名	曙開発（株）
工 事 名	平成27年度 新丸山ダム管理所敷地造成工事
工事期間	平成27年7月29日～平成28年6月30日
工事内容	新丸山ダムを作る際に移転する管理所の敷地をつくる工事を行います。
7月の作業内容	6月末完成予定です。公民館前の舗装の直しも完了しました。7月の完成検査の準備を行っています。工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 今井 TEL：0574-43-2332
進捗率	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; text-align: center;">0    10    20    30    40    50    60    70    80    90    100</div> <div style="flex-grow: 1; position: relative; height: 20px; background-color: #4a86e8; margin-left: 10px;"> <div style="position: absolute; right: 0; top: 0; bottom: 0; width: 10px;"></div> </div> </div>

