

越美山系砂防事務所 令和6年度工事進捗状況


【揖斐川流域】

- | | | | | |
|---|-------|------------------------------------|-------|-----------|
| ① | 令和5年度 | 越美山系砂防ナンノ谷砂防堰堤1号工事 | 【完 成】 | ………P. 2 |
| ② | 令和5年度 | 越美山系砂防ナンノ谷砂防堰堤2号工事 | 【完 成】 | ………P. 3 |
| ③ | 令和5年度 | 越美山系砂防大谷川第3砂防堰堤工事 | 【完 成】 | ………P. 4 |
| ④ | 令和5年度 | 越美山系砂防百々之木谷第1砂防堰堤管理用道路工事 | 【完 成】 | ………P. 5 |
| ⑤ | 令和6年度 | 越美山系砂防奥ノ洞砂防堰堤工群及びバンタ川第1砂防堰堤管理用道路工事 | 【完 成】 | ………P. 6 |
| ⑥ | 令和6年度 | 越美山系砂防三倉大谷第1砂防堰堤及び下谷第2砂防堰堤管理用道路工事 | 【完 成】 | ………P.7～ 8 |
| ⑦ | 令和6年度 | 越美山系砂防施設整備工事 | 【完 成】 | ………P.9～11 |

【根尾川流域】

- | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|-------|----------|
| ⑧ | 令和6年度 | 越美山系砂防アテガ平谷第1砂防堰堤工事用道路及び蛇抜谷整備工事 | 【完 成】 | ………P.12 |
| ⑨ | 令和5年度 | 越美山系砂防ガラン谷第1砂防工事 | 【完 成】 | ………P. 13 |
| ⑩ | 令和5年度 | 越美山系砂防天神堂岡谷第2砂防堰堤管理用道路外1件工事 | 【完 成】 | ………P. 14 |
| ⑪ | 令和5年度 | 越美山系砂防天神堂岡谷砂防堰堤管理用道路工事 | 【施工中】 | ………P. 15 |

令和6年度 施工箇所 位置図

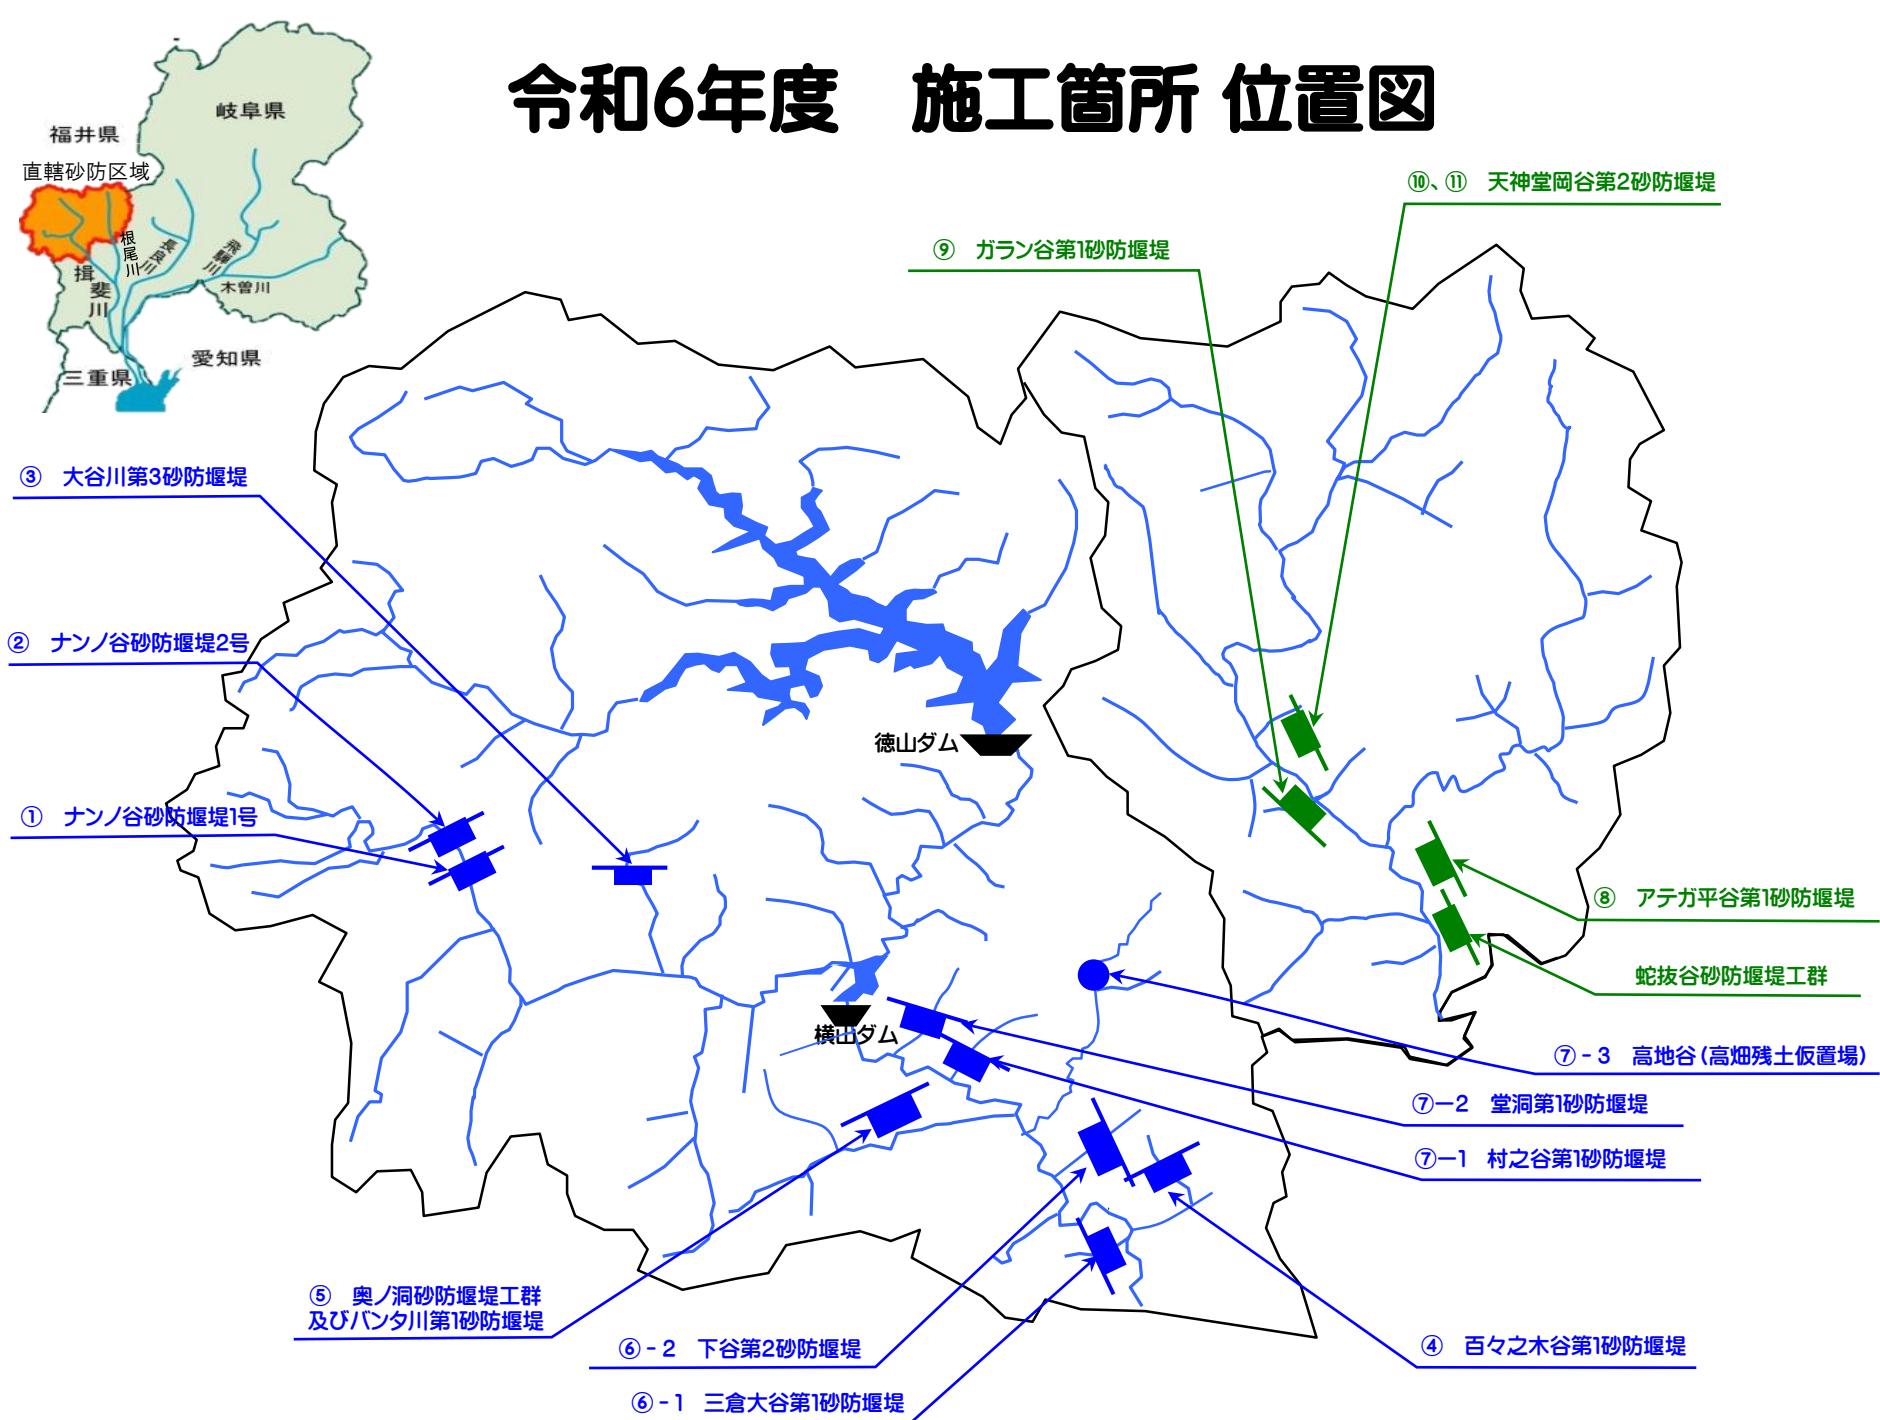


令和5年度 越美山系砂防ナンノ谷砂防堰堤1号工事

工事概要

工事期間	自	令和 6年 4月 1日
	至	令和 7年 2月28日
工事場所	揖斐郡揖斐川町坂内川上地先	
施工者	(株)久保田工務店	
監理技術者	石原 敬太	
工事目的	本工事は老朽化したナンノ谷砂防堰堤1号を改良するための工事を左岸側にて行うものです。右岸側護床工および河川切り替えも実施します。	
工事概要	・砂防土工、コンクリート堰堤工、護床工・根固め工、仮設工	

令和7年2月末現在(工事進捗率:100%)

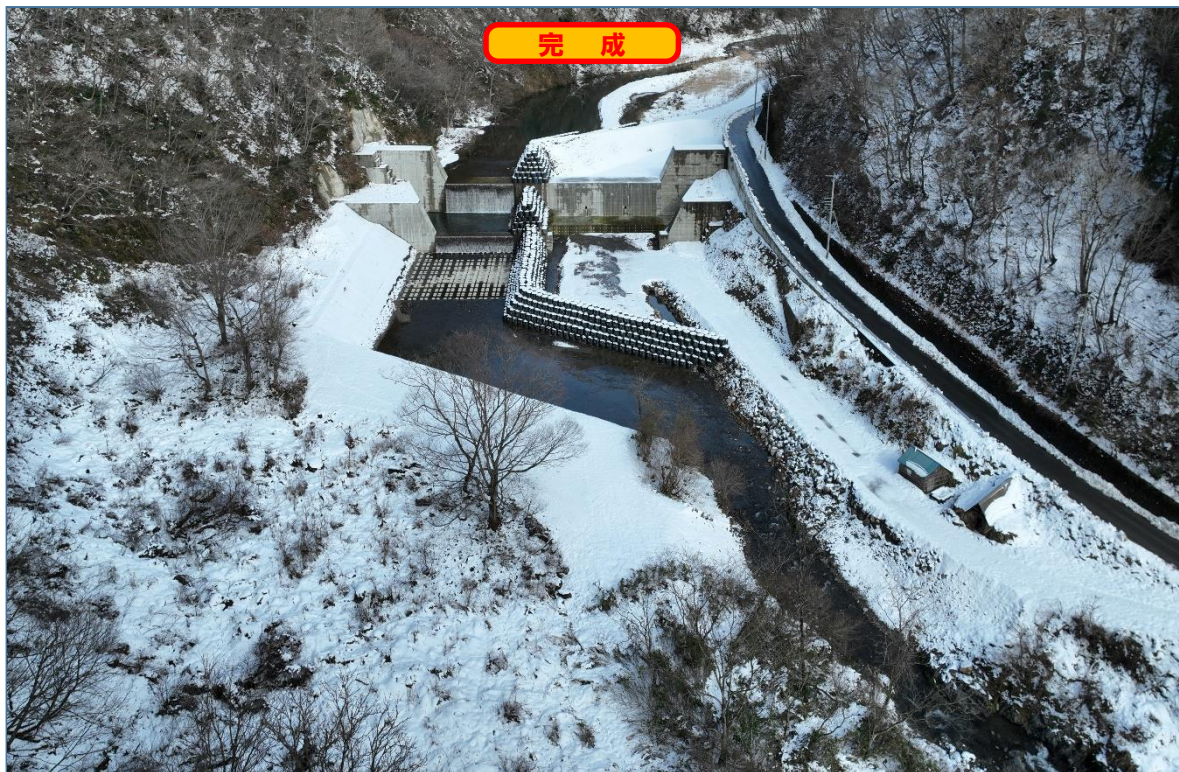

令和5年度 越美山系砂防ナンノ谷砂防堰堤2号工事

工事概要

工事期間	自	令和 6年 4月 1日
	至	令和 7年 2月28日
工事場所	揖斐郡揖斐川町坂内川上地先	
施工者	(株)久保田工務店	
監理技術者	野村 隆豊	
工事目的	本工事は老朽化したナンノ谷砂防堰堤2号を改良するための工事を右岸側にて行うものです。	
工事概要	・砂防土工、コンクリート堰堤工、仮設工	

令和7年2月末現在(工事進捗率:100%)



令和5年度 越美山系砂防大谷川第3砂防堰堤工事

工事概要

工事期間	自	令和 6年 3月 2日
	至	令和 7年 3月28日
工事場所	揖斐郡揖斐川町坂内広瀬地先	
施工者	(株)久保田工務店	
監理技術者	小松 勝裕	
工事目的	本工事は土石流危険渓流「大谷川」に第3砂防堰堤を設置するものです。本堤左岸の床掘～コンクリート打設および工事用道路を設置するものです。	
工事概要	・コンクリート堰堤工、仮設工	

令和7年3月末現在(工事進捗率:100%)



令和5年度 越美山系砂防百々之木谷第1砂防堰堤管理用道路工事

工事概要

工事期間	自	令和 6年 4月 1日
	至	令和 7年 2月28日
工事場所	揖斐郡揖斐川町乙原地先	
施工者	加藤建設(株)	
監理技術者	川村 庄治	
工事目的	本工事は百々之木谷第1砂防堰堤の管理用道路を設置するものです。	
工事概要	・道路土工、法面工	

令和7年2月末現在(工事進捗率:100%)



令和6年度 越美山系砂防奥ノ洞砂防堰堤工群及び バンタ川第1砂防堰堤管理用道路工事

工 事 概 要

工事期間	自	令和 6年 5月24日
	至	令和 7年 3月28日
工事場所	揖斐郡揖斐川町日坂地先	
施 工 者	西濃建設(株)	
監理技術者	大野 洋介	
工事目的	本工事は、奥ノ洞砂防堰堤工群からバンタ川砂防堰堤(未施工)までの管理用道路を設置するものです。 また、奥ノ洞砂防堰堤下流の流路を整備するものです。	
工事概要	・道路土工、法面工、舗装工、擁壁工、ブロック積工、排水構造物工、防護柵工、仮設工、河川土工、取付護岸工、導流水路工、砂防土工、護床工・根固め工	

令和7年3月末現在(工事進捗率:100%)



令和6年度 越美山系砂防三倉大谷第1砂防堰堤及び 下谷第2砂防堰堤管理用道路工事【三倉大谷工区】

工 事 概 要

工事期間	自	令和 6年 5月24日
	至	令和 7年 2月28日
工事場所	揖斐郡揖斐川町三倉地先	
施 工 者	(株)ヤマモト	
監理技術者	中島 時義	
工事目的	本工事は、土石流危険溪流「三倉大谷」に砂防堰堤を設置するものです。本堤上流へ到達する管理用道路の整備を行うものです。	
工事概要	・法面工、仮設工	

令和7年2月末現在(工事進捗率:100%)



令和6年度 越美山系砂防三倉大谷第1砂防堰堤及び 下谷第2砂防堰堤管理用道路工事【下谷工区】

工 事 概 要

工事期間	自	令和 6年 5月24日
	至	令和 7年 2月28日
工事場所	揖斐郡揖斐川町三倉地先	
施 工 者	(株)ヤマモト	
監理技術者	中島 時義	
工事目的	本工事は、土石流危険溪流「下谷」に設置された砂防堰堤に管理用道路の整備を行うものです。	
工事概要	・舗装工、踏掛版設置工、 橋梁附属物工	

令和7年2月末現在(工事進捗率:100%)



令和6年度 越美山系砂防施設整備工事【村之谷工区】

工事概要

工事期間	自	令和 6年 5月10日
	至	令和 7年 2月28日
工事場所	揖斐郡揖斐川町檜原地先	
施工者	西濃建設(株)	
監理技術者	高木 克英	
工事目的	本工事は土石流危険渓流である「村之谷」に砂防堰堤の設置を完了しました。設置に伴う仮設物の撤去及び管理用道路の舗装を行うものです。	
工事概要	・砂防土工、法面工、擁壁工、舗装工、砂防堰堤付属物設置工、流路護岸工、排水構造物工、防護柵工、仮設工	

令和7年2月末現在(工事進捗率:100%)



令和6年度 越美山系砂防施設整備工事【堂洞工区】

工事概要

工事期間	自	令和 6年 5月10日
	至	令和 7年 2月28日
工事場所	揖斐郡揖斐川町東横山地先	
施工者	西濃建設(株)	
監理技術者	高木 克英	
工事目的	本工事は土石流危険溪流である「堂洞」に砂防堰堤を設置するため工事用道路を設置するものです。	
工事概要	・道路土工、法面工、仮設工	

令和7年2月末現在(工事進捗率:100%)



令和6年度 越美山系砂防施設整備工事【高地谷工区】

工事概要

工事期間	自	令和 6年 5月10日
	至	令和 7年 2月28日
工事場所	揖斐郡揖斐川町小津地先	
施工者	西濃建設(株)	
監理技術者	高木 克英	
工事目的	本工事は管内既設砂防堰堤の維持管理及び高地谷堰堤工事において発生した土砂を有効活用するため、搬出作業を行うものです。	
工事概要	・河川土工、排水構造物工、付属物設置工、除草工、維持作業工	

令和7年2月末現在(工事進捗率:100%)



令和6年度 越美山系砂防アテガ平谷第1砂防堰堤工事用道路及び蛇拔谷整備工事

工事概要

工事期間	自	令和 6年 6月 3日
	至	令和 7年 3月27日
工事場所	本巢市根尾板所	
施 工 者	(株)所組	
監理技術者	守田 康司	
工事目的	本工事は土石流対策として「アテガ平谷」に堰堤を設置するための工事用道路の設置を行います。	
工事概要	・道路土工、擁壁工	

令和7年3月末現在(工事進捗率:100%)



令和5年度 越美山系砂防天神堂岡谷第2砂防堰堤管理用道路外1件工事

工事概要

工事期間	自	令和 5年 7月19日
	至	令和 6年 5月31日
工事場所	本巣市根尾天神堂岡谷地先(天神堂) 本巣市根尾中地先(中沢)	
施工者	(株)所組	
監理技術者	坂本 法男	
工事目的	本工事は土石流危険渓流である「天神堂岡谷」に砂防堰堤を設置するため工事用道路を設置するとともに、「中沢」の法面の補修をします。	
工事概要	・道路土工、法面工、擁壁工、排水構造物工、舗装工、防護柵工、仮設工	



令和6年5月末現在(工事進捗率:100%)



令和5年度 越美山系砂防天神堂岡谷砂防堰堤管理用道路工事

工事概要

工事期間	自	令和 6年 4月 1日
	至	令和 7年 8月29日
工事場所	本巣市根尾天神堂岡谷地先	
施 工 者	(株)所組	
監理技術者	小澤 清孝	
工事目的	本工事は土石流危険渓流である「天神堂岡谷」に砂防堰堤を設置するため工事用道路を設置する。	
工事概要	・道路土工、法面工、擁壁工、排水構造物工、防護柵工、仮設工	



令和7年3月末現在(工事進捗率:65.8%)

