


# 国道156号 郡上大橋架替 【工事説明会】

国土交通省中部地方整備局 岐阜 国道事務所


令和7年8月21日

#### 本日の説明項目




- 1. 郡上大橋架替事業概要
- 2. 郡上大橋架替工事の流れ
- 3. 今年度の工事について
- 4. 工事中の通行規制について
- 5. 質疑応答

#### 郡上大橋架替事業概要



#### ◆事業内容

- 国道156号郡上大橋は、昭和32年に完成してから60年以上経過した橋梁で、点検補修・修 繕を実施しているものの、老朽化に伴う損傷が発生しています。
- また、車道幅員が狭く大型車同士のすれ違いができないことや、尾崎交差点に右折車線 が無いことから通行支障となっている状況にあります。
- 本事業では、こうした課題を解決し、地域の発展と利便性の向上を目指し、郡上大橋の架け替えを行います。

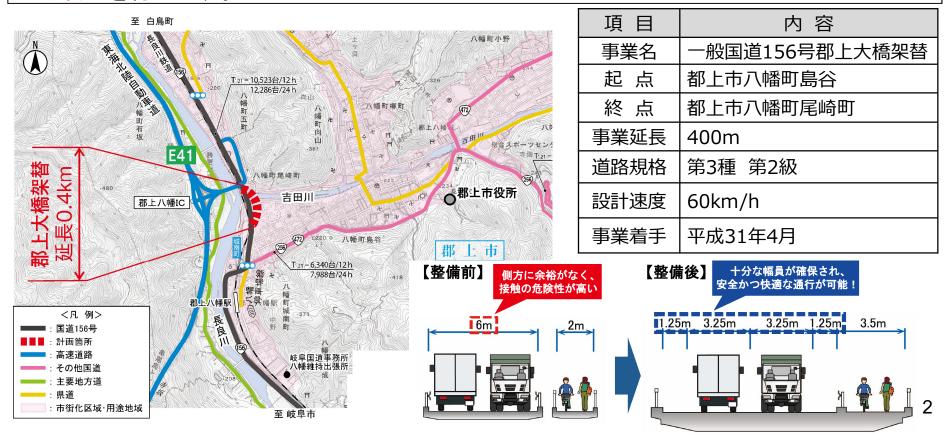

# 郡上大橋架替事業概要




#### ◆完成イメージ図



※構造が変更となる場合がございます。3

#### 郡上大橋架替事業概要



#### ▶現状の課題

現在の郡上大橋の有効幅員は6mしかないため、大型車同士のすれ違いが困難な状態にあ りますが、新しい郡上大橋になることで幅員が広くなり安全かつスムーズな通行が可能にな ります。

#### 狭い幅員による通行時の危険



大型車両は、センターラインをはみ出して走行しており、 対向車両との接触事故の危険性があります。 【写真1】



写真1 大型車同士のすれ違い状況



写真2 対向大型車の通過待ち状況



#### 旅行速度の低下

狭い幅員のため、対向 大型車の通過待ちによ る滞留が発生し、前後 区間と比較して旅行速 度が遅くなっています。

【図1•写真2】





図1 国道156号(美濃IC付近~白鳥西IC付近) 延長あたりの死傷事故件数 および 旅行速度


#### 本日の説明項目



1. 郡上大橋架替事業概要

- 2. 郡上大橋架替工事の流れ
- 3. 今年度の工事について
- 4. 工事中の通行規制について
- 5. 質疑応答


# 完成までの工事の流れ①(準備、A1下部)






※予算状況等により、工程が変更となる場合がございます。 工事時間については原則8:00~17:00となります。 河川内作業については11月~5月(渇水期)中に行います。

# 完成までの工事の流れ②(P1橋脚、仮橋)



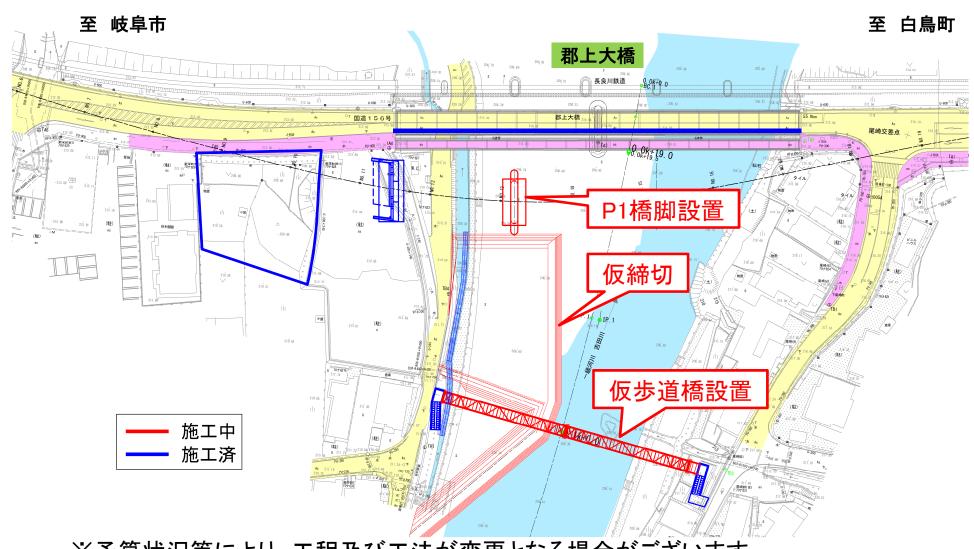



※予算状況等により、工程及び工法が変更となる場合がございます。

工事時間については原則8:00~17:00となります。

河川内作業については11月~5月(渇水期)に行います。


## 完成までの工事の流れ③(P2橋脚、歩道撤去)




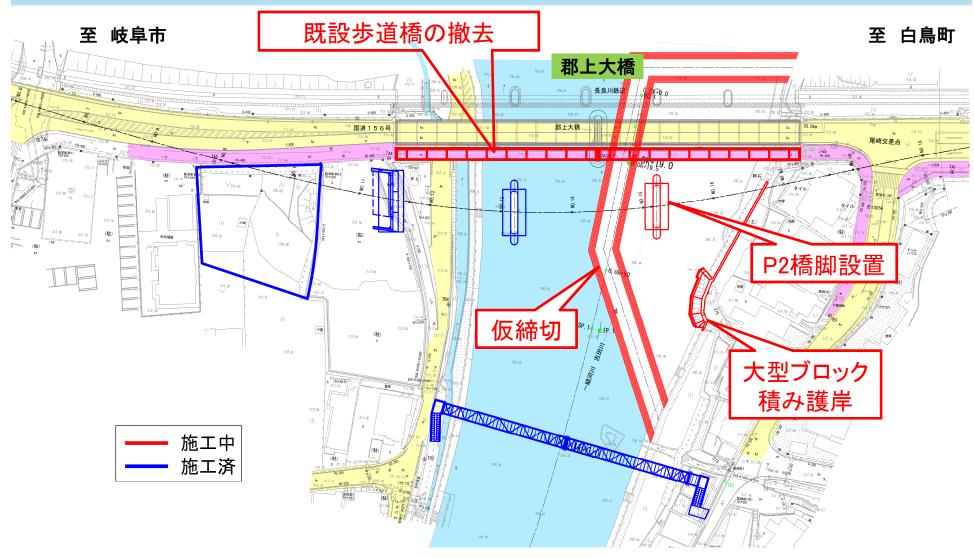

※予算状況等により、工程及び工法が変更となる場合がございます。 工事時間については原則8:00~17:00となります。 河川内作業については11月~5月(渇水期)中に行います。


# 完成までの工事の流れ4(A2下部)




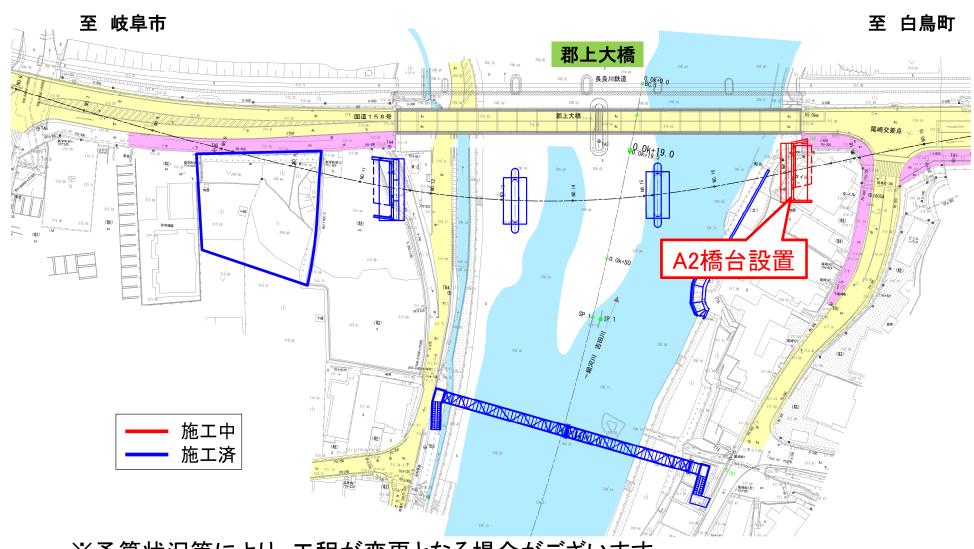

※予算状況等により、工程が変更となる場合がございます。 工事時間については原則8:00~17:00となります。 河川内作業については11月~5月(渇水期)中に行います。


# 完成までの工事の流れ⑤(上部工)




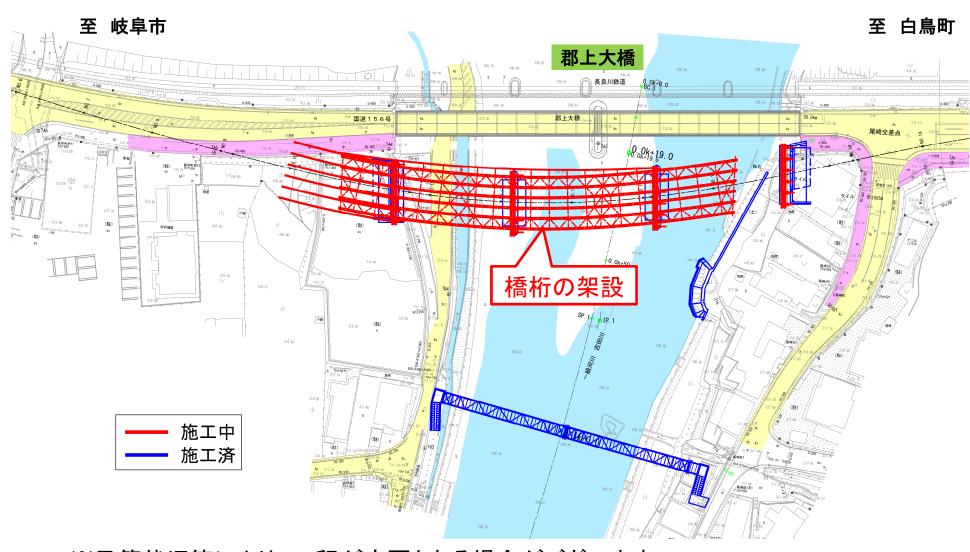

※予算状況等により、工程が変更となる場合がございます。 工事時間については原則8:00~17:00となります。 河川内作業については11月~5月(渇水期)中に行います。

## 完成までの工事の流れ⑥(舗装、土工部)




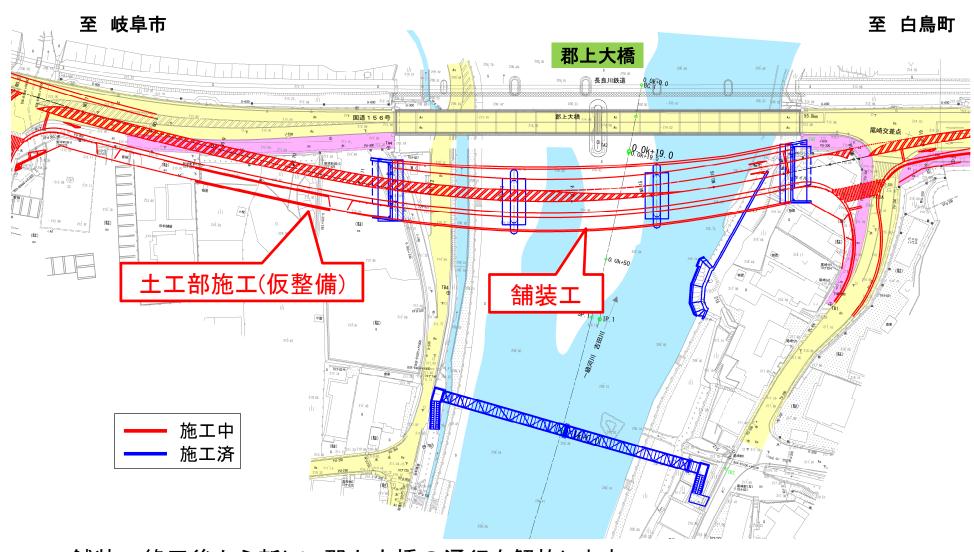


舗装工終了後から新しい郡上大橋の通行を解放します。

※予算状況等により、工程が変更となる場合がございます。


# 完成までの工事の流れ (撤去)




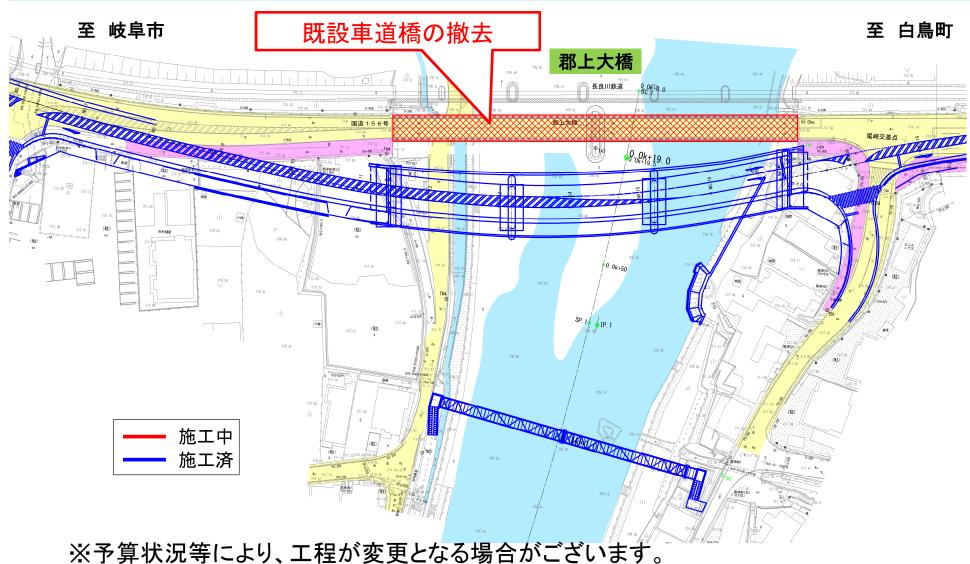

※予算状況等により、工程が変更となる場合がございます。 工事時間については原則8:00~17:00となります。 河川内作業については11月~5月(渇水期)中に行います。


# 完成までの工事の流れ⑧(撤去、護岸、土工部)



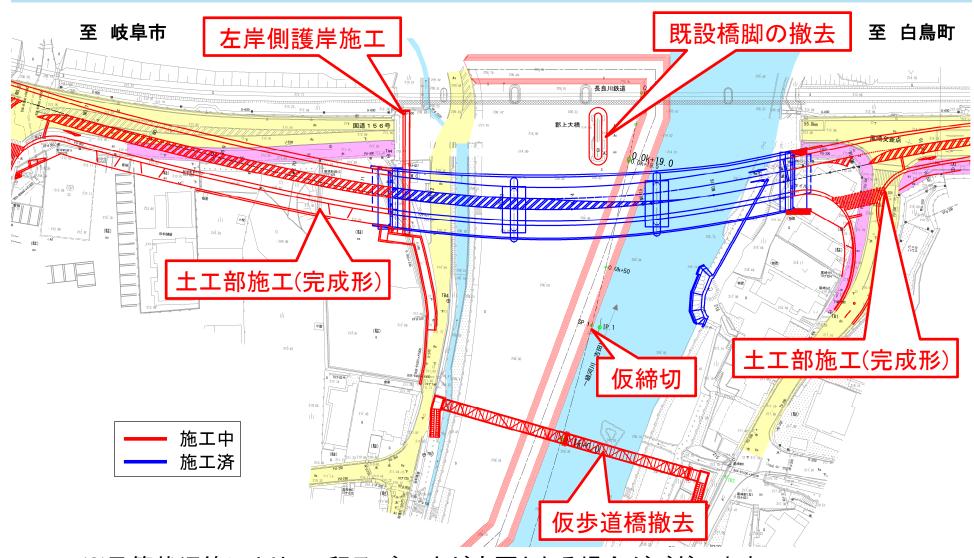

※予算状況等により、工程及び工法が変更となる場合がございます。 工事時間については原則8:00~17:00となります。 河川内作業については11月~5月(渇水期)中に行います。


## 本日の説明項目




1. 郡上大橋架替事業概要

- 2. 郡上大橋架替工事の流れ
- 3. 今年度の工事について
- 4. 工事中の通行規制について
- 5. 質疑応答


#### 今年度の工事内容



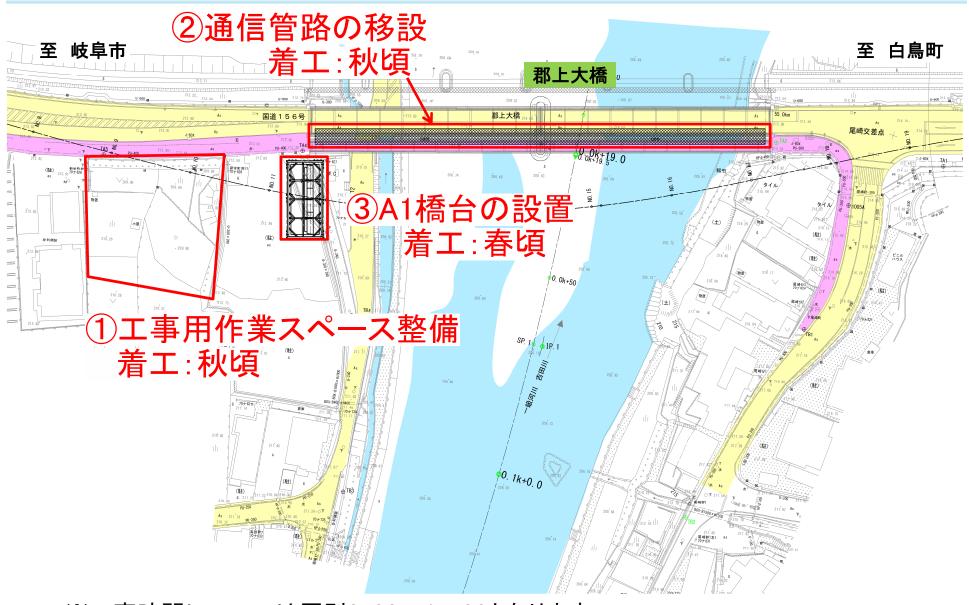

※工事時間については原則8:00~17:00となります。

#### 工事内容




通信管路

(現状)

歩道橋

#### ①通信管路の仮移設

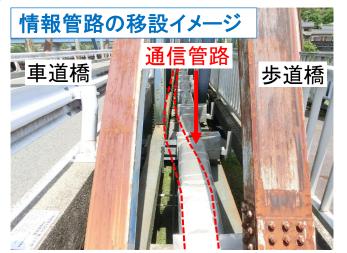


車道橋

通信管路

(移設後)

移設時イメージ図



歩道橋から車道橋へ仮移設します



橋桁から作業足場を吊り下げて作業します。 施工状況によって一時通行止めを実施させて 頂く場合がございます。



作業足場の設置


# 工事内容



#### ②A1橋台施工(石積擁壁の一部撤去を含む)


#### A1橋台イメージ図



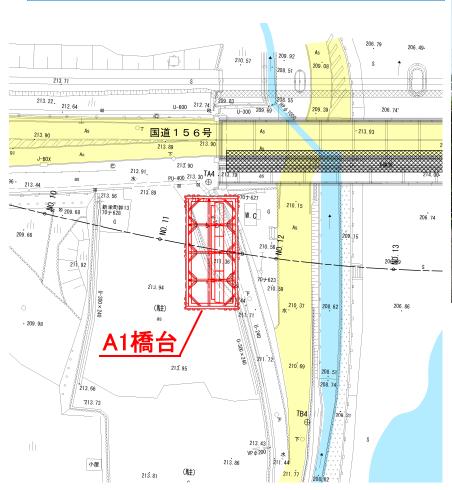




## 本日の説明項目



- 1. 郡上大橋架替事業概要
- 2. 郡上大橋架替工事の流れ
- 3. 今年度の工事について
- 4. 工事中の通行規制について
- 5. 質疑応答

## 工事中の通行規制






作業内容に応じて、10月~6月の期間で国道156号の通行規制及び市道の<u>通行</u> 止めを実施させてきます。

※詳細については、回覧にて周知させていただきます。 規制中は看板を設置し、利用者に対して案内をします。

#### 工事車両の通行





- 資機材運搬用トラックやクレーン車などの工事車両が走行します。
- 工事に伴い、振動などの影響が生じる可能性があります。<u>必要に応じて家屋を調査させていただく</u>ことがございます。
- ※対象となる方には、別途個別にご連絡させていただきます。
