



佐久間道路 かわら版

発行第34号
 (平成24年12月1日)
 責任者:安全協議会
 (株)中村組
 土屋 崇
 TEL 053-965-1888

① 平成23年度 佐久間道路浦川道路建設工事 (株)須山建設 大場 053-967-2587

工事概要 浦川地区における佐久間道路建設に伴う国道473号付替え工事を行います。

進捗状況 1号函渠の構築を行っています。また、仮置き土の搬出を年内中に概ね完了する予定で施工しています。沿線の皆様にはご迷惑をおかけしますが、安全かつ円滑に工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。



11月現在のようす



函渠構築状況

② 平成23年度 佐久間道路東栄道路建設工事 (株)早野組中部支店 横川 0536-76-1355

工事概要 佐久間道路・東栄IC(仮称)部において、本線の土砂掘削と残土運搬を行います。また、トンネル工事用の仮設道路を設置する工事を行います。

進捗状況 本線部の施工が完了し、トンネル工事用仮設道路も最後の仕上げ作業を行っています。



本線部は今回の施工分が完了しました。完了間近のトンネル工事用道路ダンプトラックによる土砂運搬作業が無事終了しました。12月末の完成に向けて、安全第一で工事を進めてまいります。皆様のご理解とご協力をお願いします。

③ 平成23年度 佐久間道路川合道路建設工事 (株)中村組 土屋 053-965-1888

工事概要 佐久間道路のトンネル工事・橋梁工事等の施工のための工事用進入路を設置する工事を行います。

進捗状況 工事用道路奥の山の掘削が進み、明るくひらけてきました。12月はいよいよ仮橋の架設を始めます。

工事用道路掘削状況



仮橋架設イメージ



年明け頃、白沢川脇の道路の上空を施工する際には、安全を考慮して交通規制をかけさせていただきたいと考えています。後日、詳細内容を回覧させていただきますので、よろしくをお願いします。

④ 平成23年度 佐久間道路川合地区道路建設工事 (株)中村組 新野 053-965-1888

工事概要 川合地区において佐久間IC(仮称)の整備を行います。

進捗状況 佐久間IC(仮称)の盛土を始めました。


佐久間IC(仮称)全景



国道473号線迂回路部



位置図

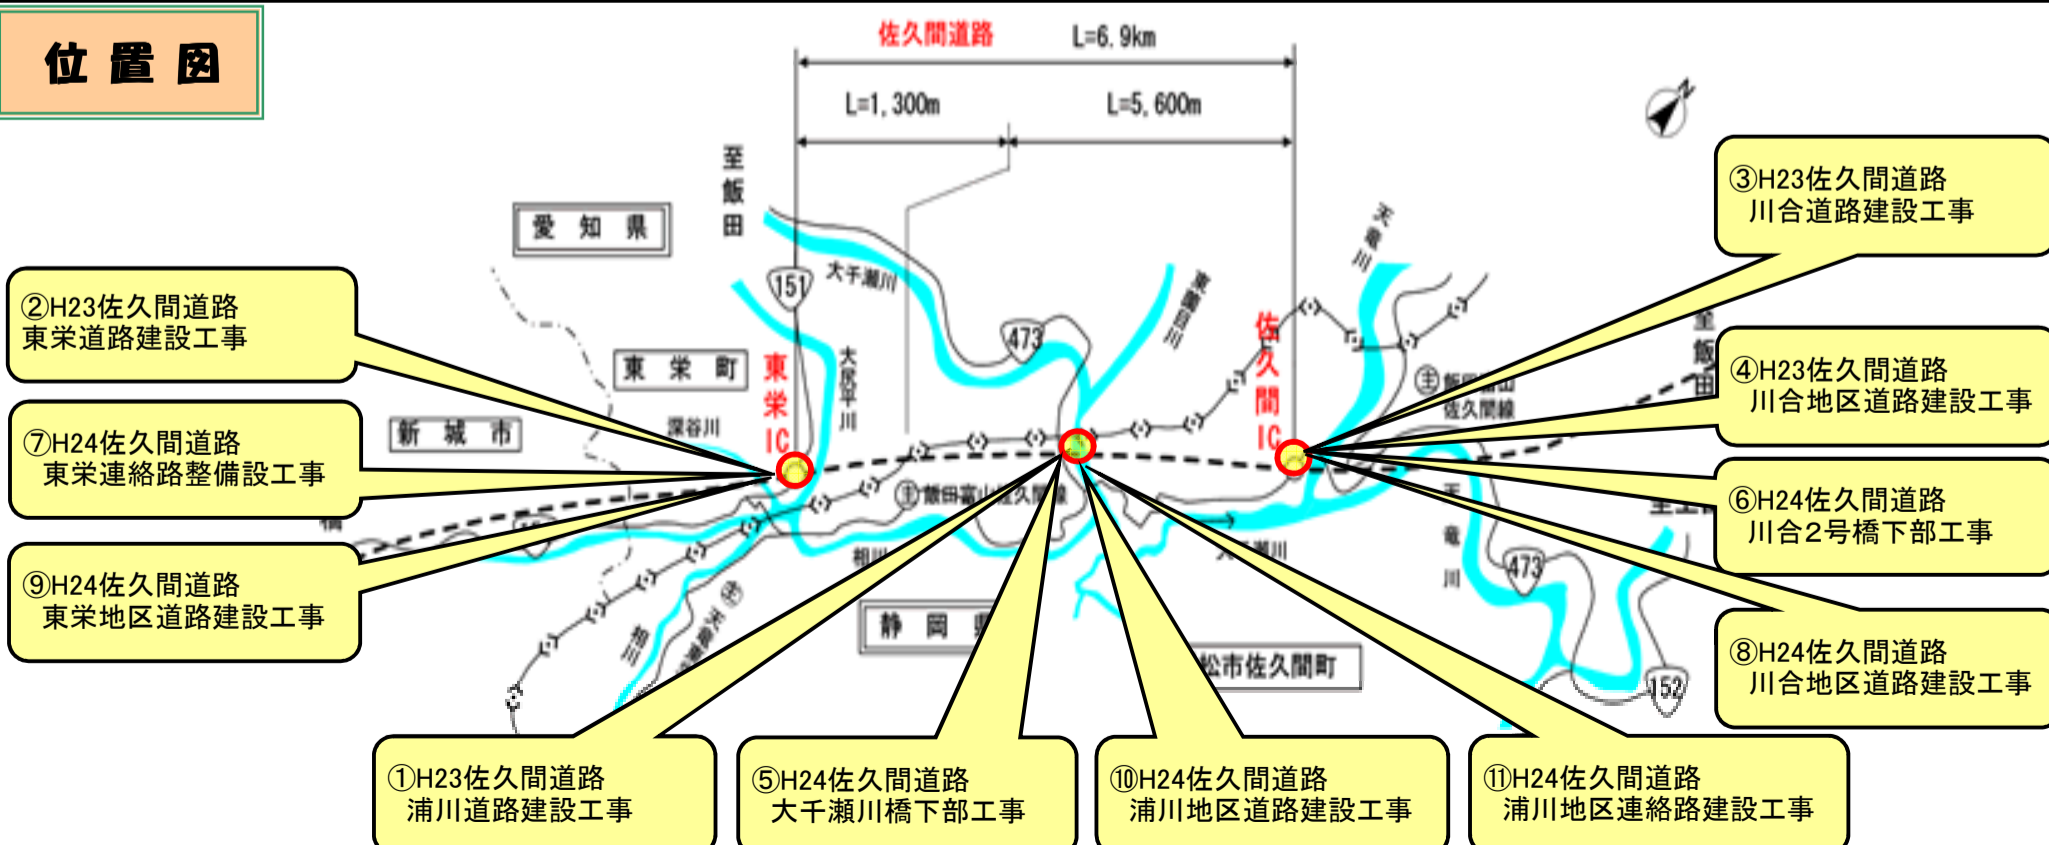

⑤ 平成24年度 佐久間道路大千瀬川橋下部工事
大日本土木(株) 松久 (仮) 0536-76-0145

工事概要

佐久間道路のうち、大千瀬川橋 P1橋脚の下部工をニューマチックケーソン工法で施工する工事です。

進捗状況

工事を始めるための測量を行っています。まもなく、工事用車両が出入りするための進入路の造成を行います。

右岸側から見た現況

左岸側から見た現況



⑥ 平成24年度 佐久間道路川合2号橋下部工事
中村組(株) 鈴木 053-965-1888

工事概要

川合地区において白沢川に架かる佐久間道路の橋梁の橋台及び橋脚を造る工事を行います。

進捗状況

工事に着手するための準備を行っています。

施工箇所写真(西から撮影)



施工箇所写真(東から撮影)



⑦ 平成24年度 佐久間道路東栄連絡路整備工事
鈴中工業(株) 溝口 0536-76-1701

工事概要


佐久間道路・東栄IC(仮称)連絡路の盛土工事および奈根川の護岸工事を行います。

進捗状況

奈根川右岸で、ブロック積み擁壁を施工するための河川仮締切工事を現在しています。

現場より国道151号線を望む。

施工箇所

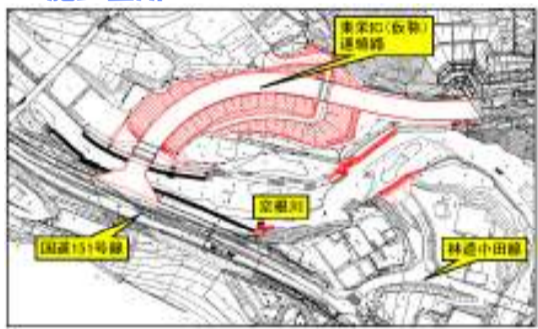

⑧ 平成24年度 佐久間道路川合地区道路建設工事
(株)鈴木組 山下



工事概要

佐久間道路川合地区において、本線の土工事及び法面工事、また国道473号では函渠工の工事を行います。

進捗状況

工事を始めるための準備を行っています。

本線土工事・法面工事施工予定箇所



函渠工施工予定箇所



⑨ 平成24年度 佐久間道路東栄地区道路建設工事
藤城建設(株) 山口 TEL 未定

工事概要

佐久間道路・東栄IC(仮称)部において、本線及び連絡路の土砂(岩)掘削と残土運搬を行います。

進捗状況

現在、工事を始めるための測量作業及び計画・準備を行っています。安全を第一に進めますので、皆様のご理解・ご協力をお願い致します。

施工箇所を終点側より望む



施工箇所を起点側より望む



⑩ 平成24年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事
(株)須山建設 清水 053-967-2587

工事概要

静岡県側の佐久間道路本線上部(トンネル坑口付近)の法面の補強、および本線の盛土工事を行います。

進捗状況

工事の着手に向けて、計画・準備を行っています。



⑪ 平成24年度 佐久間道路浦川地区連絡路建設工事
(株)早野組 熊谷 TEL 未定

工事概要

大千瀬川左岸側にて、佐久間道路・浦川連絡路道路の橋台および補強土壁の施工を行います。

進捗状況

環境保全への配慮等 事前の作業計画を立てています。

***現場担当者の紹介**

佐久間道路浦川連絡路道路建設工事を施工する(株)早野組です。地域の皆様方とのふれあいを大切に、安全を第一に工事を進めていきたいと思っております。なにとぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。



現場代理人・監理技術者：熊谷
出身地：長野県下伊那郡阿南町

東栄建設監督官詰所より

日頃三遠南信自動車道事業の推進につきましてご理解・ご協力ありがとうございます。

さてこの度平成24年度の佐久間道路建設工事について、浦川地区にて3件、佐久間川合地区にて2件、東栄地区にて2件、合計7件の新規工事が発注され、受注業者が決まりいよいよ工事の準備を行っているところです。

工事の実施にあたり、近隣にお住まいの方々や関係各者には御迷惑をかける事があるかもしれませんが、地域の開発・発展のため、工事関係者一同協力して頑張りますので、地域の皆様にも引き続きご協力をお願いします。

疑問な点や、ご要望等ありましたら東栄監督官詰所及び各工事関係者へお気軽にご相談下さい。

宜しく申し上げます。

東栄建設監督官・技術員一同
