



佐久間道路 **かわら版**

発行第35号
 (平成25年1月1日)
 責任者:安全協議会
 (株)中村組
 新野 正
 TEL 053-965-1888

① 平成23年度 佐久間道路浦川道路建設工事 (株)須山建設 大場 053-967-2587

工事概要

浦川地区における佐久間道路建設に伴う国道473号付替え工事を行います。

進捗状況

1号函渠の構築を行っています。また、仮置き土の搬出を年内中に概ね完了する予定で施工しています。沿線の皆様にはご迷惑をおかけしますが、安全かつ円滑に工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。



12月現在のようす



函渠頂版部 コンクリート養生
 (ジェットヒーター養生)

② 平成23年度 佐久間道路東栄道路建設工事 (株)早野組中部支店 横川 0536-76-1355

工事概要

佐久間道路・東栄IC部において、本線の土砂掘削と残土運搬を行い、また、トンネル工事用の仮設道路を設置する工事を行いました。

進捗状況

おかげさまをもちまして、本工事を無事に完了する事ができました。ありがとうございました。



今回の施工分は完了しました



トンネル工事用道路も完了です

皆様のご理解とご協力のおかげで、工事を無事完了する事ができました。本当にありがとうございました。また、どこかでお会いできる事を楽しみにしております。

③ 平成23年度 佐久間道路川合道路建設工事 (株)中村組 土屋 053-965-1888

工事概要

佐久間道路のトンネル工事・橋梁工事等の施工のための工事用進入路を設置する工事を行います。

進捗状況

工事用道路奥の山の掘削が完了し、明るくひらけました。1月は仮橋の架設を進めます。

工事用道路掘削完了

仮橋架設イメージ



1月中旬～下旬頃、白沢川脇の道路の上空を施工する際には、安全を考慮して交通規制をかけさせて頂きたいと考えています。後日、詳細内容を回覧させて頂きまので、よろしくお願いします。

④ 平成23年度 佐久間道路川合地区道路建設工事 (株)中村組 新野 053-965-1888

工事概要

川合地区において佐久間IC(仮称)の整備を行います。

進捗状況


佐久間IC(仮称)の盛土を始めました。

佐久間IC(仮称)全景

国道473号線迂回路部



位置図

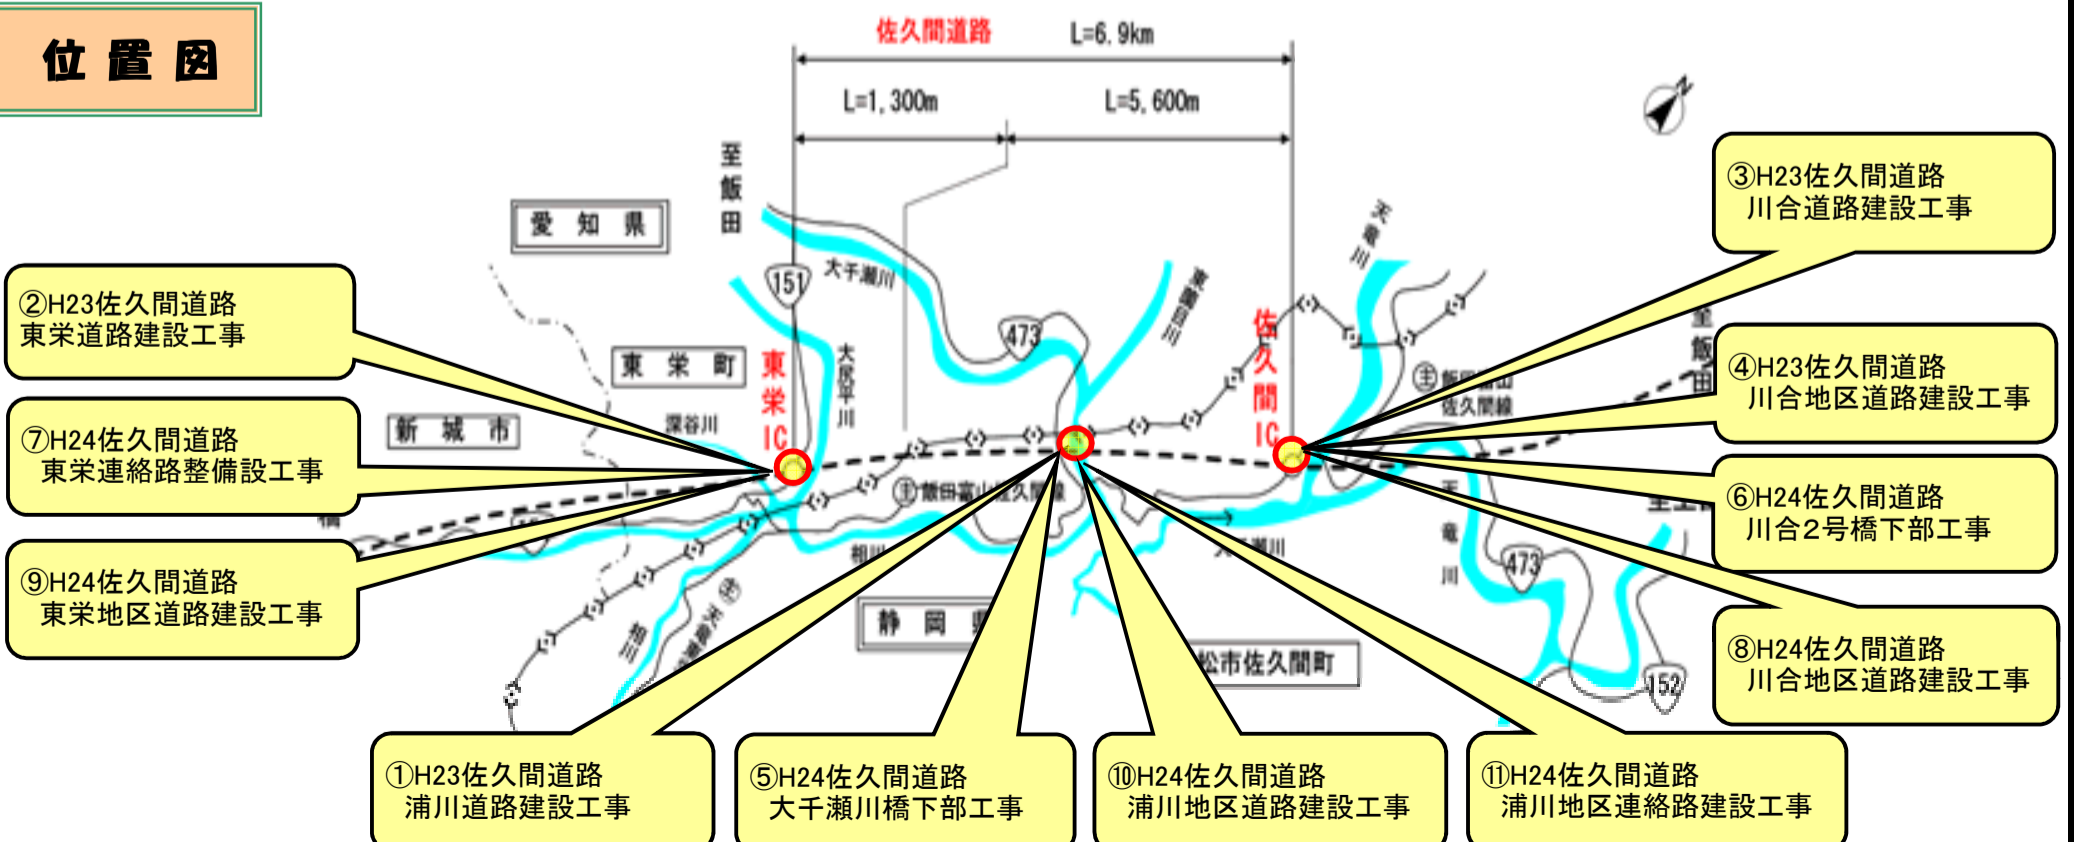

**⑤ 平成24年度 佐久間道路大千瀬川橋下部工事
大日本土木(株) 松久 (仮) 0536-76-0145**

工事概要

佐久間道路のうち、大千瀬川橋 P1橋脚の下部工をニューマチックケーソン工法で施工する工事です。

進捗状況

工事用車両が現場内へ出入りするための進入路の造成を行っています。1月には橋脚の構築を始めます。

左岸側から見た現況



進入路盛土状況



**⑥ 平成24年度 佐久間道路川合2号橋下部工事
(株)中村組 鈴木 053-965-1888**

工事概要

川合地区において白沢川に架かる佐久間道路の橋梁の橋台及び橋脚を造る工事を行います。

進捗状況

工事に着手するための準備を行っています。

施工箇所写真(西から撮影)



施工箇所写真(東から撮影)



**⑦ 平成24年度 佐久間道路東栄連絡路整備工事
鈴中工業(株) 溝口 0536-76-1701**

工事概要

佐久間道路・東栄IC(仮称)連絡路の盛土工事および奈根川の護岸工事を行います。

進捗状況

奈根川右岸の仮締切が完了し、ブロック積み擁壁を施工しています。

現場より国道151号線を望む。



施工箇所



**⑧ 平成24年度 佐久間道路川合地区道路建設工事
(株)鈴木組 山下**

工事概要

佐久間道路川合地区において、本線の土工事及び法面工事、また国道473号では函渠工の工事を行います。

進捗状況

工事を始めるための準備を行っています。



本線土工事・法面工事施工予定箇所



函渠工施工予定箇所



**⑨ 平成24年度 佐久間道路東栄地区道路建設工事
藤城建設(株) 山口**

工事概要

佐久間道路・東栄IC部において、本線及び連絡路の土砂(岩)掘削と残土運搬を行います。

進捗状況

現在掘削作業を行っており、発生土を浦川及び川合に運搬しております。又、残土受入地(横見)においては伐採作業を行っております。

【掘削作業箇所(東栄IC部)】



【伐採作業箇所(横見)】



**⑩ 平成24年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事
(株)須山建設 清水 053-967-2587**

工事概要

静岡県側の佐久間道路本線上部(トンネル坑口付近)の法面の補強、および本線の盛土工事を行います。

進捗状況

工事の着手に向けて、計画・準備を行っています。

大千瀬川左岸側より工事箇所を撮影



法面工事
予定箇所

①H23佐久間道路
浦川道路建設工事

法面工事では、法枠というモルタル製の格子状の構造物で山を覆い、格子の交点にはグラウンドアンカーという工法を施します。工事進捗に合わせ工法の紹介を行っていく予定です。

**⑪ 平成24年度 佐久間道路浦川地区連絡路建設工事
(株)早野組 熊谷**

工事概要

大千瀬川左岸側にて、佐久間道路・浦川連絡路道路の橋台および補強土壁の施工を行います。

進捗状況

環境保全への配慮等 事前の作業計画をたてています。

対岸より現場を望む



施工箇所



東栄建設監督官詰所より

日頃三遠南信自動車道事業の推進につきましてご理解・ご協力ありがとうございます。

あけましておめでとうございます。
東栄建設監督官詰所を設け、9ヶ月が経ちました。
新しい年になって、今まで以上に三遠南信佐久間道路の開通に向けひとつひとつの工事を安全・丁寧に頑張りたいと思います。

とはいえ、この冬の冷え込みによる積雪・凍結等により思うように施工が進んでいない工事もあるのが現状です。
まだまだ近隣の皆様そしてご通行の皆様には御迷惑をお掛けしてしまうと思いますが、引き続きご協力をお願い致します。

東栄建設監督官・技術員一同
