



R3.8.27 現在 坂部トンネルの掘削進捗は**86%***です。

※坂部トンネル総延長に対する

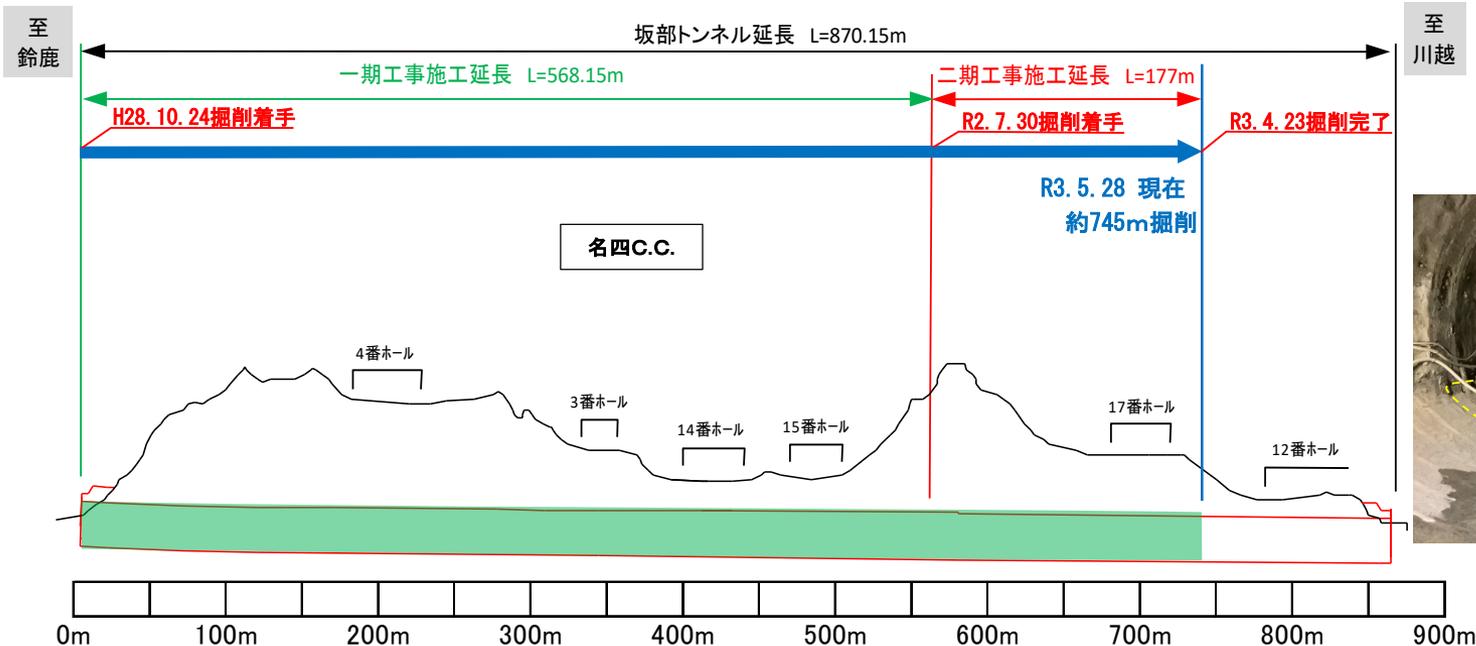


ゴルフ場の直下、かつ崩れやすい地質のため地盤を補強して、トンネル断面を上部から1断面ずつ3分割して掘削しています。

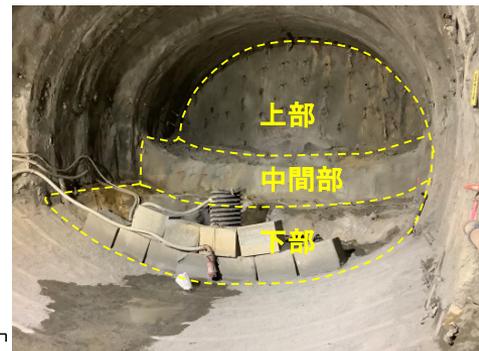

施工状況 (令和3年8月度)

平面図

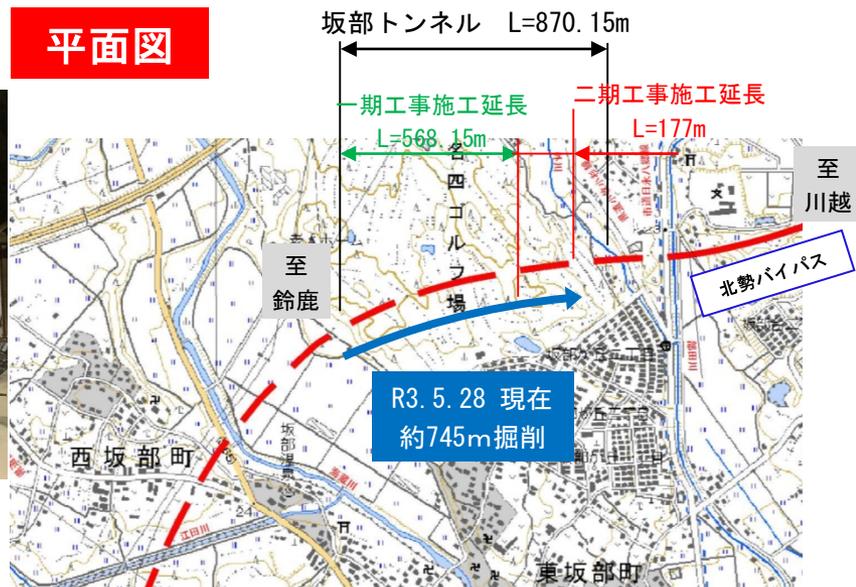

インバート本体工の施工を行っており、8/27現在で395m（トンネル全体の45%）の施工が完了いたしました。引き続きウォータータイト（非排水）構造部の施工を行っており、防水シートの設置→鉄筋組立→コンクリート打設という施工サイクルを繰り返して施工しております。
