



R3.9.29 現在 坂部トンネルの掘削進捗は86%^{*}です。

※坂部トンネル総延長に対する

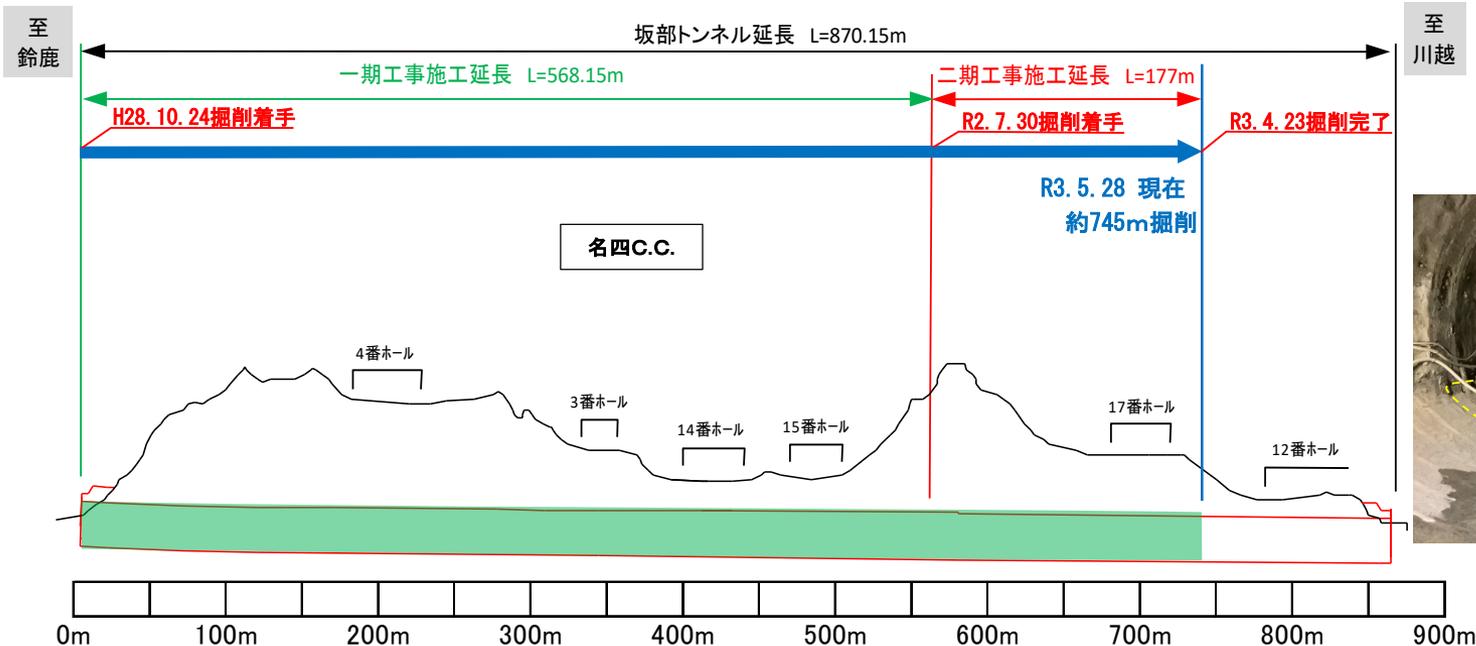


ゴルフ場の直下、かつ崩れやすい地質のため地盤を補強して、トンネル断面を上部から1断面ずつ3分割して掘削しています。

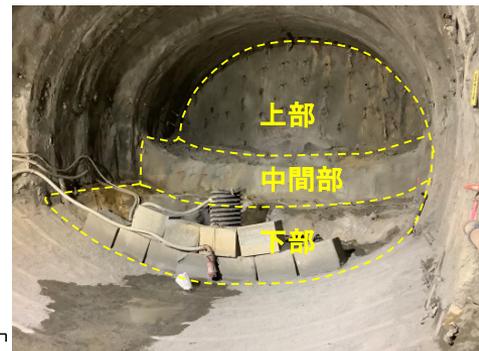

施工状況 (令和3年9月度)

平面図

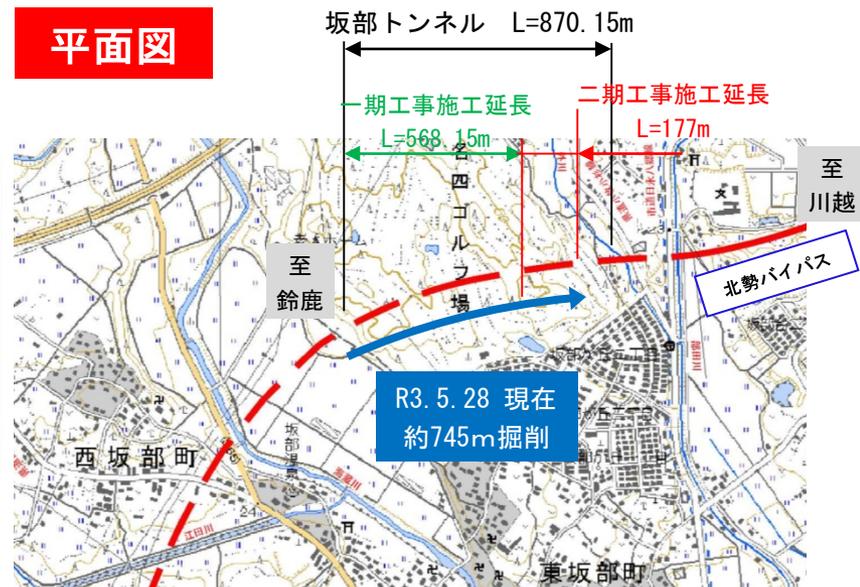

インバート本体工の施工を行っており、9/29現在で447m (トンネル全体の51%) の施工が完了いたしました。アーチ覆工の作業も再開いたしました。インバート工と同様に、防水シート張り→鉄筋組立→コンクリート打設という施工サイクルを繰り返して施工します。
