


R4.11.29 現在 坂部トンネルの掘削進捗は86%※です。

※坂部トンネル総延長に対する

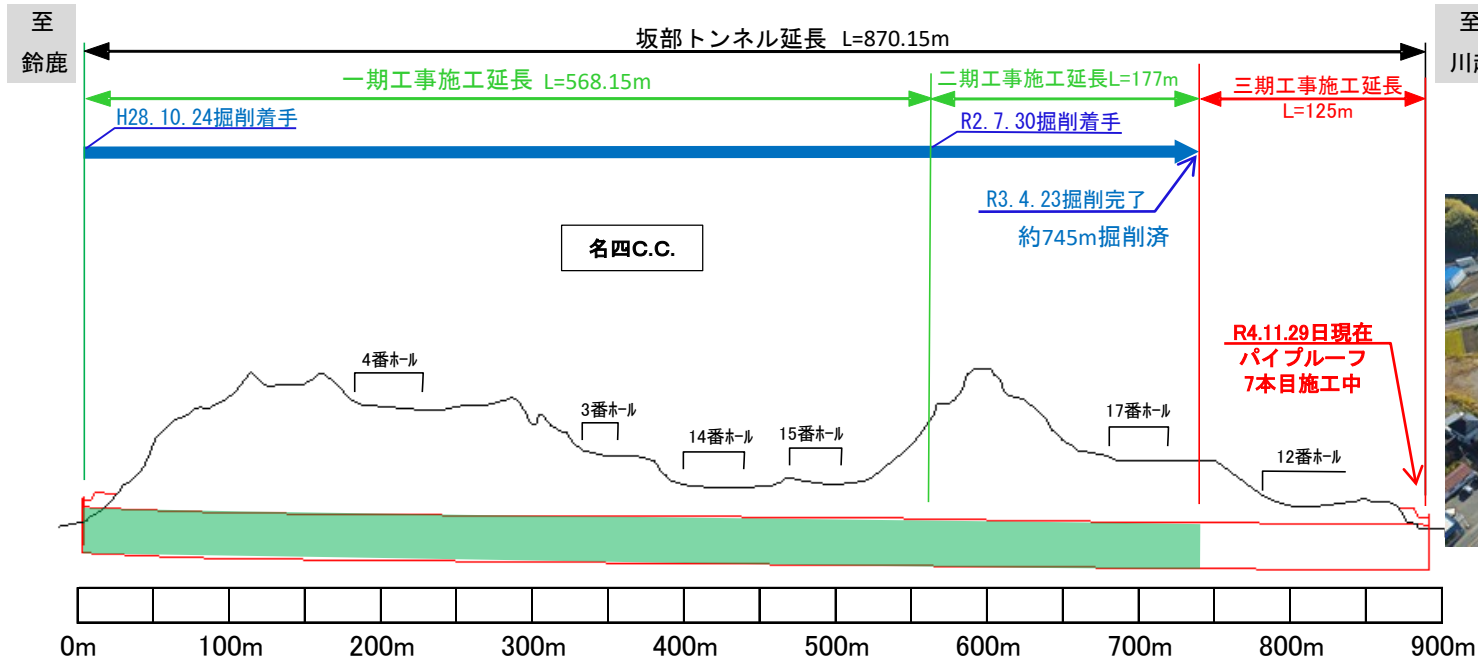

施工状況（令和4年11月度）

至 川越

ゴルフ場の直下、最小土被りが3.4mのため、地表への影響を考慮してパイプルーフ工法でトンネル掘削のための屋根（パイプルーフ）を施工しています。




平面図



防音ハウス内 パイプルーフ施工状況



【施工位置・順序】

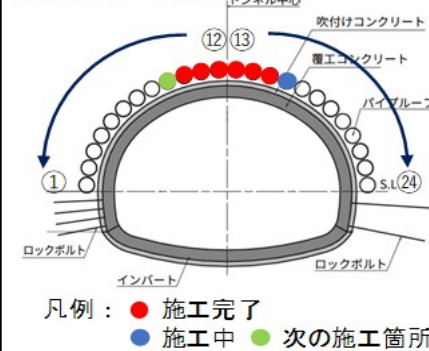

R4. 8に二期工事が完了し、約745mまでトンネルの掘削が完了しており、現在、三期工事を施工しています。

11/29現在、パイプルーフ全体数量24本中 7本目を施工中です。
