



R5.10.31 現在 坂部トンネルの掘削進捗は100%です。

※坂部トンネル総延長に対する

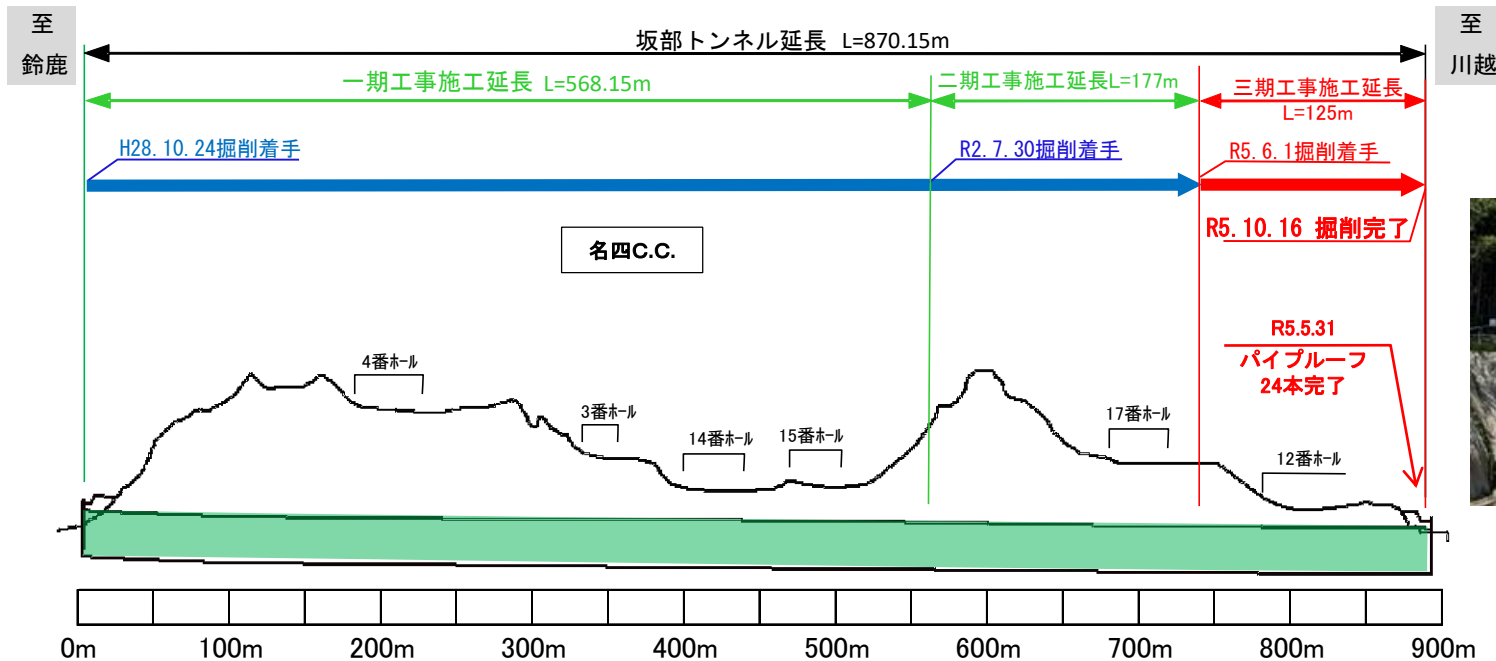

施工状況 (令和5年10月度)

平面図

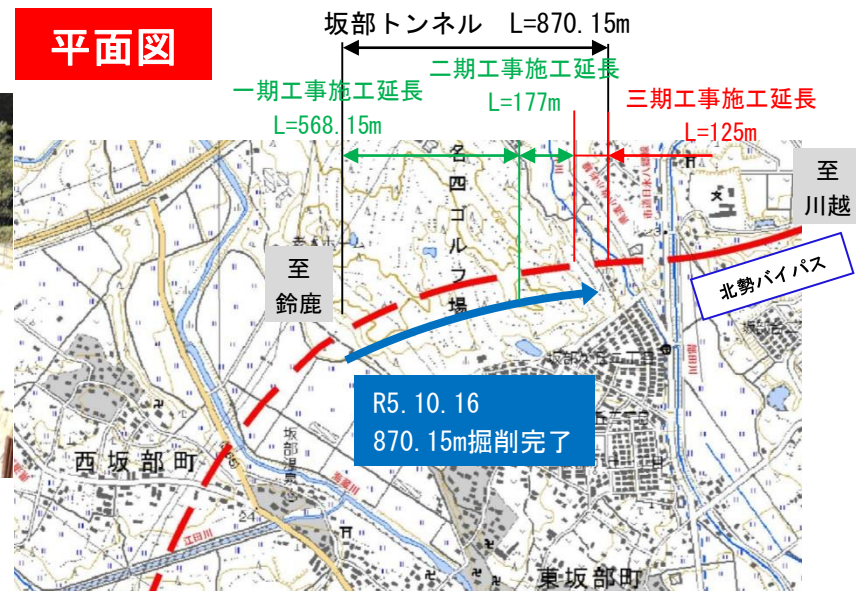


至 川越

ゴルフ場の直下、最小土被りが3.4mのため、地表への影響を考慮してパイプルーフ工法でトンネル掘削のための屋根（パイプルーフ）を施工しています。



パイプルーフ全景
川越方から鈴鹿方を望む

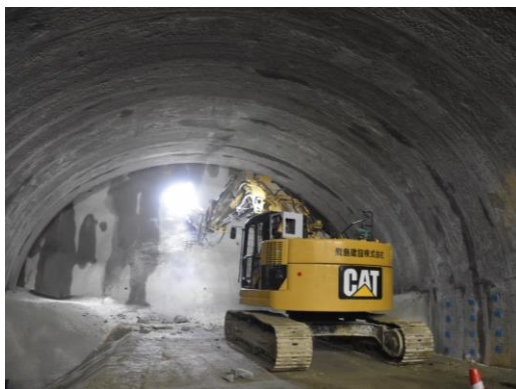

R5.5.31にパイプルーフが完了し、トンネルの掘削を開始しました。
土被りが薄く、崩れやすい地層のため、トンネルを1断面ずつ3分割して掘削しました。
R5.10.16までに三期工事で125mを掘削し、トンネル延長870.15mの掘削が完了しました。
