

岡崎バイパス工事便り 平成26年6月号




一般国道23号岡崎バイパスは名豊道路の一部として計画され、東は蒲郡バイパス、西は知立バイパスと接続する延長14.6kmのバイパスです。岡崎バイパスのうち、安城西尾ICから藤井ICまでは4車線で供用されており、藤井ICから幸田芦谷ICまでは暫定的に2車線で供用されています。

現在、藤井ICから西尾東ICまでの区間について、平成27年度中の4車線化を目指して工事を行っています。

現在施工中の工事の概要と進捗等についてお伝えしていきます。

西尾建設監督官詰所(0563-55-7081)

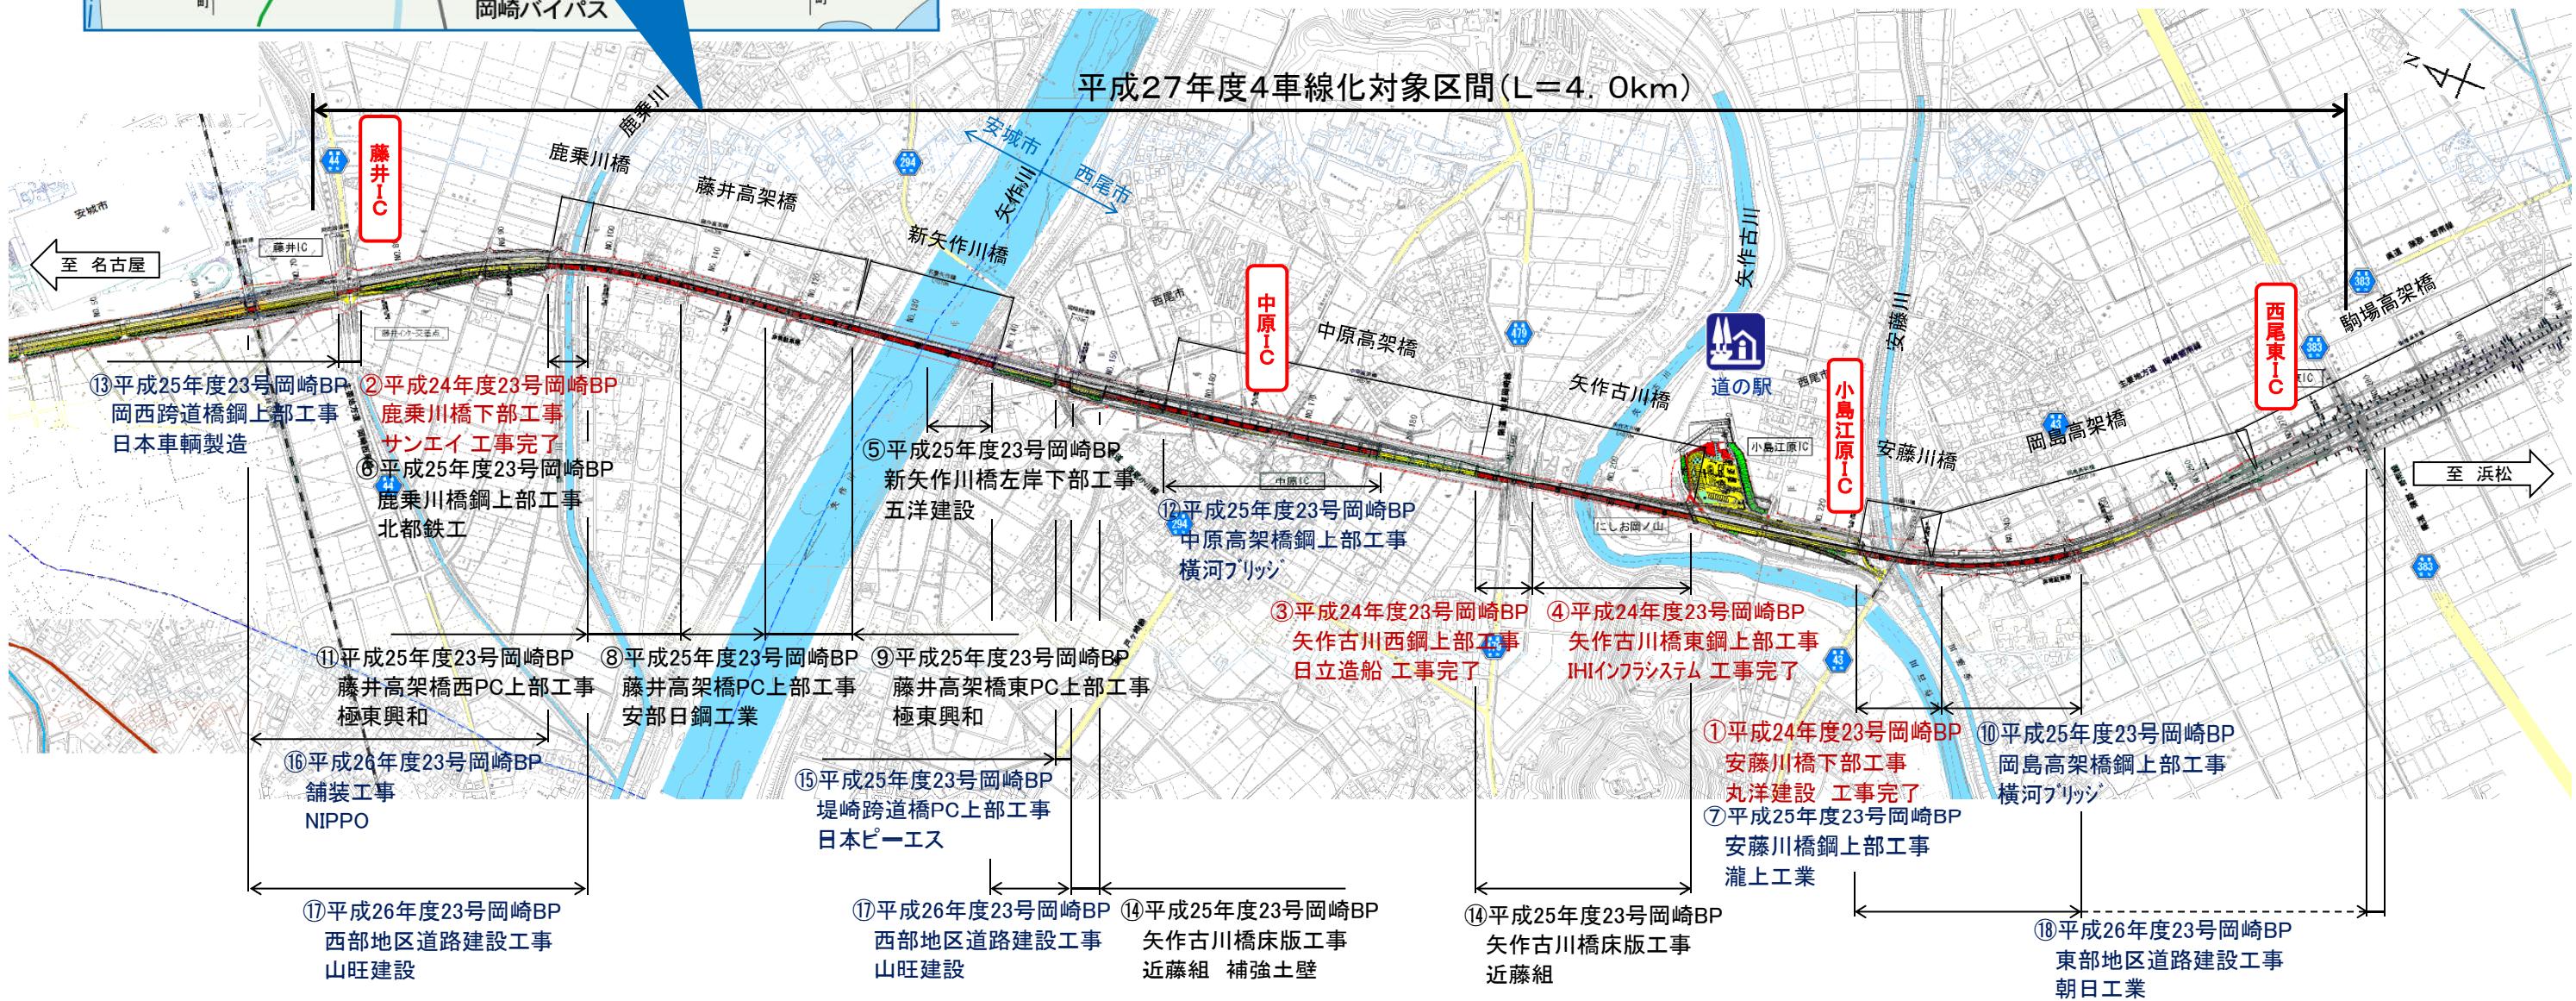

① 平成24年度 23号岡崎BP安藤川橋下部工事

丸洋建設(株)

工事概要

工事名 平成24年度 23号岡崎BP安藤川橋下部工事
工事場所 西尾市江原町
工期 平成25年1月11日～平成26年5月30日
工事内容 新設橋脚 3基
場所打杭 (φ1200 L=27.0m～29.0m) 21本
土工 1式
コンクリート 1式
法覆護岸工 1式
仮設工 1式
構造物撤去工 1式
舗装工 308m²

工事進捗

5月28日 工事完了

昨年の5月より工事を開始し、5月28日をもちまして工事を完了いたしました。
工事期間中は地元の方々や、道路を利用される方々のご理解とご協力により円滑に工事を進める事ができ無事完了することができました。今後も、安全で・快適な道づくりに励みます。
ありがとうございました。
また、引き続き4車線化に向けて次工事が始まりますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願ひします。



蒲郡方面から名古屋方面を望む (江原小島インター付近)

② 平成24年度 23号岡崎BP鹿乗川橋下部工事

サンエイ(株)

工事概要

工事名 平成24年度 23号岡崎BP鹿乗川橋下部工事
工事場所 安城市藤井町
工期 平成25年1月18日～平成26年6月30日
工事内容 場所打杭 15本(φ1000mm、L=19.5m～21.5m)
RC橋脚 2基

工事進捗

5月31日 工事完了

昨年11月より工事を開始し、5月31日をもちまして全ての工事を完了いたしました。
工事期間中は地元の皆様、周辺道路を利用される皆様には大変ご迷惑をおかけしたことと思います。
皆様のご理解とご協力のおかげで無事に工事を完了する事ができました。
本当にありがとうございました。



③ 平成24年度 23号岡崎BP矢作古川橋西鋼上部工事

日立造船(株)

工事概要

工事名 平成24年度 23号岡崎BP矢作古川橋西鋼上部工事
工事場所 西尾市志籠谷町
工期 平成25年2月15日～平成26年5月30日
工事内容 3径間連続非合成箱桁橋
橋長 110.8m 鋼重 225t
工場製作工 1式 橋梁現場塗装工 1式
工場製品輸送工 1式 橋梁付属物工 1式
鋼橋架設工 1式 鋼橋足場等設置工 1式



工事進捗

5月30日 工事完了

1月14日より現場施工を開始し、5月30日をもちましてすべての工事を無事完了しました。

作業時には地元のみなさまのご協力のおかげで無事に工事を終了させることができました。

本当にありがとうございました。

④ 平成24年度 23号岡崎BP矢作古川橋東鋼上部工事

(株)IHIインフラシステム

工事概要

工事名 平成24年度 23号岡崎BP矢作古川橋東鋼上部工事
工事場所 愛知県西尾市小島町～志籠谷町
工期 平成25年3月7日～平成26年5月15日
工事内容 工事延長（橋長） L = 315.5m
鋼6径間連続非合成箱桁橋
桁長=314.550m (0.500m+50.500m+53.500m+51.500m
+2@53.000m+51.800m+0.750m)

工事進捗


5月9日 工事完了

昨年11月より工事を開始し、5月9日をもちまして工事を完了いたしました。
工事中は地元の皆様には何かとご迷惑をお掛けしたと思いますが、ご理解とご協力を頂いたおかげで無事工事を完了することができました。ありがとうございました。



I期線

II期線



⑤ 平成25年度 23号岡崎BP新矢作川橋左岸下部工事

五洋建設(株)

工事概要

工事名 平成25年度23号岡崎BP新矢作川橋左岸下部工事
工事場所 西尾市志貴野町～安城市藤井町
工期 平成25年 9月 4日～平成26年 9月 30日
工事内容 新設橋脚 1基
　　場所打杭 (φ1000 L=16m) 18本
　　コンクリート 891m³
　　橋脚巻立て工 2基
　　橋台補強工 1基
　　仮橋・仮桟橋工 975m²
　　工事用道路 3,700m²



工事進捗

5月末進捗率: 80.0%

5月末日をもちまして河川内作業が全て完了いたしました。
昨年10月から8ヶ月間ものあいだ昼夜作業を行い、地元の皆様には大変ご迷惑をお掛け申し訳ございませんでした。
6月からはA1橋台の補強工事に移行してまいります。
基礎杭を増設し壁前面にコンクリートを増し打ちする耐震補強工事となります。
市道の一部を占有するため、引き続き地元の皆様にはご迷惑をお掛けする事となります。
が、ご理解・ご協力の程よろしくお願ひいたします。
なお、工事に関して、ご不明な点などございましたら、お気軽にお声をお掛け下さい。





⑥ 平成25年度 23号岡崎BP鹿乗川橋鋼上部工事

(株)北都鉄工

工事概要

工事名 平成25年度 23号岡崎BP鹿乗川橋鋼上部工事
工事場所 安城市藤井町
工期 平成25年10月11日～平成26年 8月29日
工事内容 鋼橋架設工事
　　架設工 157.5t
　　支承工 12個
　　現場維手工 7,394本
　　現場塗装工 60m²
　　落橋防止装置工 8箇所
　　排水装置工 27m²
　　足場工 690m²

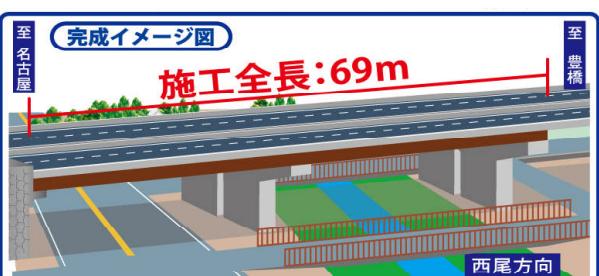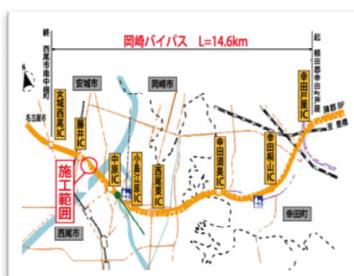

工事進捗

5月末進捗率: 82.7%

今月より施工を開始し、大型クレーンによる相吊り架設も無事に終わり、約6割の架設作業が終了しています。今月中には吊り足場を整備し、転落災害・飛散対策に特に重点をおき、作業を進めてまいります。
架設作業中は、路肩規制・通行止と交通規制にご協力いただき、地元の皆様に大変ご迷惑をお掛けしました。
ご理解ご協力ありがとうございました。




⑧ 平成25年度 23号岡崎BP藤井高架橋PC上部工事

(株)安部日鋼工業

工事概要

工事名 平成25年度 23号岡崎BP藤井高架橋PC上部工事
工事場所 安城市藤井町
工期 平成26年 1月 18日～平成27年 3月 20日
工事内容 ポストテンション方式7径間連続PC中空床版橋
橋長 L = 169.1m 有効幅員 W = 9.0m

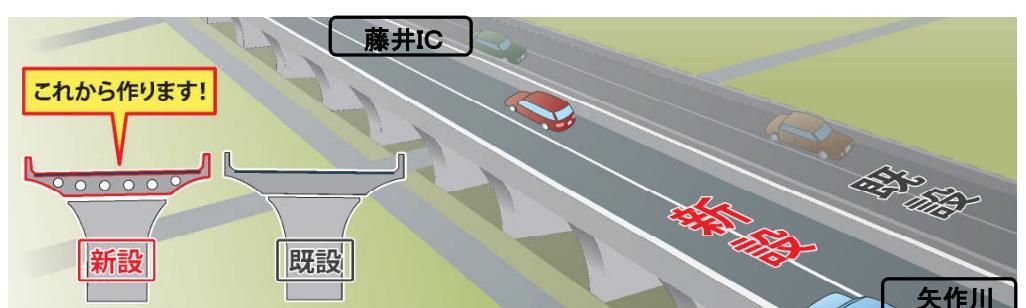

工事進捗

5月末進捗率: 16.6%

5/7(水)より本体工事の施工を開始し、6/10(火)に第一施工区間(延長約30m)のコンクリート打設が完了しました。今後も順次、支保工・型枠・鉄筋・PC鋼材の組立、コンクリート打設を行い、橋桁をつけて行きまます。
橋桁のコンクリート打設は、あと3回予定しています。
交差する市道上部の施工にあたり、交通規制を行なう時がありますが、事前に回観等でお知らせいたします。
地元の皆様には、何かとご不便をお掛けしますが、何卒、ご理解とご協力の程、よろしくお願ひいたします。



⑨ 平成25年度 23号岡崎BP藤井高架橋東PC上部工事

極東興和(株)

工事概要

工事名 平成25年度 23号岡崎BP藤井高架橋東PC上部工事
工事場所 安城市藤井町
工期 平成26年 1月 24日～平成27年 3月 20日
工事内容 PC7径間連続中空床版橋
　　橋長 165.376m
　　コンクリート 1248m³
　　支承 16基



工事進捗

5月末進捗率: 17.5%

4月より工事を開始しました。
現在のところ、第1次施工の主桁のコンクリート打設を6月13日に完了し、引き続き第2次施工の主桁製作を行なっています。
また、7月下旬に市道藤井南山5号線を規制しながら支保工の組立を行なう予定です。
施工中の工事ヤードは側道に接してあり、より一層安全管理に徹していくので、ご理解とご協力のほど宜しくお願い致します。



⑪ 平成25年度 23号岡崎BP藤井高架橋西PC上部工事

極東興和(株)

工事概要

工事名 平成25年度 23号岡崎BP藤井高架橋西PC上部工事
工事場所 安城市藤井町
工期 平成26年2月5日～平成27年3月20日
工事内容 PC7径間連続中空床版橋
橋長 171.5m
コンクリート 1205m³
支承 16個




工事進捗

5月末進捗率: 9.6%

5月より支保工の組立を開始しました。
6月13日に市道西山南居林1号線を規制させていただきながら支保工の組立をいたしました。
また、7月3日に市道藤井西山3号線を規制しながら支保工の組立を行う予定です。
地元の皆様には何かとご不便、ご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、工事に関してご不明な点、ご質問等がございましたら、お気軽に声をお掛け下さい。



PDA

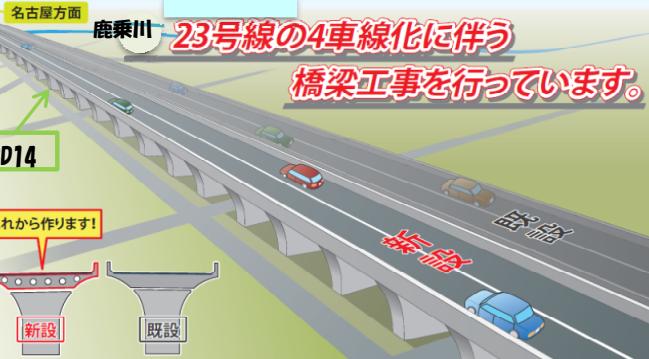

PD15-16支保工組立中

⑭ 平成25年度 23号岡崎BP矢作古川橋床版工事

(株)近藤組

工事概要

工事名 平成25年度 23号岡崎BP矢作古川橋床版工事
工事場所 西尾市小島町～志貴野町
工期 平成26年3月21日～平成26年12月25日
工事内容 床版工 1式
道路土工 1式
地盤改良工(リ-アレンジ工法) 1式
擁壁工(リ-アレンジ工法) 1式
排水構造物工 1式
縁石工 1式
構造物撤去工 1式

工事進捗

5月末進捗率: 1.2%

5月より工事の準備の入りました。名古屋側から、志貴野町・小島町にて擁壁工事をしています。県道479号線上では長さ110mの橋の床版型枠の組立を行なっています。矢作古川上にて長さ315mの橋の床版工事を行ないます。

床版工事とは、例えますと橋に筋肉を付ける工事です。道路完成時には舗装の下に隠れてしまいますが、鉄筋とコンクリートで車が走れるようにするための縫の下の力持ちといったところです。

工事が進みにつれ、道路規制や大型車両の出入りが多くなり、ご不便をおかけすることになりますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

進捗→

