


岡崎バイパス工事便り 平成27年 5月号



一般国道23号岡崎バイパスは名豊道路の一部として計画され、東は蒲郡バイパス、西は知立バイパスと接続する延長14.6kmのバイパスです。岡崎バイパスのうち、安城西尾ICから藤井ICまでは4車線で供用されており、藤井ICから幸田芦谷ICまでは暫定的に2車線で供用されています。現在、藤井ICから西尾東ICまでの区間について、平成27年度中の4車線化を目指して工事を行っています。現在施工中の工事の概要と進捗等についてお伝えしていきます。

西尾建設監督官詰所 (0563-55-7081)

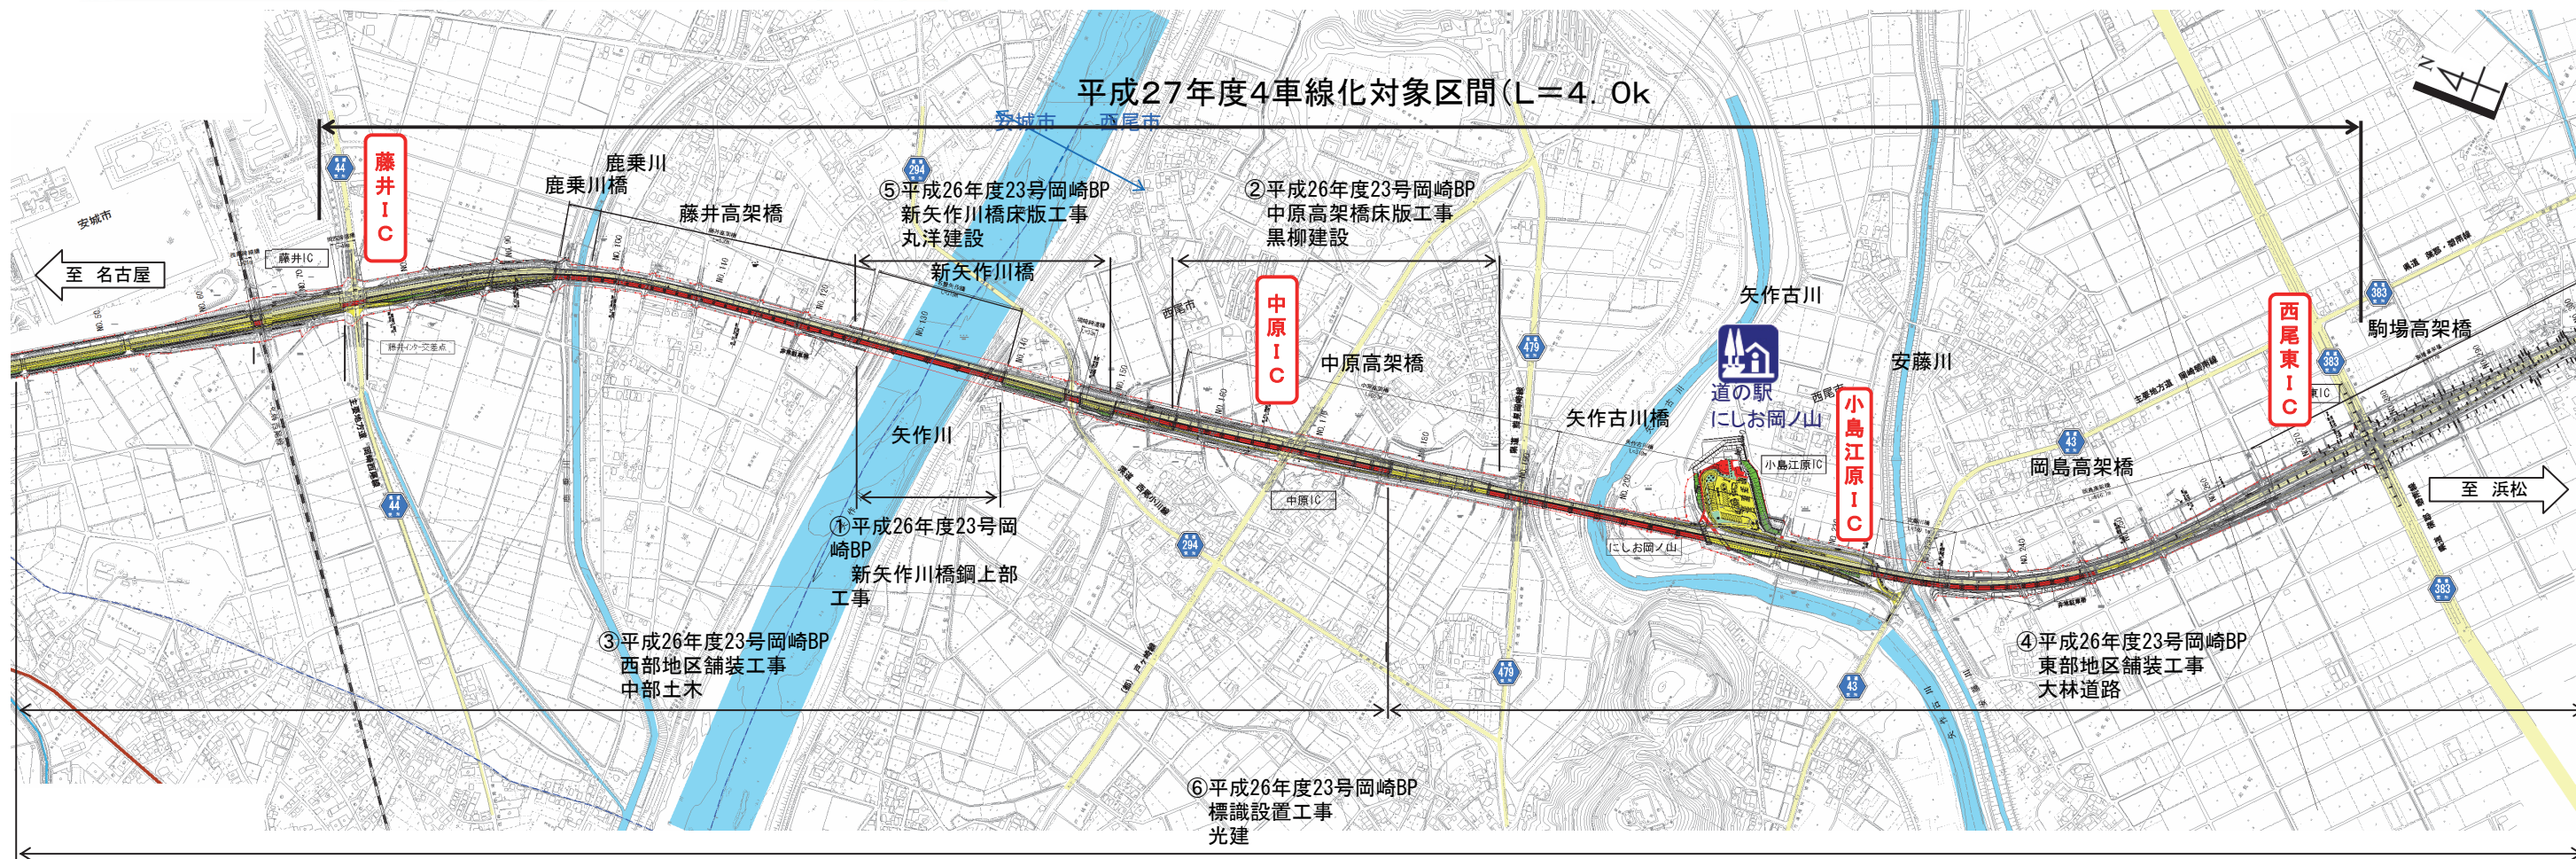


① 平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋鋼上部工事

(株) IHIインフラシステム

工事概要

工事名 平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋鋼上部工事
工事場所 西尾市志貴野町～安城市藤井町
工期 平成26年6月19日～平成27年6月30日
工事内容 工場製作工 1式
 工場製品輸送工 1式
 道路土工 1式
 仮設工 1式
 鋼橋架設工 1式
 橋梁付属物工 1式



工事進捗

4月末進捗率: 97.7%

4月までで橋桁の架設作業は完了しました。5月は桁架設で利用した作業ヤードと工事用車両進入路の撤去作業を行います。
 新矢作川橋の今後の作業としては別工事になり、床版工事と舗装工事があります。この新矢作川橋は架設作業が渇水期で期間に制約があり、今年度末の供用開始に向けて厳しい工程になっていますが、無事に開通できるよう願うとともに、工程短縮に貢献できたと自負しております。
 今後大きな交通規制はありませんが6月下旬の工事完成まで、ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

右岸上流側より 作業ヤード撤去中



左岸上流側より 工事用道路撤去中



② 平成26年度 23号岡崎BP中原高架橋床版工事

黒柳建設(株)

工事概要


工事名 平成26年度 23号岡崎BP中原高架橋床版工事
工事場所 西尾市中原町
工期 平成27年2月4日～平成27年10月30日
工事内容 床版工 1式
 橋梁付属物工 1式
 鋼橋足場等設置工 1式
 構造物撤去工 1式



工事進捗

4月末進捗率: 14.8%

3月末より、中原インターにて工事を着手しました。足場の設置作業が終了し、現在、床版の型枠組立て及び鉄筋組立て作業を並行して行っています。5月中旬からコンクリート打設作業を順次開始する予定です。
 工事車両の通行等に伴い、近隣住民の皆様にご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

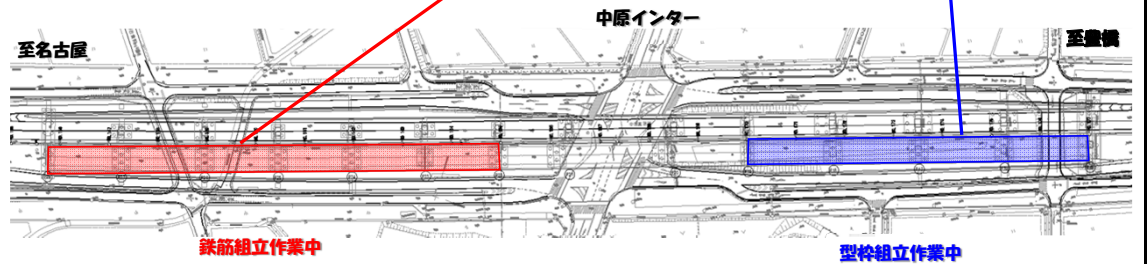


③ 平成26年度 23号岡崎BP西部地区舗装工事

中部土木(株)

工事概要

工事名 平成26年度 23号岡崎BP西部地区舗装工事
工事場所 西尾市中原町～安城市藤井町
工期 平成27年3月14日～平成28年3月25日
工事内容 道路土工 1式
 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 縁石工 1式
 防護柵工 1式
 区画線工 1式

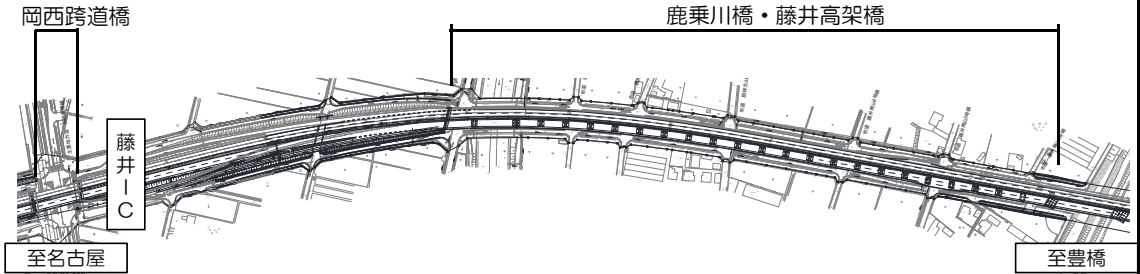

工事進捗

4月末進捗率: 1.2%

現在は、工事着工に向けて準備作業を行っています。5月中旬から、藤井高架橋にて橋面防水の作業を行う予定をしております。
 これから、工事車両の出入りが多くなります。地元の皆様には、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。



④ 平成26年度 23号岡崎BP東部地区舗装工事

大林道路(株)

工事概要

工事名 平成26年度 23号岡崎BP東部地区舗装工事
工事場所 西尾市駒場町～中原町
工期 平成27年3月18日～平成28年3月25日
工事内容 道路土工 1式
 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 縁石工 1式
 防護柵工 1式
 構造物撤去工 1式



工事進捗

4月末進捗率: 00.0%

中原ICから西尾東ICまでのアスファルト舗装工事を担当いたします大林道路です。工期は平成28年3月までとなりますので、これからよろしくお願い致します。
 5月から西尾東ICにて工事に着手する予定です。工事車両の通行等により近隣住民の皆様にご不便ご迷惑をお掛けしますが、安全第一に工事を進め、早期完成に努めてまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願い致します。



中原IC オフランプ




西尾東IC オンランプ

⑤ 平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋床版工事

丸洋建設(株)

工事概要

工事名 平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋床版工事
 工事場所 西尾市中原町～安城市藤井町
 工期 平成27年3月21日～平成27年12月25日
 工事内容 床版工 1式
 排水装置工 1式
 地覆工 1式
 橋梁用防護柵工 1式
 橋梁用高欄工 1式
 橋梁足場工 1式

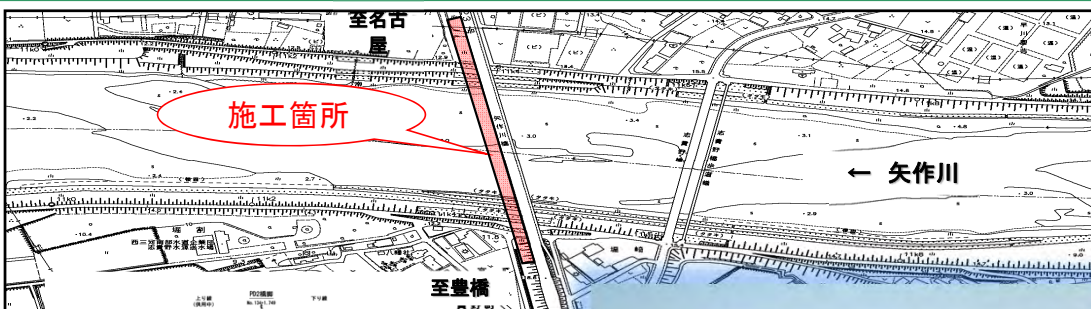


工事進捗

4月末進捗率: 1.3%

ゴールデンウィークの連休明けより着手し、8月にはコンクリートが流し込めるよう、順次作業を進めてまいります。
 ○初めに「①(工事中)」の橋梁架設工事さんの架けられた鋼桁に、型枠、鉄筋を組み立て、コンクリートを流し込み、車の通れる橋の形にする工事を行います。

地元の方々をはじめ、皆様には、何かとご不便ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力のほど宜しくお願いいたします。

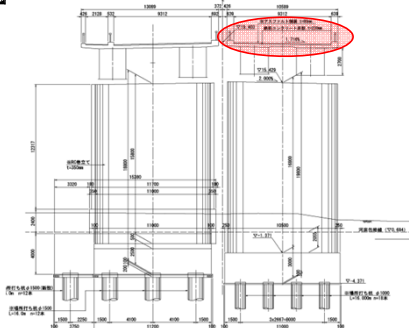

丸洋建設株式会社
 すべてはゆたかなくらしのために



⑥ 平成26年度 23号岡崎BP標識設置工事

(株)光建

工事概要

工事名 平成26年度 23号岡崎BP標識設置工事
 工事場所 西尾市駒場町～安城市藤井町
 工期 平成27年3月24日～平成28年3月30日
 工事内容 大型標識設置工 1式
 標識撤去工 1式
 構造物撤去工 1式



工事進捗

4月末進捗率: 00.0%

現在施工準備中です、5月から調査測量に入ります。
 6月から矢作古川橋北側の標識設置準備に入る予定です。
 施工は側道を占有して行います、ご理解、ご協力をよろしくお願い致します。



下り線 矢作古川橋から北を望む 施工
