


岡崎バイパス工事便り 平成27年 8月号

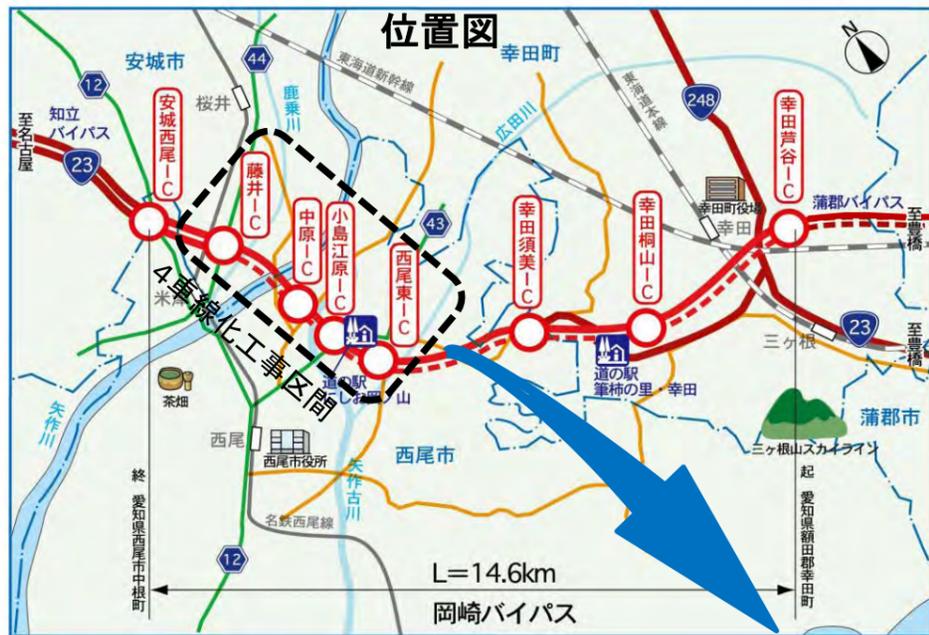

一般国道23号岡崎バイパスは名豊道路の一部として計画され、東は蒲郡バイパス、西は知立バイパスと接続する延長14.6kmのバイパスです。岡崎バイパスのうち、安城西尾ICから藤井ICまでは4車線で供用されており、藤井ICから幸田芦谷ICまでは暫定的に2車線で供用されています。

現在、藤井ICから西尾東ICまでの区間について、平成27年度中の4車線化を目指して工事を行っています。

現在施工中の工事の概要と進捗等についてお伝えしていきます。

西尾建設監督官詰所 (0563-55-7081)




① 平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋鋼上部工事

(株) IHIインフラシステム

工事概要

工事名 平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋鋼上部工事
工事場所 西尾市志貴野町～安城市藤井町
工期 平成26年6月19日～平成27年6月30日
工事内容

工場製作工	1式
工場製品輸送工	1式
道路土工	1式
仮設工	1式
鋼橋架設工	1式
橋梁付属物工	1式



工事進捗

6月25日 工事完了

昨年10月より工事を開始し、6月25日をもちまして工事を完了いたしました。
 工事中は地元の皆様には何かとご迷惑をお掛けしたと思っておりますが、ご理解とご協力を頂いたおかげで無事工事を完了することが出来ました。ありがとうございます。
 岡崎バイパスの工事は、年度末の供用開始に向けてまだまだ続きますが、皆様の更なるご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

右岸下流側より望む



左岸下流側より望む



② 平成26年度 23号岡崎BP中原高架橋床版工事

黒柳建設(株)

工事概要

工事名 平成26年度 23号岡崎BP中原高架橋床版工事
工事場所 西尾市中原町
工期 平成27年2月4日～平成27年10月30日
工事内容


床版工	1式
橋梁付属物工	1式
鋼橋足場等設置工	1式
構造物撤去工	1式



工事進捗

7月末進捗率: 83.8%

7月は、壁高欄のコンクリート打設が完了し、転落防止網の設置及び型枠の解体を行いました。
 8月からは、桁下に排水装置の取り付け、及び足場の解体を行っています。
 地元の皆様には、大変ご迷惑をお掛けしていますが、ご理解とご協力のほど宜しくお願い致します。
 なお、工事に関して、ご不明な点などございましたら、お気軽にお声をお掛け下さい。

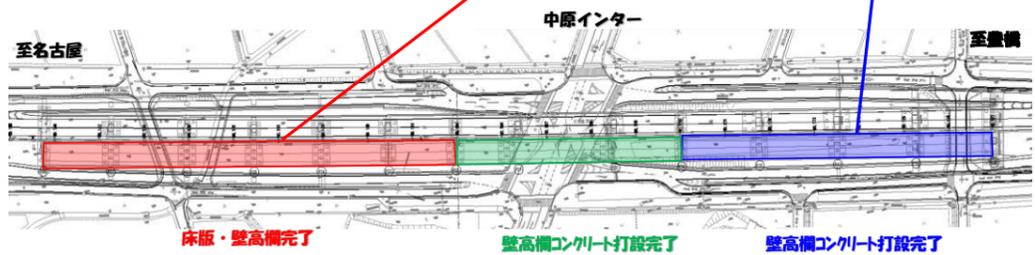


③ 平成26年度 23号岡崎BP西部地区舗装工事

中部土木(株)

工事概要

工事名 平成26年度 23号岡崎BP西部地区舗装工事
工事場所 西尾市中原町～安城市藤井町
工期 平成27年3月14日～平成28年3月25日
工事内容

道路土工	1式
舗装工	1式
排水構造物工	1式
縁石工	1式
防護柵工	1式
区画線工	1式

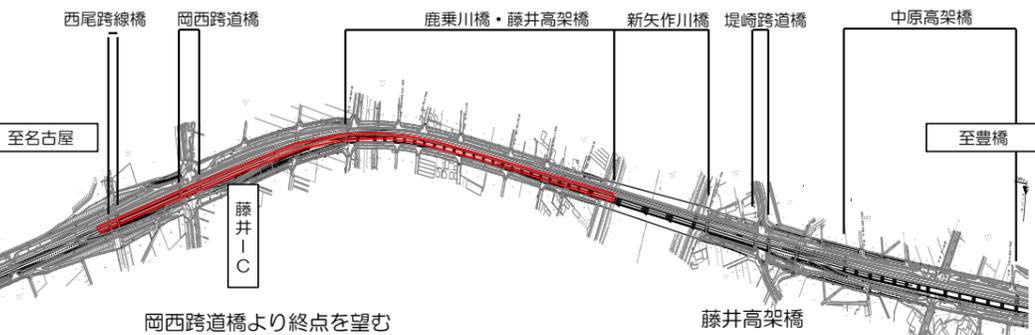

工事進捗

6月末進捗率: 33.1%

7月から、藤井高架橋～名鉄西尾跨線橋の間で、区画線作業を行い、赤い範囲の工事が概ね完了しました。また、藤井ICの各ランプを路肩規制をして、仮設ガードレールの撤去を行いました。
 8月からは、中原高架橋で測量→橋面防水工→舗装工の順に作業を行います。また、順次、供用に向けた仮設工の作業を予定しています。道路利用者の皆様には、交通規制等で、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。



④ 平成26年度 23号岡崎BP東部地区舗装工事

大林道路(株)

工事概要

工事名 平成26年度 23号岡崎BP東部地区舗装工事
工事場所 西尾市駒場町～中原町
工期 平成27年3月18日～平成28年3月25日
工事内容

道路土工	1式
舗装工	1式
排水構造物工	1式
縁石工	1式
防護柵工	1式
構造物撤去工	1式



工事進捗

7月末進捗率: 55.0%

7月は、安藤岡島高架橋、矢作古川橋にて防水工事また、舗装工事を行いました。
 舗装工事においては、ダンプトラックの出入りが多くない近隣住民の皆様にご不便ご迷惑をお掛けいたしました。
 今後とも安全第一に工事を進め、早期完成に努めてまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願い致します。



矢作古川橋 橋面防水完了




安藤岡島橋 舗装状況

⑤ 平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋床版工事

丸洋建設(株)

工事概要

工事名 平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋床版工事
 工事場所 西尾市中原町～安城市藤井町
 工期 平成27年3月21日～平成27年12月25日
 工事内容 床版工 1式
 排水装置工 1式
 地覆工 1式
 橋梁用防護柵工 1式
 橋梁用高欄工 1式
 橋梁足場工 1式

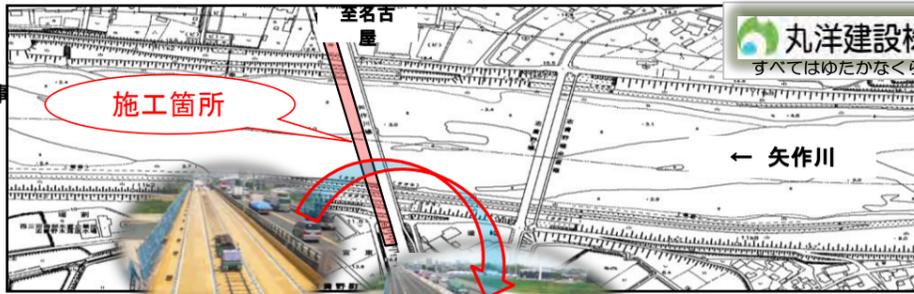

丸洋建設株式会社
 すべてはゆたかなくらしのために

工事進捗

6月末進捗率: 43.0%

着手後3カ月、関係する皆様の多大なるご協力により、床版コンクリートを打込む作業もほぼ完了し、歩いてなら容易に矢作川を横断できるようにまで進みました。
 今後は、車が安全に通れるよう地覆や高欄を制作し、開通に向け一步一步作業を進めてまいります。
 地元の方々をはじめ、道路利用者の皆様には、何かとご不便ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力のほど宜しくお願いいたします。



⑥ 平成26年度 23号岡崎BP標識設置工事

(株)光建

工事概要

工事名 平成26年度 23号岡崎BP標識設置工事
 工事場所 西尾市駒場町～安城市藤井町
 工期 平成27年3月24日～平成28年3月30日
 工事内容 大型標識設置工 1式
 標識撤去工 1式
 構造物撤去工 1式



工事進捗

7月末進捗率: 6.8%

20基の標識(新設・建替)を行います。
 矢作古川橋北側の標識アンカーを設置完了しました
 8月は下り線側の標識10基を取付けます。
 ご理解、ご協力をよろしくお願い致します。



標識アンカー設置完了(下り線 矢作古川橋北側)
