


岡崎バイパス工事便り 平成27年 9月号

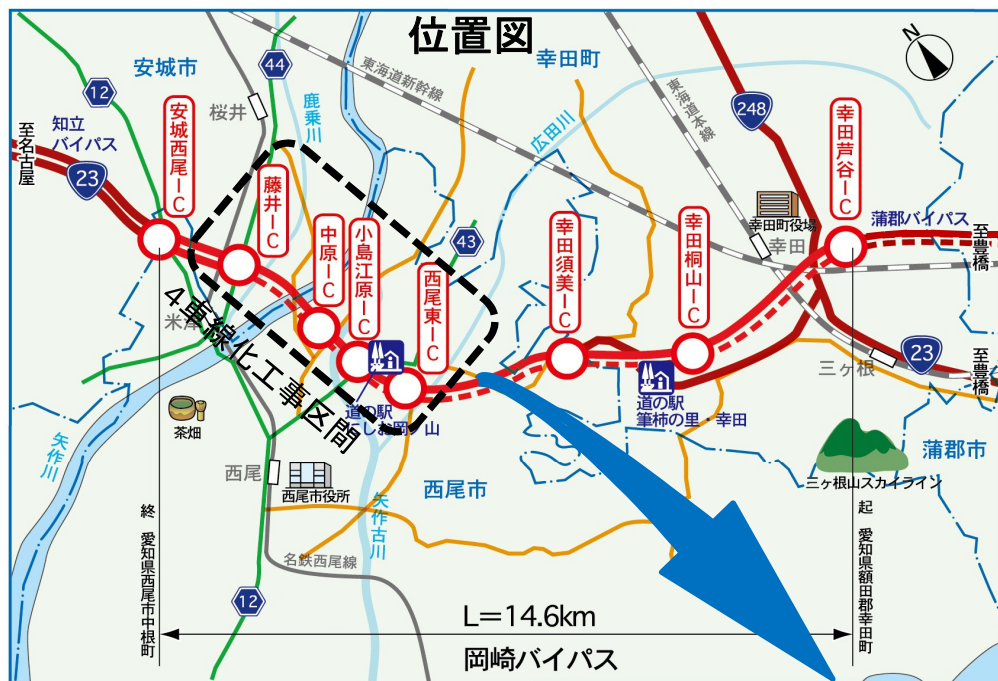


一般国道23号岡崎バイパスは名豊道路の一部として計画され、東は蒲郡バイパス、西は知立バイパスと接続する延長14.6kmのバイパスです。岡崎バイパスのうち、安城西尾ICから藤井ICまでは4車線で供用されており、藤井ICから幸田芦谷ICまでは暫定的に2車線で供用されています。

現在、藤井ICから西尾東ICまでの区間について、平成27年度中の4車線化を目指して工事を行っています。

現在施工中の工事の概要と進捗等についてお伝えしていきます。

西尾建設監督官詰所 (0563-55-7081)

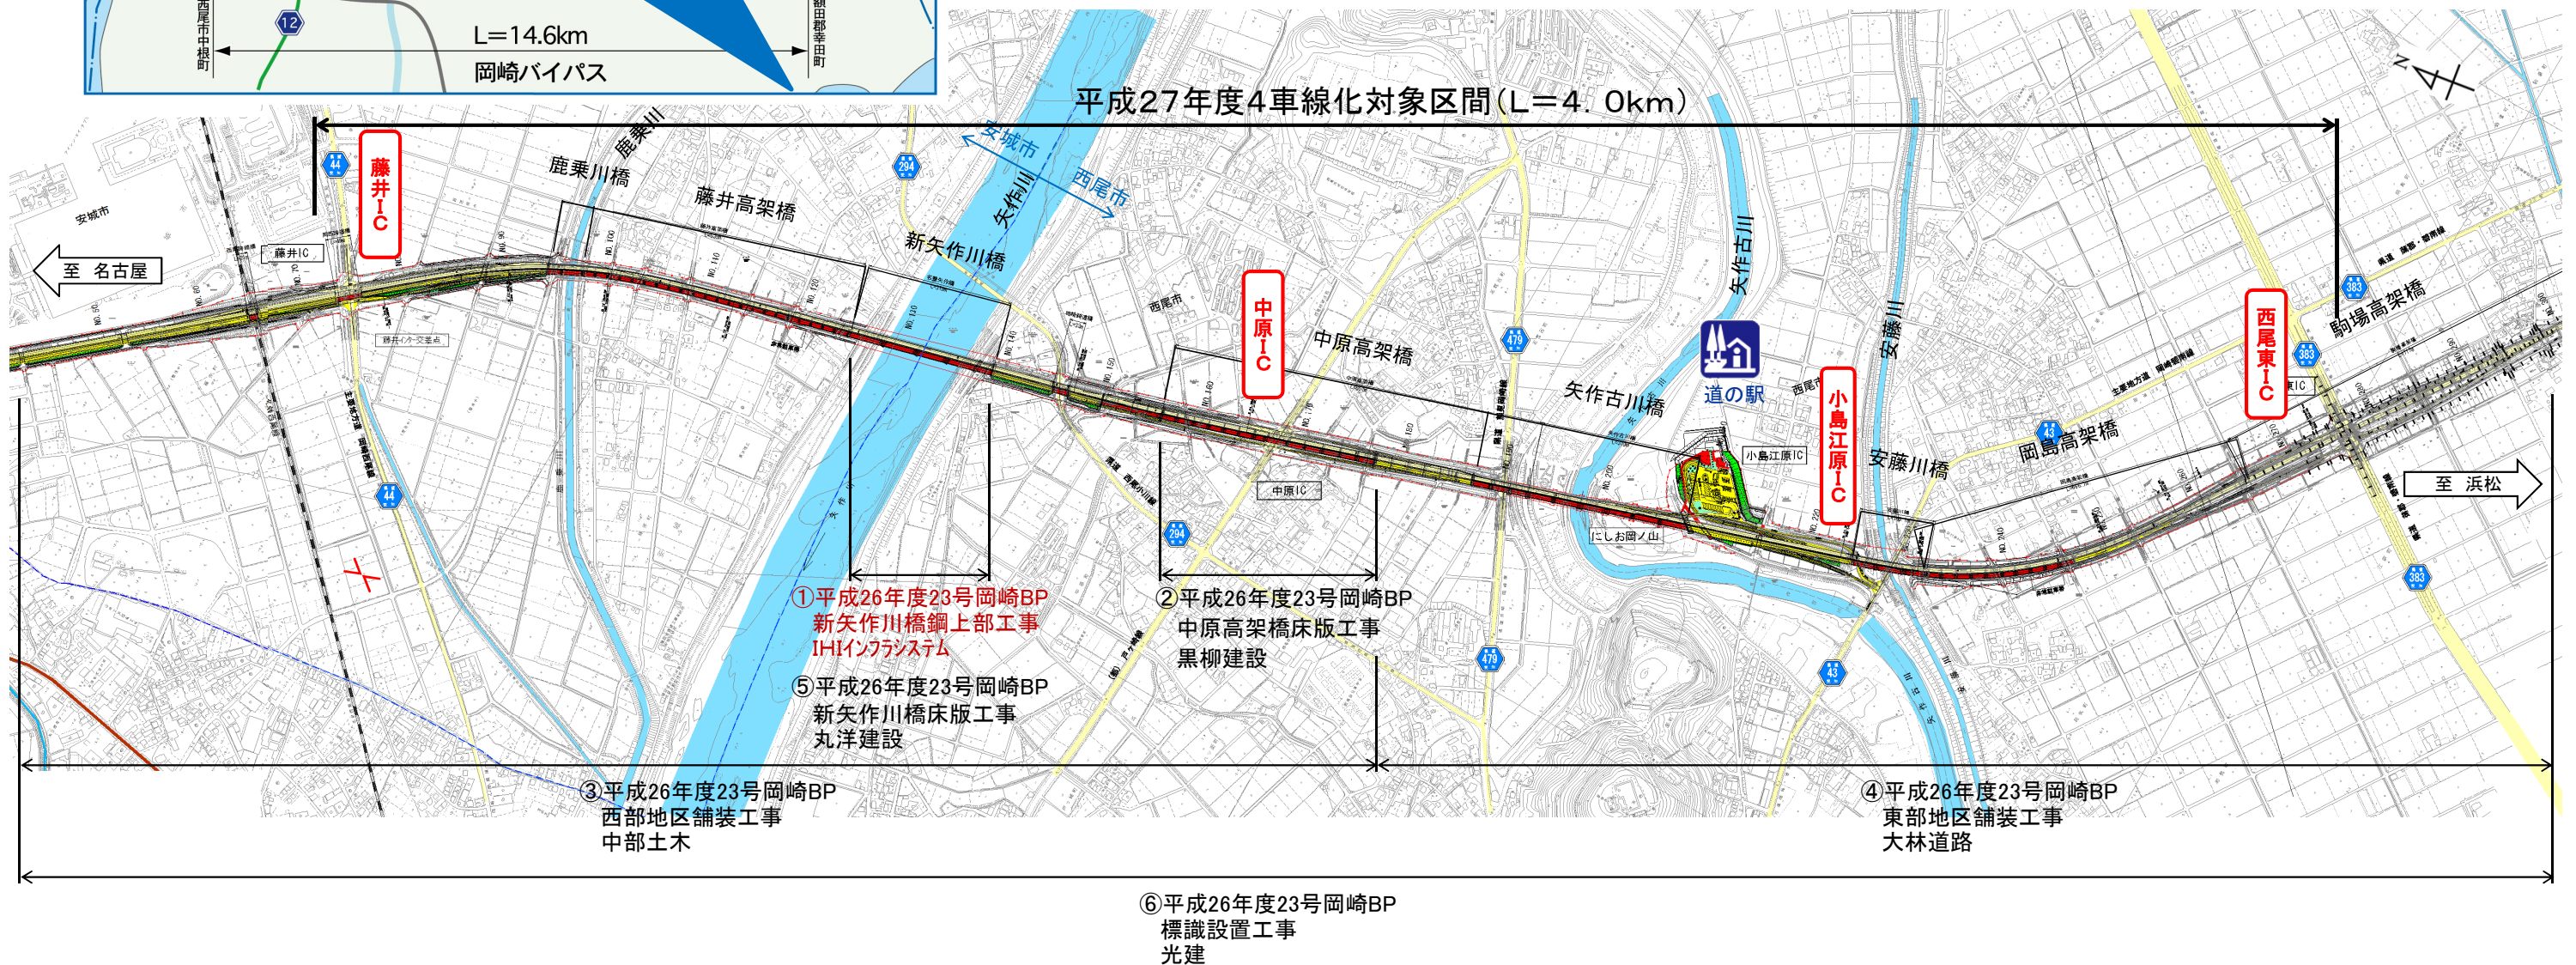


① 平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋鋼上部工事

(株) IHIインフラシステム

工事概要

工事名 平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋鋼上部工事
 工事場所 西尾市志貴野町～安城市藤井町
 工期 平成26年6月19日～平成27年6月30日
 工事内容 工場製作工 1式
 工場製品輸送工 1式
 道路土工 1式
 仮設工 1式
 鋼橋架設工 1式
 橋梁付属物工 1式



工事進捗

6月25日 工事完了

昨年10月より工事を開始し、6月25日をもって工事を完了いたしました。工事中は地元の皆様には何かと迷惑をお掛けしたと思いますが、ご理解とご協力を頂いたおかげで無事工事を完了することが出来ました。ありがとうございます。
 岡崎バイパスの工事は、年度末の供用開始に向けてまだまだ続きますが、皆様の更なるご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

右岸下流側より望む



左岸下流側より望む



② 平成26年度 23号岡崎BP中原高架橋床版工事

黒柳建設(株)

工事概要

工事名 平成26年度 23号岡崎BP中原高架橋床版工事
 工事場所 西尾市中原町
 工期 平成27年2月4日～平成27年10月30日
 工事内容 床版工 1式
 橋梁付属物工 1式
 鋼橋足場等設置工 1式
 構造物撤去工 1式



豊橋方面を望む




名古屋方面を望む



工事進捗

8月末進捗率: 88.8%

8月10日に床版、壁高欄の施工が無事に完了しました。現在は、足場の解体作業を行っています。足場の解体作業に伴い一部で通行止め・片側交互通行の交通規制を行います。
 地元の皆様には、大変ご迷惑をお掛けしていますが、ご理解とご協力のほど引き続き宜しくお願い致します。
 なお、工事に関して、ご不明な点などございましたら、お気軽にお声をお掛け下さい。

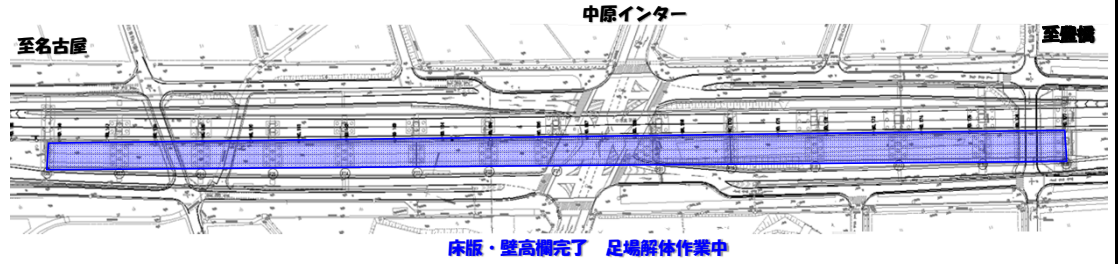


③ 平成26年度 23号岡崎BP西部地区舗装工事

中部土木(株)

工事概要

工事名 平成26年度 23号岡崎BP西部地区舗装工事
 工事場所 西尾市中原町～安城市藤井町
 工期 平成27年3月14日～平成28年3月25日
 工事内容 道路土工 1式
 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 縁石工 1式
 防護柵工 1式
 区画線工 1式

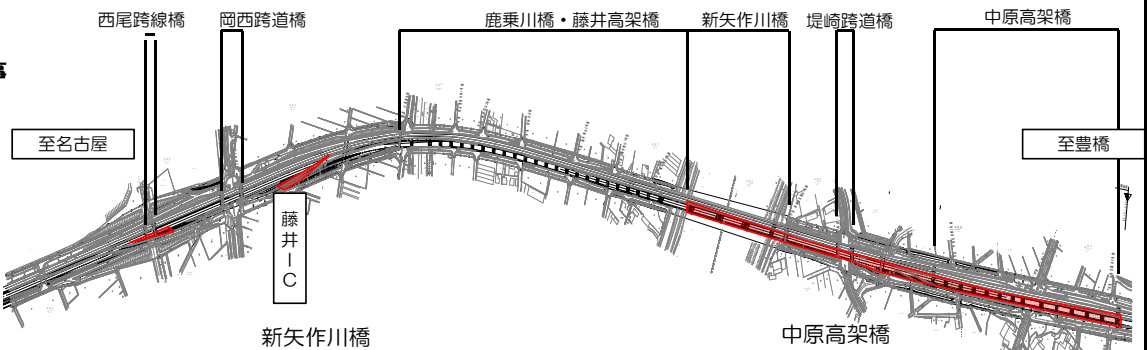

工事進捗

8月末進捗率: 43.5%

8月は、中原高架橋で測量→橋面防水工の作業を行いました。
 9月からは、新矢作川橋にて、橋面防水工→舗装工の施工を行い、新矢作川橋～中原高架橋間で区画線・照明・道路付属物作業を行います。また、藤井ICオン・オフランプにて区画線の消去・設置作業を路肩規制にて行います。そして、車線切替に向けて、工事区間の安全設備作業を行っていきます。
 皆様には、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。



④ 平成26年度 23号岡崎BP東部地区舗装工事

大林道路(株)

工事概要

工事名 平成26年度 23号岡崎BP東部地区舗装工事
 工事場所 西尾市駒場町～中原町
 工期 平成27年3月18日～平成28年3月25日
 工事内容 道路土工 1式
 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 縁石工 1式
 防護柵工 1式
 構造物撤去工 1式



工事進捗

8月末進捗率: 60.3%

8月は、安藤岡島高架橋、矢作古川橋にて舗装工事を行いました。9月は、防護柵工、道路付属物工、区画線工を順次、施工します。
 防護柵工事においては、路肩規制により道路利用者の皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、今後とも安全第一に工事を進め、早期完成に努めてまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願い致します。



矢作古川橋 排水性舗装完了



安藤岡島橋 排水性舗装完了

⑤ 平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋床版工事

丸洋建設(株)

工事概要


工事名 平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋床版工事
工事場所 西尾市中原町～安城市藤井町
工期 平成27年3月21日～平成27年12月25日
工事内容

床版工	1式：完了
排水装置工	1式：あと少し
地覆工	1式：完了
橋梁用防護柵工	1式：完了
橋梁用高欄工	1式：完了
橋梁足場工	1式：あと少し

工事進捗

8月末進捗率：67.3%

着手後4カ月、関係する皆様の多大なるご協力により、床版コンクリート工事・高欄工事は、完了しました。残りの足場解体を高架下で行います。今後は、舗装工事業者さんに引渡し、開通に向け舗装工事を一步一步作業を進めてまいります。地元の方々をはじめ、道路利用者の皆様には、何かとご不便ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力のほど宜しくお願いいたします。

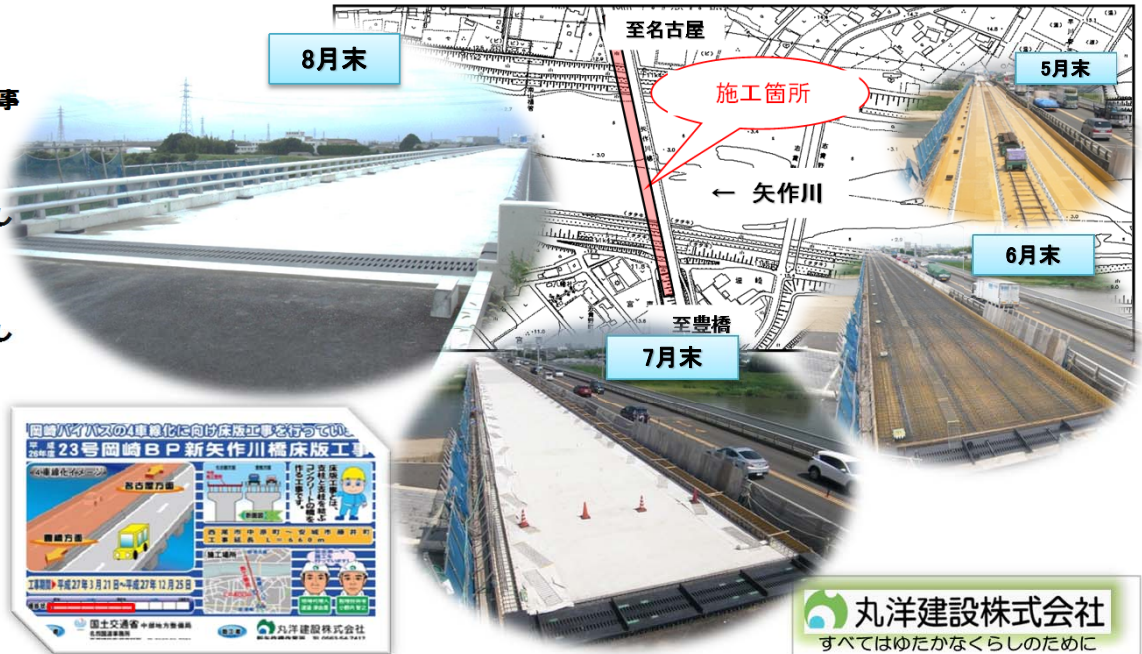

丸洋建設株式会社
すべてはゆたかなくらしのために

⑥ 平成26年度 23号岡崎BP標識設置工事

(株)光建

工事概要


工事名 平成26年度 23号岡崎BP標識設置工事
工事場所 西尾市駒場町～安城市藤井町
工期 平成27年3月24日～平成28年3月30日
工事内容

大型標識設置工	1式
標識撤去工	1式
構造物撤去工	1式

工事進捗

8月末進捗率：33.9%

20基の標識(新設・建替)を行います。下り線側9基の標識を設置完了しました。9月は下り線側の残り11基の標識取付と、上り線側の標識設置準備にかかります。側道の通行止め等がありますので、ご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

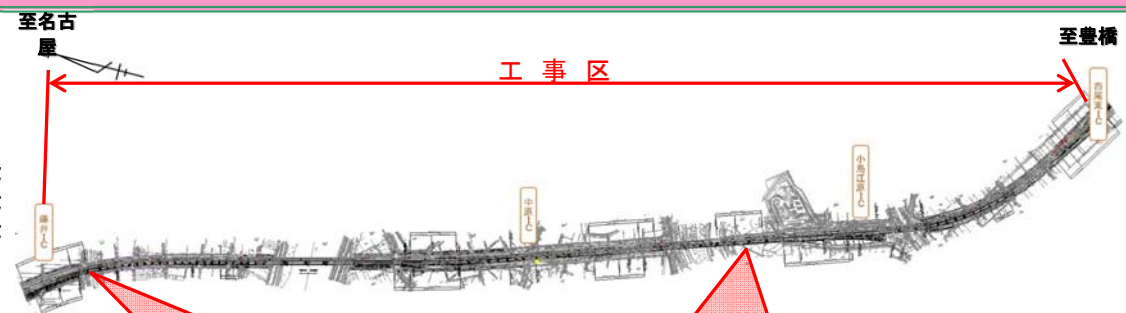

標識設置完了(下り線 藤井IC Offランプ部) 標識設置完了(下り線 中原IC Offランプ東300m)
