


岡崎バイパス工事便り 平成27年11月号

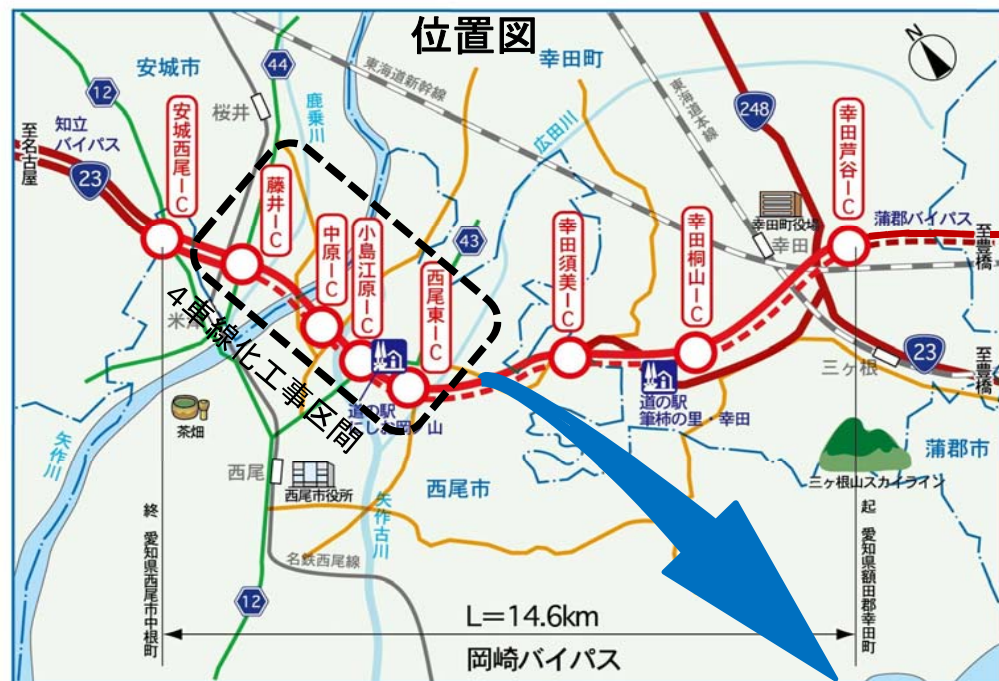

一般国道23号岡崎バイパスは名豊道路の一部として計画され、東は蒲郡バイパス、西は知立バイパスと接続する延長14.6kmのバイパスです。岡崎バイパスのうち、安城西尾ICから藤井ICまでは4車線で供用されており、藤井ICから幸田芦谷ICまでは暫定的に2車線で供用されています。

現在、藤井ICから西尾東ICまでの区間について、平成27年度中の4車線化を目指して工事を行っています。

現在施工中の工事の概要と進捗等についてお伝えしていきます。

西尾建設監督官詰所 (0563-55-7081)




① 平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋鋼上部工事

(株) IHIインフラシステム

工事概要

工事名	平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋鋼上部工事
工事場所	西尾市志貴野町～安城市藤井町
工期	平成26年6月19日～平成27年6月30日
工事内容	工場製作工 1式
	工場製品輸送工 1式
	道路土工 1式
	仮設工 1式
	鋼橋架設工 1式
	橋梁付属物工 1式



工事進捗

6月25日 工事完了

昨年10月より工事を開始し、6月25日をもって工事を完了いたしました。
 工事中は地元の皆様には何かとご迷惑をお掛けしたと思っておりますが、ご理解とご協力を頂いたおかげで無事工事を完了することが出来ました。ありがとうございます。
 岡崎バイパスの工事は、年度末の供用開始に向けてまだまだ続きますが、皆様の更なるご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

右岸下流側より望む



左岸下流側より望む



② 平成26年度 23号岡崎BP中原高架橋床版工事

黒柳建設(株)

工事概要

工事名	平成26年度 23号岡崎BP中原高架橋床版工事
工事場所	西尾市中原町
工期	平成27年2月4日～平成27年10月30日
工事内容	床版工 1式
	橋梁付属物工 1式
	鋼橋足場等設置工 1式
	排水構造物工 1式
	縁石工 1式
	防護柵工 1式
	道路付属施設工 1式



名古屋方面を望む




豊橋方面を望む (高架下)



工事進捗

10月末進捗率: 100%

10月26日をもってすべての工事が完了いたしました。
 地元の皆様や、道路を利用される皆様のご協力により、無事に工事を完了することができました。
 本当にありがとうございました。




③ 平成26年度 23号岡崎BP西部地区舗装工事

中部土木(株)

工事概要

工事名	平成26年度 23号岡崎BP西部地区舗装工事
工事場所	西尾市中原町～安城市藤井町
工期	平成27年3月14日～平成28年3月25日
工事内容	道路土工 1式
	舗装工 1式
	排水構造物工 1式
	縁石工 1式
	防護柵工 1式
	区画線工 1式

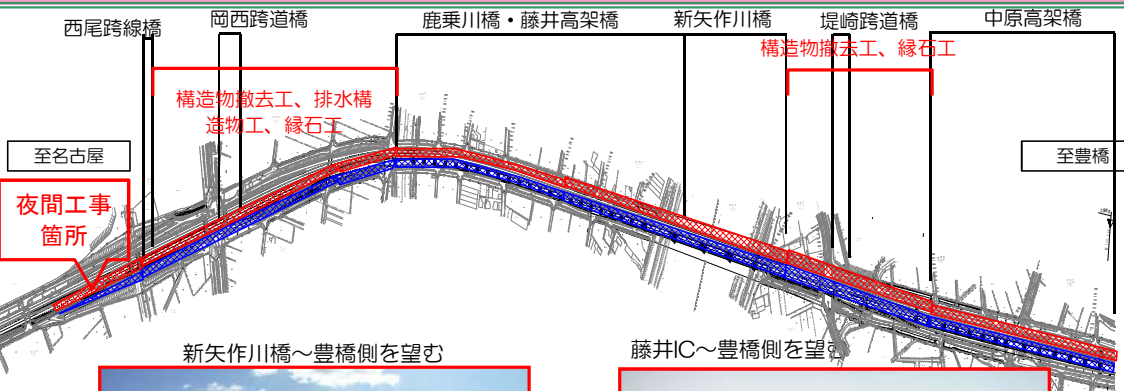

工事進捗

10月末進捗率: 70.0%

10月は、中央分離帯の工事をを行い、構造物取壊し工が完了し、排水構造物・縁石工の施工を行っています。
 11月も引き続き、排水構造物工・縁石工の施工を行い、完了後、ガードレール・道路付属物の施工にまいります。また、11月中旬から右側の箇所の夜間工事をまいります。
 工事車両の入場時・退出時は、道路利用者を最優先で作業を行ってまいりますので、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

新矢作川橋～豊橋側を望む



藤井IC～豊橋側を望む



④ 平成26年度 23号岡崎BP東部地区舗装工事

大林道路(株)

工事概要

工事名	平成26年度 23号岡崎BP東部地区舗装工事
工事場所	西尾市駒場町～中原町
工期	平成27年3月18日～平成28年3月25日
工事内容	道路土工 1式
	舗装工 1式
	排水構造物工 1式
	縁石工 1式
	防護柵工 1式
	構造物撤去工 1式



工事進捗

10月末進捗率: 85.1%

10月は、中央分離帯の工事を西尾東、小島、中原の各工区にて施工しました。
 11月についても、中央分離帯の工事を継続してまいります。また、上り線(豊橋行き)におきましては、全区間において道路中心線部切削オーバーレイの工事を予定しております。
 道路利用者の皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、今後とも安全第一に工事を進め、早期完成に努めてまいりますので、ご理解ご協力をよろしくお願い致します。



中原工区 7'レール防護柵完了



小島工区 ガードレール施工中



西尾東工区 ガードレール基礎施工中

⑤ 平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋床版工事

丸洋建設(株)

工事概要

工事名	平成26年度 23号岡崎BP新矢作川橋床版工事	
工事場所	西尾市中原町～安城市藤井町	
工期	平成27年3月21日～平成27年12月25日	
工事内容	床版工	1式：完了
	排水装置工	1式：完了
	地覆工	1式：完了
	橋梁用防護柵工	1式：完了
	橋梁用高欄工	1式：完了
	橋梁足場工	1式：完了

工事進捗

10月末進捗率：90.0%

着手後6カ月、関係する皆様の多大なるご協力により、新矢作川橋は、舗装工事も無事完了し、一部分ではあります新しい道路を通行していただいております。
現在は、使用させて頂いていた高架下を一部分整備し、12月中旬に竣工を迎えられる様、作業を進めております。
地元の方々をはじめ、道路利用者の皆様には、何かとご不便ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力のほど宜しくお願いいたします。



丸洋建設株式会社
すべてはゆたかなくらしのために

⑥ 平成26年度 23号岡崎BP標識設置工事

(株)光建

工事概要

工事名	平成26年度 23号岡崎BP標識設置工事	
工事場所	西尾市駒場町～安城市藤井町	
工期	平成27年3月24日～平成28年3月30日	
工事内容	大型標識設置工	1式
	標識撤去工	1式
	構造物撤去工	1式

工事進捗

10月末進捗率：40.0%

20基の標識(新設・建替)を行います。
下り線側10基全ての標識の撤去を完了しました。
11月中旬より矢作古川橋の上で、標識の基礎構築を行います。
橋の通行にご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力をよろしくお願い致します。



標識撤去状況(下り線 藤井IC off ランプ南300m)
