

# 岡崎バイパス工事便り 平成28年 12月号




一般国道23号岡崎バイパスは名豊道路の一部として計画され、東は蒲郡バイパス、西は知立バイパスと接続する延長14.6kmのバイパスです。岡崎バイパスのうち、安城西尾ICから西尾東ICまでは4車線で供用されており、西尾東ICから幸田芦谷ICまでは、暫定的に2車線で供用されています。

平成28年2月26日に藤井ICから西尾東ICまでを4車線で供用することができました。現在は安城西尾ICから西尾東ICまでの区間について側道の整備を行っています。

現在施工中の工事の概要と進捗等についてお伝えしていきます。

西尾建設監督官詰所 (0563-55-7081)

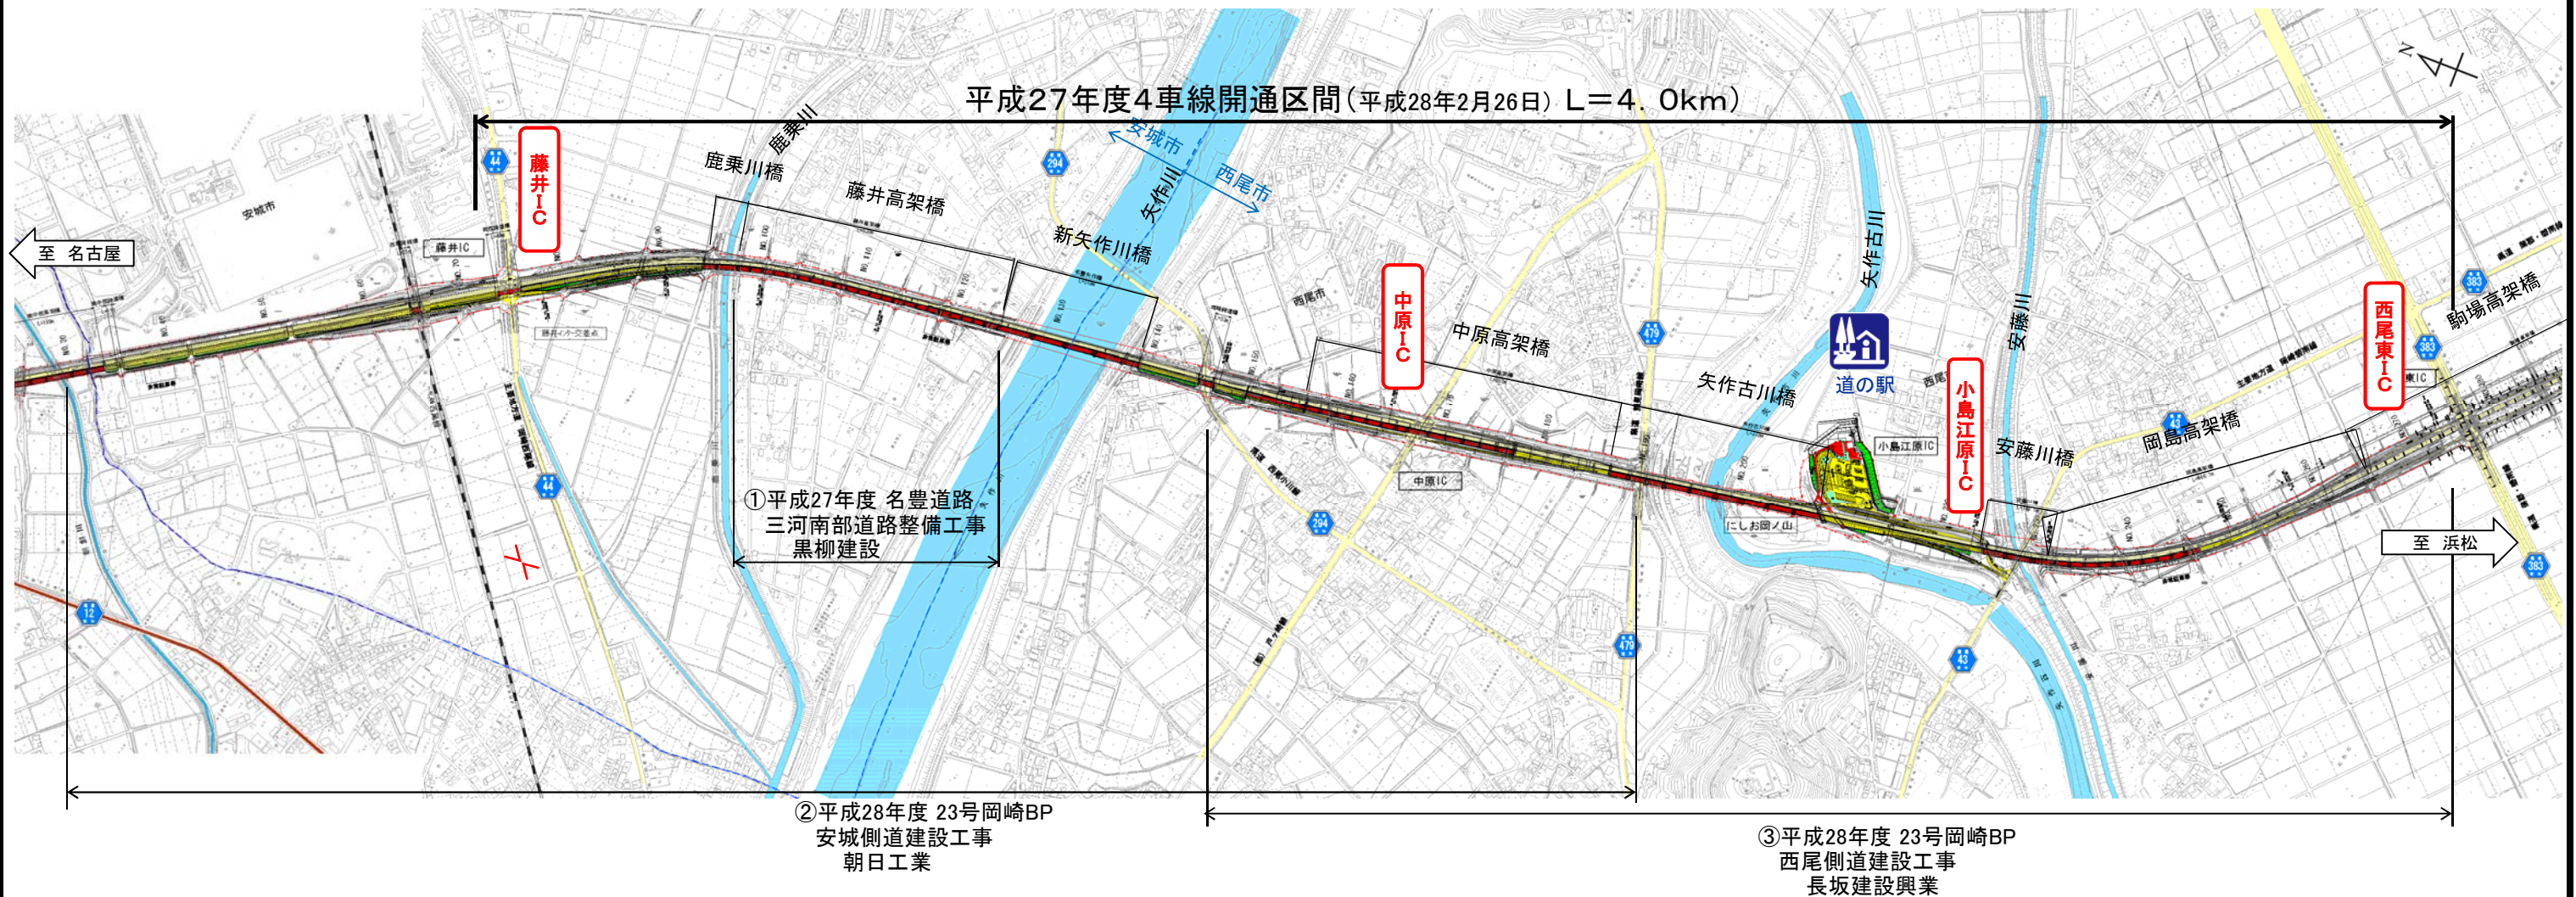



## ① 平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事 黒柳建設(株)

### 工事概要

工事名 平成27年度 名豊道路三河南部道路整備工事  
 工事場所 安城市藤井町 (506m)  
 工期 平成28年1月13日～平成29年3月24日  
 工事内容 排水構造物工 1式  
 道路付属施設工 1式  
 調整池工 1式

起点側より終点を望む



調整池(6箇所/6箇所) 完成しました。

調整池張りコンクリート完了状況




### 工事進捗

8月31日 工事完了

4月下旬より工事を進めておりましたが、皆様のご理解・ご協力のおかげで6箇所の調整池すべてを8月末に完成させることができました。

工事期間中は皆様にご不便をお掛けしました。今後も工事にご理解・ご協力をお願い致します。

最後に、地域の皆様、関係者の方々ありがとうございました。

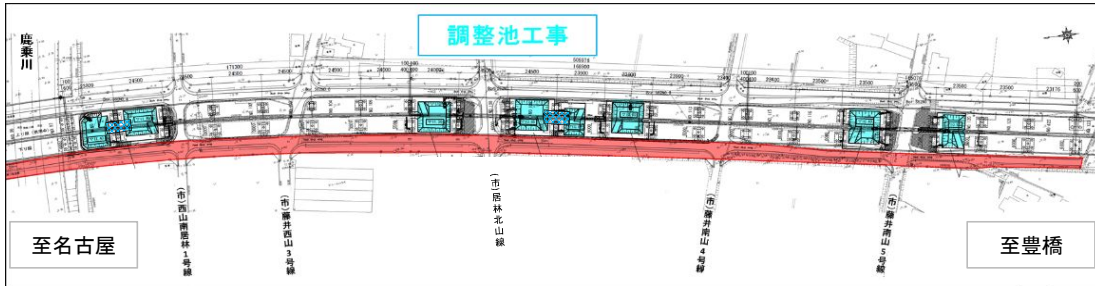

## ② 平成28年度 23号岡崎BP安城側道建設工事 朝日工業(株)

### 工事概要

工事名 平成28年度 23号岡崎BP安城側道建設工事  
 工事場所 安城市藤井町～西尾市中原町 (3280m)  
 工期 平成28年7月8日～平成29年2月28日  
 工事内容 道路土工 1式  
 舗装工 1式  
 排水構造物工 1式  
 縁石工 1式  
 防護柵工 1式  
 区画線工 1式  
 構造物撤去工 1式

### 工事進捗

11月末進捗率 51.0%

現在、藤井ICより名古屋側下り線は平成28年11月12日で歩道設置を完了しました。上り線を平成28年11月14日より側道通行止めで歩道設置を行っております。

藤井ICより豊橋側上り線は平成28年11月30日で歩道設置を完了しました。平成28年12月1日より下り線を側道通行止めで施工をしています。


通行止迂回路については、現地に看板等で案内しております。

皆様には、しばらくの間、ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願い致します。



起点から藤井ICを望む平成29年1月31日まで側道上り線通行止にて歩車道境界ブロック施工中

終点から藤井ICを望む平成28年11月30日で側道上り線歩道整備完了しました。

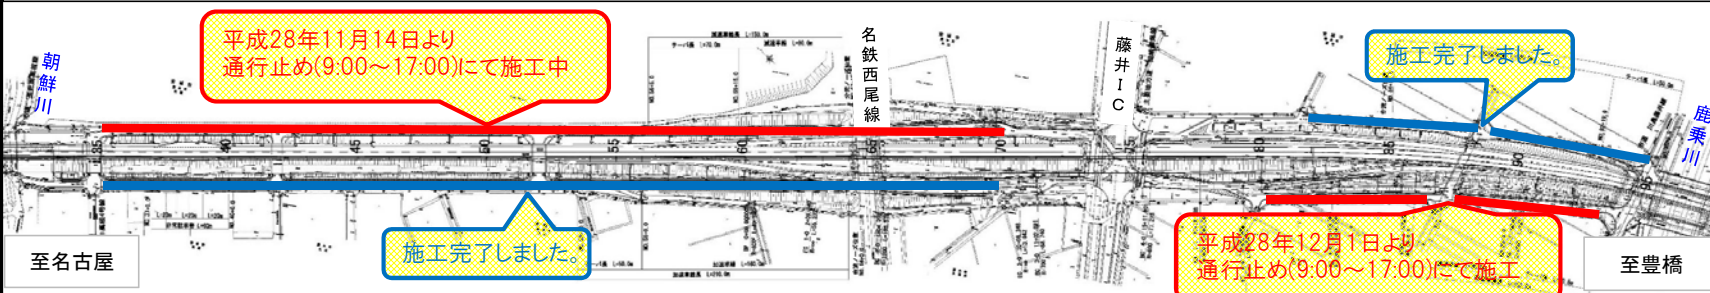

平成28年11月14日より通行止め(9:00～17:00)にて施工中

施工完了しました。

平成28年12月1日より通行止め(9:00～17:00)にて施工

## ③ 平成28年度 23号岡崎BP西尾側道建設工事 長坂建設興業(株)

### 工事概要

工事名 平成28年度 23号岡崎BP西尾側道建設工事  
 工事場所 安城市藤井町～西尾市江原町 (2770m)  
 工期 平成28年9月14日～平成29年3月10日  
 工事内容 道路土工 1式  
 舗装工 1式  
 排水構造物工 1式  
 縁石工 1式  
 防護柵工 1式  
 区画線工 1式  
 構造物撤去工 1式

### 工事進捗

11月末進捗率 9.0%

現在、藤井ICより豊橋側下り線で側道を復旧するにあたり高架下(フェンス等)を整備しています。12月5日より下り線の側道を復旧し、従来の歩道を復旧整備します。


また、中原ICより名古屋側上り線で歩道を設置する工事を12月5日より施工します。

皆様には、しばらくの間、ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願い致します。



藤井ICより豊橋側起点から終点を望む12月5日から歩道復旧工事を行います

中原IC周辺起点から終点を望む12月5日から歩道設置工事を行います。

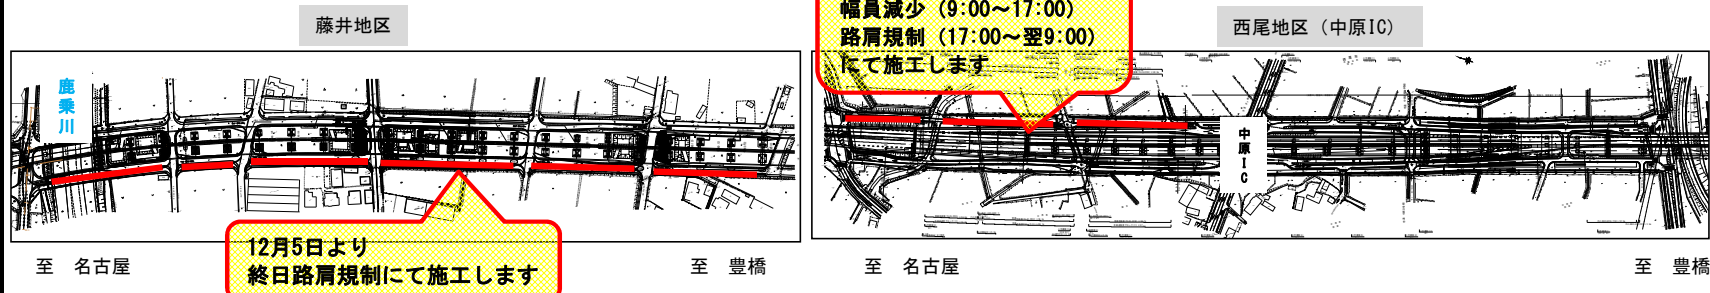

藤井地区

西尾地区(中原IC)

12月5日より幅員減少(9:00～17:00)路肩規制(17:00～翌9:00)にて施工します

12月5日より終日路肩規制にて施工します
