


### 孤立集落解消 ～ 宮前橋流失に伴う応急復旧工事を完了 ～



応急復旧工事(全景)

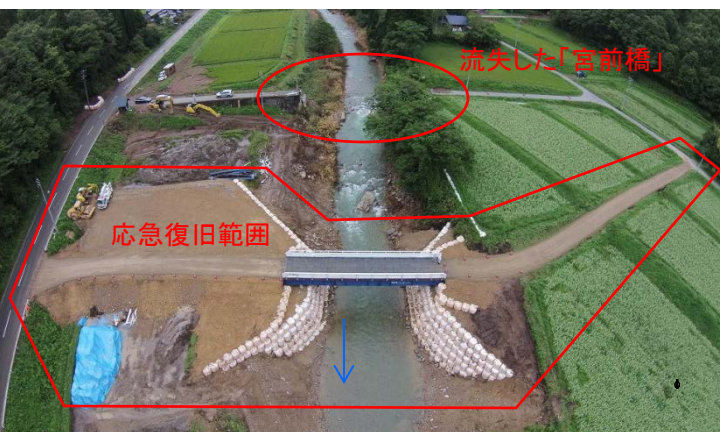

仮橋架設状況



開通前の高山市による検査



開通(8/27 9時22分)



地域の皆様と渡り初め

### 宮前橋流失に伴う仮橋架設



工事状況を説明



桁架設状況



覆工板設置状況



高山市基盤整備部長と現地打合せ



ガードレール設置状況



右岸取付部土工施工状況

# 中部地方整備局TEC—FORCE活動記録

岐阜県高山市(橋梁架設支援班)

平成26年8月25日  
第7報

宮前橋流失に伴う仮橋架設のための盛土工・敷均し転圧、護岸、土嚢積み及び仮橋受台設置



施工状況(上流→下流)



土嚢積み施工状況(右岸側)



施工業者と打合せ状況



左岸仮橋受台型枠設置状況



転圧施工状況



右岸仮橋受台コンクリート打設状況

# 中部地方整備局TEC—FORCE活動記録

岐阜県高山市(橋梁架設支援班)

平成26年8月24日  
第6報

宮前橋流失に伴う仮橋架設のための盛土工・護岸及び橋台受け台となる土嚢積み进行を前日より继续して工事を实施



高山市と施工業者を交え施工指導



土嚢積み及び盛土工施工指導



土嚢積み施工確認状況



盛土工用土砂搬入状況



照明車を使用し盛土工施工状況



照明車を使用し両岸の土嚢土工施工状況

# 中部地方整備局TEC—FORCE活動記録

岐阜県高山市(橋梁架設支援班)

平成26年8月23日  
第5報

岐阜県高山市清見町巢野俣地内で流失した宮前橋の仮橋を架設するため、前日より工事を継続



盛土施工状況



盛土施工への指導



高山市部長と現場内で打合



対岸用 1t土嚢 準備



対岸土工着手

# 中部地方整備局TEC-FORCE活動記録

岐阜県高山市(橋梁架設支援班)

平成26年8月22日  
第4報

岐阜県高山市清見町巢野俣地内で流失した宮前橋の仮橋を架設するため、本日より工事を開始



盛土施工状況



流出橋梁撤去状況



盛土施工への指導



工事状況を説明

岐阜県高山市清見町巢野俣地内で流失した宮前橋の仮設橋を架設するための「仮橋調査検討報告書」を高山市へ提出



田中隊長から國島高山市長へ報告書の受け渡し



報告書の内容について高山市へ説明



國島市長から「僅かな時間で対応いただき感謝します」との言葉をいただきました

# 中部地方整備局TEC—FORCE活動記録

平成26年8月20日  
第2報

岐阜県高山市清見町巢野俣地内において、TEC-FORCE隊員5名により、豪雨により落橋した宮前橋の被災状況調査の継続及び仮橋設置箇所調査の実施



被災地空撮写真



TEC—FORCE隊員による仮橋設置位置の確認調査



TEC—FORCE隊員による落橋した宮前橋上部工の調査状況(写真左)及び仮橋設置のための測量作業(写真右)



高山土木事務所にて仮橋設置の事前協議

# 中部地方整備局TEC-FORCE活動記録

平成26年8月19日  
第1報

岐阜県高山市清見町において、TEC-FORCE隊員5名により豪雨により流出した宮前橋と河渡橋の被災状況調査を実施



清見町巢野俣地内 (市)巢野俣1号線 宮前橋にて  
TEC-FORCE隊員による被災状況調査



清見町福寄地内 (市)福寄1号線 河渡橋にて  
TEC-FORCE隊員による被災状況調査



高山市にて事前打合
