


# 工事進捗

# 7月期

新丸山ダム工事事務所 平成27年度

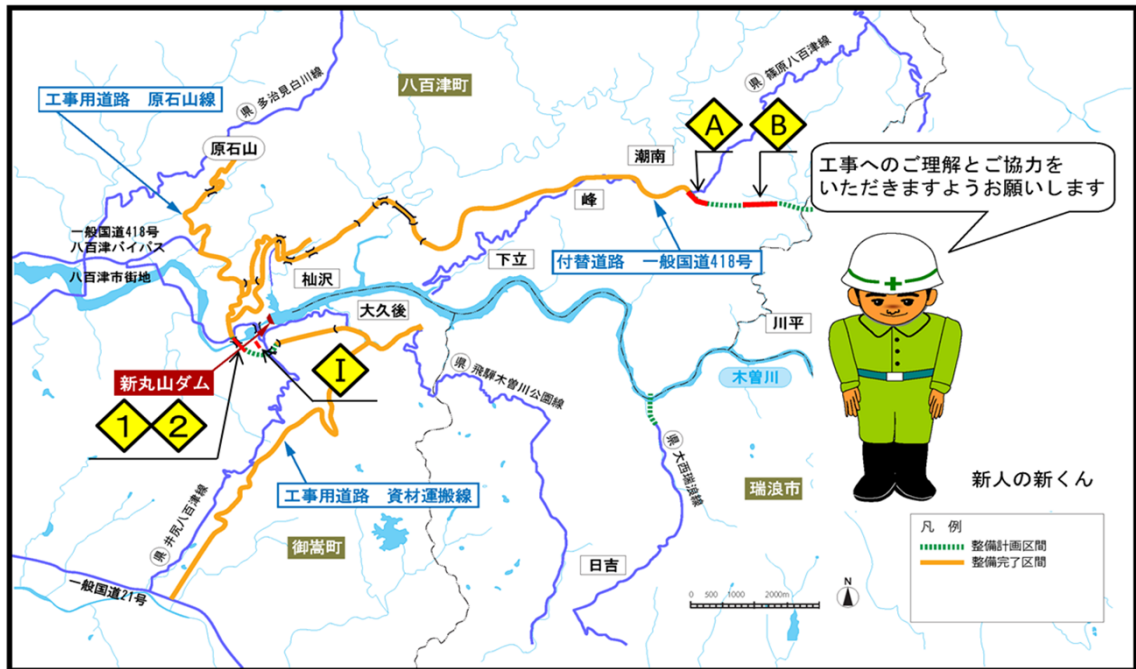

## I

平成27年6月末時点

業者名	(株) 栗山組
工事名	平成26年度 新丸山ダム転流工進入路工事
工事期間	平成27年2月 4日～平成27年7月30日
工事内容	ダム工事に必要な転流工(仮排水路)を整備するための工事用道路を造ります。
7月の作業内容	いつもお世話になります。7月は先月に引き続き、沢の水を処理する施工を行います。作業に伴い、大型車両が1日当り、10台から30台程度通行しますが、安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 若尾 茂晃 0574-43-1765
進捗率	





着工前



6月末

# 1

平成27年6月末時点

業 者 名	北川工務（株）
工 事 名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋下部工事
工事期間	平成26年10月18日～平成27年 9月30日 ※ 工期末が変更されました
工事内容	(仮称)新小和沢橋の左岸側の下部工(A1橋台、P1橋脚)及び擁壁工等を造ります。
7月の作業内容	今月は、引き続きP1橋脚の深礎工掘削及びA1橋台と大久後トンネル付近にて擁壁の施工を予定しています。 なお、工事に伴う騒音、振動及び工事用車両の安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 井戸 0574-25-2323
進捗率	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>着工前</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>5月末</p> </div> </div>	

# 2

平成27年6月末時点

業 者 名	(株)IHIインフラ建設
工 事 名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋PC上部工事
工事期間	平成27年 3月12日～平成28年 9月30日
工事内容	(仮称)新小和沢橋の上部工(橋桁)を架設します。
7月の作業内容	7月より、右岸側P2橋脚の足場の組立完了後、鉄筋組立、型枠組立及びコンクリートの打設を行います。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 河合 0574-43-4650
進捗率	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>完成イメージ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>右岸側P2橋脚</p> </div> </div>	

# A

平成27年6月末時点

業 者 名	青協建設（株）
工 事 名	平成26年度 新丸山ダム国道418号6号橋下部工事
工事期間	平成27年1月27日～平成27年9月29日
工事内容	付け替え国道418号線6号橋のA1橋台1基、P1橋脚1基、工事用道路
7月の作業内容	7月6日より、約一ヶ月間の予定でA1橋台の深礎工（基礎工）を施工します。工事用道路は、土工事を行い、また7月末から残りの立木伐採、搬出を行います。工事車両の安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 川村 0574-42-1021
進捗率	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>着工前</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>6月末</p> </div> </div>	

# B

平成27年6月末時点

	セントラル建設（株）
工 事 名	平成26年度 新丸山ダム国道418号潮見地区改良工事
工事期間	平成27年2月 7日～平成27年8月28日
工事内容	八百津町潮見地区において、付け替え国道418号道路工事(土工、擁壁等)を行います。
7月の作業内容	引き続き、土工事と排水構造物工事を行います。工事用車両の通行が多くなりますが、安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 西尾 0574-42-2001
進捗率	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>着工前</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>6月末</p> </div> </div>	
