


工事進捗

8月期

新丸山ダム工事事務所 平成27年度

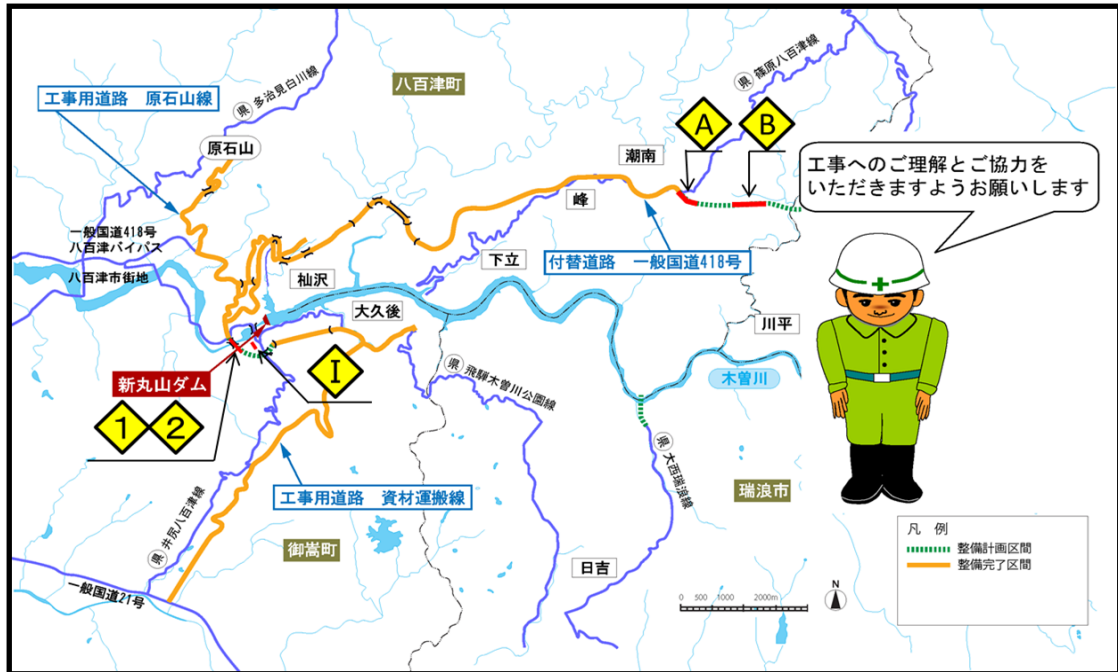

I

平成27年7月末時点

業者名	(株) 栗山組
工事名	平成26年度 新丸山ダム転流工進入路工事
工事期間	平成27年2月 4日～平成27年11月30日 ※ 工期末が変更されました
工事内容	ダム工事に必要な転流工（仮排水路）を整備するための工事用道路を造ります。
8月の作業内容	いつもお世話になります。8月は掘削工と盛土工の施工を予定しています。工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 若尾 茂晃 0574-43-1765
進捗率	



着工前



7月末

1

平成27年7月末時点

業者名	北川工務(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋下部工事
工事期間	平成26年10月18日～平成27年 9月30日
工事内容	(仮称)新小和沢橋の左岸側の下部工(A1橋台、P1橋脚)及び擁壁工等を造ります。
8月の作業内容	引き続きP1橋脚の深礎工及びA1橋台と大久後トンネル付近にて擁壁の施工を予定しています。 なお、工事に伴う騒音、振動及び工事用車両の安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 井戸 0574-25-2323
進捗率	



着工前



7月末

2

着工前

平成27年7月末時点

業者名	(株)IHIインフラ建設
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋PC上部工事
工事期間	平成27年 3月12日～平成28年 9月30日
工事内容	(仮称)新小和沢橋の上部工(橋桁)を架設します。
8月の作業内容	右岸側P2橋脚頭部の鉄筋組立、型枠組立及びコンクリートの施工を行います。 橋脚完了後、PC片持箱桁製作工の支保工組立工事を行います。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 河合 0574-43-4650
進捗率	



完成イメージ



右岸側P2橋脚

A

平成27年7月末時点

業者名	青協建設(株)																						
工事名	平成26年度 新丸山ダム国道418号6号橋下部工事																						
工事期間	平成27年1月27日～平成27年9月29日																						
工事内容	国道418号線6号橋のA1橋台1基、P1橋脚1基、P1橋脚施工の為の工事用道路を造ります。																						
8月の作業内容	A1橋台の深礎工を中旬に完了させ、引き続き鉄筋組立、コンクリート打設を行っていきます。P1橋脚を施工するための工事用道路は暗渠排水を行いながら盛土、土砂運搬を行います。工事用車両の通行が多くなりますが、安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願いします。																						
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 川村 0574-42-1021																						
進捗率	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>0</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="background-color: #0070C0; height: 20px;"></td> <td></td> </tr> </table>	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100											
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100													



着工前



7月末

B

平成27年7月末時点

業者名	セントラル建設(株)																						
工事名	平成26年度 新丸山ダム国道418号潮見地区改良工事																						
工事期間	平成27年2月 7日～平成27年8月28日																						
工事内容	八百津町潮見地区において、付け替え国道418号道路工事(土工、擁壁等)を行います。																						
8月の作業内容	引き続き、土工事・擁壁工事・排水構造物工事を行います。 町道村木谷線の舗装補修を行うことになり、工事用車両の通行が多くなりますが、安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。																						
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 西尾 0574-42-2001																						
進捗率	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>0</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="background-color: #0070C0; height: 20px;"></td> <td></td> </tr> </table>	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100											
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100													



着工前



7月末
