


工事進捗

9月期

新丸山ダム工事事務所 平成27年度

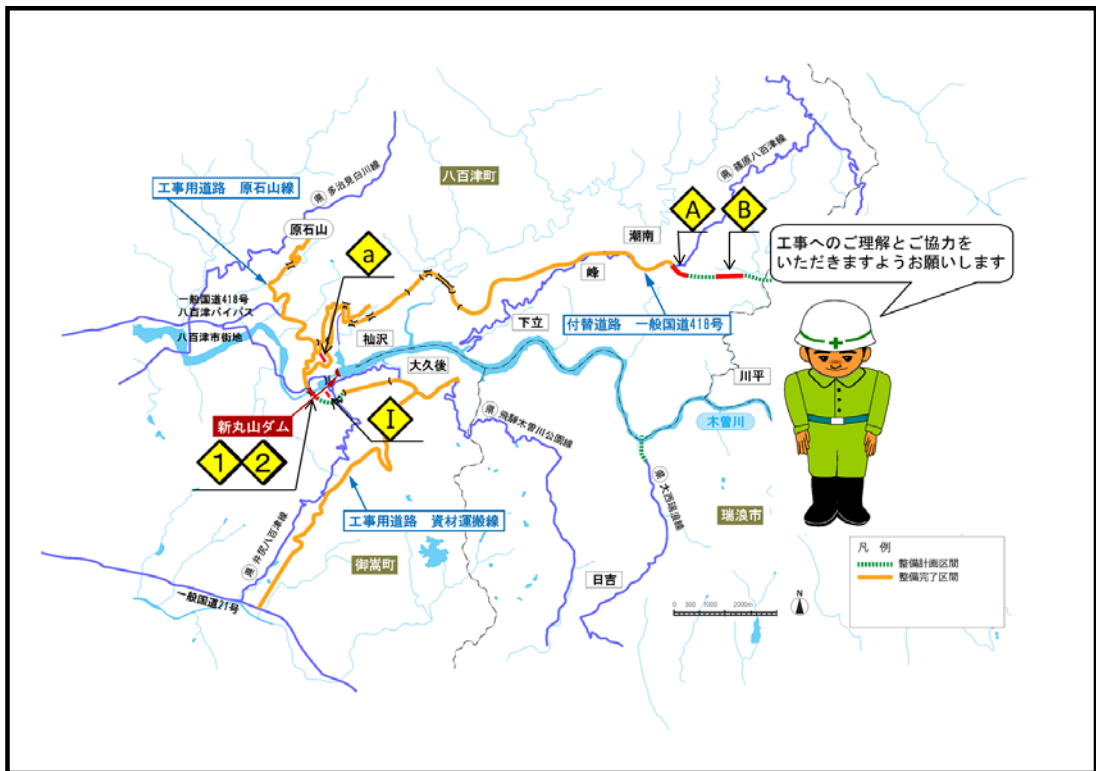

I

平成27年8月末時点

業者名	(株) 栗山組
工事名	平成26年度 新丸山ダム転流工進入路工事
工事期間	平成27年2月 4日～平成27年11月30日
工事内容	ダム工事に必要な転流工（仮排水路）を整備するための工事用道路を造ります。
9月の作業内容	9月は盛土工の施工を予定しています。 作業に伴い、大型車両が1日当り50台程度通行しますが、安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 若尾 0574-43-1765
進捗率	





着工前



8月末




1

平成27年8月末時点

業者名	北川工務(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋下部工事
工事期間	平成26年10月18日～平成27年 9月30日 ※ 工期末が延期される予定です。
工事内容	(仮称)新小和沢橋の左岸側の下部工(A1橋台、P1橋脚)及び擁壁工等を造ります。
9月の作業内容	9月は、引き続きP1橋脚の深礎工及び擁壁工の施工を予定しています。 なお、工事に伴う騒音、振動及び工事用車両の安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 井戸 0574-25-2323
進捗率	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>着工前</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>8月末</p> </div> </div>	

2

平成27年8月末時点

業者名	(株)IHIインフラ建設
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋PC上部工事
工事期間	平成27年 3月12日～平成28年 9月30日
工事内容	(仮称)新小和沢橋の上部工(橋桁)を架設します。
9月の作業内容	8月末に右岸側P2橋脚の施工が完了しました。 9月より、PC片持箱桁製作工の型枠支保工、鉄筋組立工事を行います。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 河合 0574-43-4650
進捗率	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>完成イメージ</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>生コン打設状況(上流側より撮影)</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>左岸側より撮影</p>  <p>右岸側P2橋脚</p> </div> </div>	

A

平成27年8月末時点

業者名	青協建設(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム国道418号6号橋下部工事
工事期間	平成27年1月27日～平成27年9月29日 ※ 工期末が延期される予定です。
工事内容	国道418号線6号橋のA1橋台1基、P1橋脚1基、P1橋脚施工の為に工事用道路を造ります。
9月の作業内容	9月は、A1橋台の深礎工の生コン打設と橋台の足場組立、鉄筋組立、型枠・支保工を行います。また、工事用道路の土工・排水工を行います。多くの資材運搬車両が付替国道418号を通過しますが、安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 川村 0574-42-1021
進捗率	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100%; border-bottom: 1px solid black; position: relative;"> 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 </div> <div style="width: 20%; background-color: blue; height: 15px; margin-left: 5px;"></div> </div>



着工前



8月末

B

平成27年8月末時点

業者名	セントラル建設(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム国道418号潮見地区改良工事
工事期間	平成27年2月7日～平成28年3月11日 ※ 工期末が変更されました
工事内容	付け替え国道418号道路工事(土工、擁壁等)を行います。
9月の作業内容	引き続き、土工、擁壁工事及び排水構造物工事を行います。 現場付近は、大型工事用車両の通行が多くなりますが、安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 西尾 0574-42-2001
進捗率	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100%; border-bottom: 1px solid black; position: relative;"> 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 </div> <div style="width: 50%; background-color: blue; height: 15px; margin-left: 5px;"></div> </div>



着工前



8月末

a

平成27年8月末時点

業 者 名	曙開発（株）																						
工 事 名	平成27年度 新丸山ダム管理所敷地造成工事																						
工事期間	平成27年7月29日～平成28年2月25日																						
工事内容	新丸山ダム管理所の敷地造成工事を行います。																						
9月の作業内容	資機材の手配、看板の設置、測量及び除草等、工事をするための準備作業を行います。 事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。																						
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 今井 ※電話番号は決まり次第お知らせします。																						
進捗率	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td colspan="11" style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100											
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100													



着工前

未着手

8月末
