


工事進捗 10月期

新丸山ダム工事事務所 平成27年度

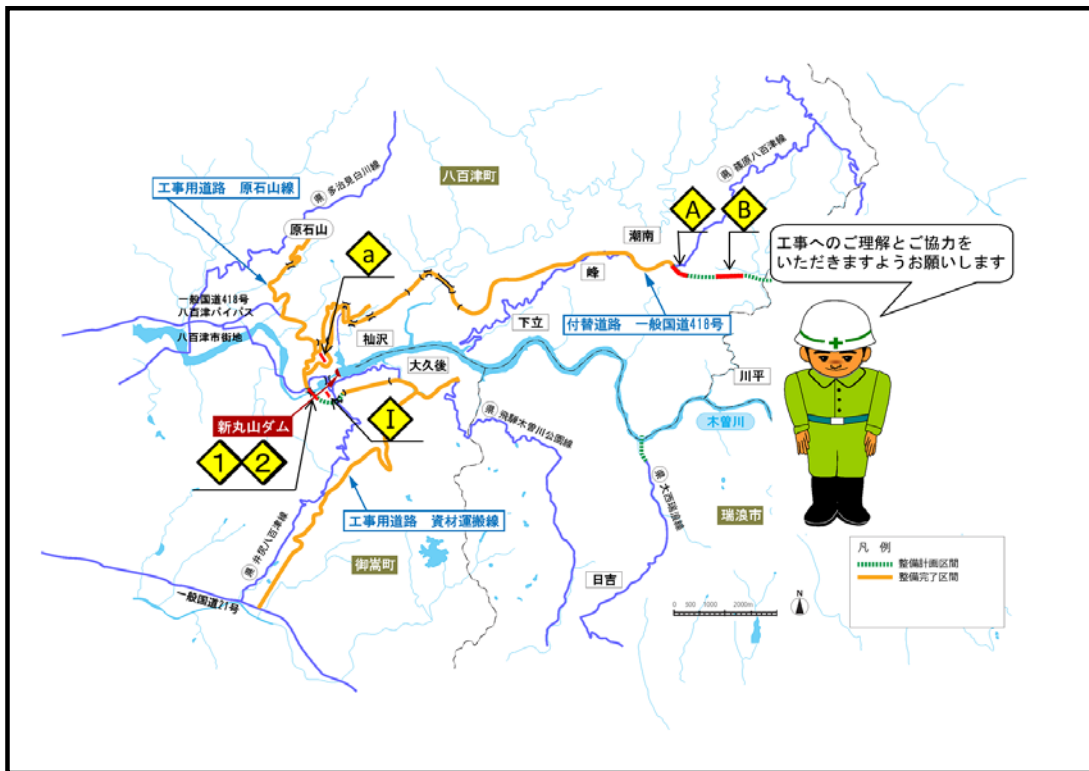

I

平成27年9月末時点

業者名	(株) 栗山組
工事名	平成26年度 新丸山ダム転流工進入路工事
工事期間	平成27年2月 4日～平成27年11月30日
工事内容	ダム工事に必要な転流工（仮排水路）を整備するための工事用道路を作ります。
10月の作業内容	引き続き盛土工の施工を予定しています。 作業に伴い、大型車両が1日当り50台程度通行しますが、安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 山添 雅之 0574-43-1765
進捗率	



着工前



9月末

1

平成27年9月末時点

業者名	北川工務(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋下部工事
工事期間	平成26年10月18日～平成27年12月28日 ※ 工期末が変更されました
工事内容	(仮称)新小和沢橋の左岸側の下部工(A1橋台、P1橋脚)及び擁壁工等を造ります。
10月の作業内容	引き続き、P1橋脚及び擁壁工の施工を予定しています。 なお、工事に伴う騒音、振動及び工事用車両の安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 井戸 0574-25-2323
進捗率	



着工前



9月末

2

平成27年9月末時点

業者名	(株)IHIインフラ建設
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋PC上部工事
工事期間	平成27年 3月12日～平成28年 9月30日
工事内容	(仮称)新小和沢橋の上部工(橋桁)を架設します。
10月の作業内容	引き続き、PC片持箱桁製作工の柱頭部部分(橋脚上の長さ12m部分)の型枠支保工、鉄筋組立及び生コンクリート打設工事を予定しています。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 河合 0574-43-4650
進捗率	



完成イメージ

上流側より撮影



左岸側より撮影



右岸側P2橋脚

A

平成27年9月末時点

業者名	青協建設(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム国道418号6号橋下部工事
工事期間	平成27年1月27日～平成28年2月26日 ※ 工期末が変更されました
工事内容	国道418号線6号橋のA1橋台1基、P1橋脚1基、工事用道路
10月の作業内容	A1橋台のフーチングの生コン打設を初旬に行い、引き続き橋台の足場組立、鉄筋組立、型枠・支保工の施工を予定しています。工事用道路は、排水工を施工する予定です。またP1橋脚は、初旬から掘削を始める予定です。工事車両の通行が多くなりますが、安全運行に注意してまいりますので、ご理解の程、よろしくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 川村 0574-42-1021
進捗率	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100%; border-bottom: 1px solid black; position: relative;"> 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 <div style="background-color: blue; width: 30%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> </div> </div>



着工前



9月末

B

平成27年9月末時点

業者名	セントラル建設(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム国道418号潮見地区改良工事
工事期間	平成27年2月 7日～平成28年3月11日
工事内容	八百津町潮見地区において、付け替え国道418号道路工事(土工、擁壁等)を行います。
10月の作業内容	引き続き、土工・擁壁工・排水構造物工の施工を予定しています。現場付近は、大型工事用車両の通行が多くなりますが、安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 西尾 0574-42-2001
進捗率	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100%; border-bottom: 1px solid black; position: relative;"> 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 <div style="background-color: blue; width: 70%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> </div> </div>




着工前



9月末

a

平成27年9月末時点

業者名	曙開発(株)											
工事名	平成27年度 新丸山ダム管理所敷地造成工事											
工事期間	平成27年7月29日～平成28年2月25日											
工事内容	新丸山ダム管理所の敷地造成工事を行います。											
10月の作業内容	引き続き、看板設置、測量、資機材の手配、除草及び立木伐採等、工事を施工するための準備作業を予定しています。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。											
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 今井 一成 TEL:0574-43-2332											
進捗率	 <table border="1"><tr><td>0</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td></tr></table>	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		



着工前



9月末
