

工事進捗 12月

新丸山ダム工事事務所 平成27年度



I

平成27年11月末時点

業者名	(株) 栗山組
工事名	平成26年度 新丸山ダム転流工進入路工事
工事期間	平成27年2月 4日～平成28年 2月 1日
工事内容	①ダム工事に必要な転流工(仮排水路)を整備するための工事用道路を作ります。 ②町道上之河南森線の先線(未供用区間)の道路改良工事を行います。
12月の作業内容	法面工と舗装工(①)、防護柵工と舗装工(②)の施工を予定しています。 作業に伴い、大型車両が通行しますが、安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 山添 雅之 0574-43-1765
進捗率	



着工前



11月末

1

平成27年11月末時点

業者名	北川工務(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋下部工事
工事期間	平成26年10月18日～平成27年 12月28日 ※ 工期末が延期される予定です。
工事内容	(仮称)新小和沢橋の左岸側の下部工(A1橋台、P1橋脚)及び擁壁工等を造ります。
12月の作業内容	引き続きP1橋脚及び擁壁工の施工を予定しています。 なお、工事に伴う騒音、振動及び工事用車両の安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 井戸 0574-25-2323
進捗率	



着工前



11月末

2

平成27年11月末時点

業者名	(株)IHインフラ建設
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋PC上部工事
工事期間	平成27年 3月12日～平成28年 9月30日
工事内容	(仮称)新小和沢橋の上部工(橋桁)を架設します。
12月の作業内容	PC片持箱桁製作工の柱頭部部分(橋脚上の長さ12m部分)の完成に伴い、張出架設(主桁製作用)の移動作業車の組立作業を行います。 。工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 河合 0574-43-4650
進捗率	



完成イメージ

上流側より撮影



右岸側P2橋脚


左岸側より撮影



3

平成27年11月末時点

業者名	(株)安部日鋼工業
工事名	平成27年度 新丸山ダム井尻八百津線第2小和沢橋PC上部工事
工事期間	平成27年10月22日～平成28年10月14日
工事内容	(仮称)第2小和沢橋の上部工(橋桁)を架設します。
12月の作業内容	現場ヤードの整備、足場の組立作業を行う予定です。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所(12月中に設置予定) 現場代理人 渡邊 058-271-2642
進捗率	

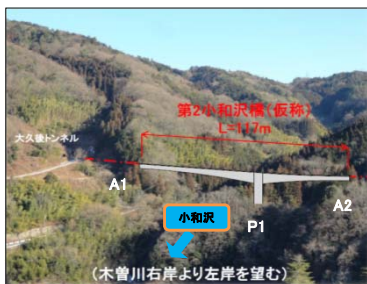

完成イメージ



11月末(着工前)

A

平成27年11月末時点

業者名	青協建設(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム国道418号6号橋下部工事
工事期間	平成27年1月27日～平成28年2月26日
工事内容	国道418号線6号橋のA1橋台1基、P1橋脚1基、工事用道路1式
12月の作業内容	A1橋台は足場解体・埋戻し、P1橋脚は最終の生コン打設、工事用道路は縦溝を施工します。安全に施工してまいりますので理解の程宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 0575-42-1021 現場代理人 川村 雄二
進捗率	



着工前



11月末

B

平成27年11月末時点

業者名	セントラル建設(株)	
工事名	平成26年度 新丸山ダム国道418号潮見地区改良工事	
工事期間	平成27年2月7日～平成28年3月11日	
工事内容	八百津町潮見地区において、付け替え国道418号道路工事(土工、擁壁等)を行います。	
12月の作業内容	引き続き、土工事・排水構造物工事を行います。 現場付近は、大型工事用車両の通行がありますが、安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。	
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 西尾 0574-42-2001	
進捗率		
	<p style="text-align: center;">着工前</p>	<p style="text-align: center;">11月末</p>

a

平成27年11月末時点

業者名	曙開発(株)	
工事名	平成27年度 新丸山ダム管理所敷地造成工事	
工事期間	平成27年7月29日～平成28年2月25日	
工事内容	新丸山ダム管理所の敷地造成工事を行います。	
12月の作業内容	土砂の運搬作業を行っています。現場の出入口にダンプの泥落とし機等を設置しました。引き続き、土砂の運搬と擁壁の掘削を行う予定です。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。	
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 今井 一成 TEL:0574-43-2332	
進捗率		
	<p style="text-align: center;">着工前</p>	<p style="text-align: center;">11月末</p>
