

工事進捗

3月期

新丸山ダム工事事務所 平成27年度



I

平成28年2月末時点

業者名	(株) 栗山組
工事名	平成26年度 新丸山ダム転流工進入路工事
工事期間	平成27年2月 4日～平成28年 3月28日 ※ 工期末が延期される予定です。
工事内容	①ダム工事に必要な転流工（仮排水路）を整備するための工事用道路を作ります。 ②町道上之洞南森線の先線（未供用区間）の道路改良工事を行います。
3月の作業内容	①②において、法面工・舗装工・防護柵工の施工を予定しています。 作業に伴い、大型車両が通行しますが、安全運行に注意してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 山添 雅之 0574-43-1765
進捗率	



着工前




2月末

1

完成

平成28年2月末時点

業者名	北川工務(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋下部工事
工事期間	平成26年10月18日～平成28年 2月22日
工事内容	①(仮称)新小和沢橋の左岸側の下部工(A1橋台、P1橋脚) ②大久後トンネル付近の擁壁工
工事完成の御礼	作業中は、皆様方には何かとご不便をおかけしましたが、この度、工事を無事故、無災害で完成することが出来ました。 皆様方のご協力に感謝を申し上げ、挨拶とさせていただきます。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 井戸 0574-25-2323
進捗率	



2工区




1工区

2月末

2

平成28年2月末時点

業者名	(株)IHインフラ建設
工事名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋PC上部工事
工事期間	平成27年 3月12日～平成28年 9月30日
工事内容	(仮称)新小和沢橋の上部工(橋桁)を架設します。
3月の作業内容	左岸側：P1橋脚柱頭部(鉄筋型枠生コン)の施工を行います。 右岸側：張出架設工法により、PC片持箱桁(4・57㍓)製作工の施工を行います。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 河合 0574-43-4650
進捗率	



完成イメージ



柱頭部施工状況




3㍓㍓施工状況

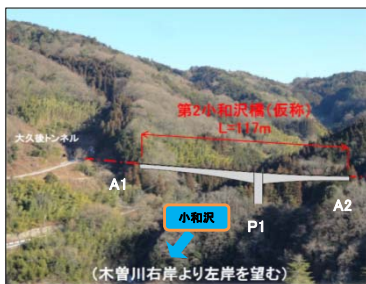
左岸側P1橋脚

右岸側P2橋脚

3

平成28年2月末時点

業者名	(株) 安部日鋼工業
工事名	平成27年度 新丸山ダム井尻八百津線第2小和沢橋PC上部工事
工事期間	平成27年10月22日～平成28年10月14日
工事内容	(仮称)第2小和沢橋の上部工(橋桁)を架設します。
3月の作業内容	タワークレーンの組立が終わり、柱頭部の施工(支保・型枠・鉄筋・PC組立・コンクリート打設)を行います。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 渡邊 健治 0574-43-0201
進捗率	



完成イメージ




2月末

A

完成

平成28年2月末時点

業者名	青協建設(株)
工事名	平成26年度 新丸山ダム国道418号6号橋下部工事
工事期間	平成27年1月27日～平成28年2月26日
工事内容	国道418号線6号橋のA1橋台1基、P1橋脚1基、工事用道路1式
工事完成の御礼	作業中は、皆様方には何かとご不便をおかけしましたが、この度、工事を無事故、無災害で完成することが出来ました。 皆様方のご協力に感謝を申し上げ、挨拶とさせていただきます。
問い合わせ先	現場事務所 0575-42-1021 現場代理人 川村 雄二
進捗率	





着工前



2月末



B

平成28年2月末時点

業者名	セントラル建設（株）
工事名	平成26年度 新丸山ダム国道418号潮見地区改良工事
工事期間	平成27年2月 7日～平成28年3月11日
工事内容	八百津町潮見地区において、付け替え国道418号道路工事(土工、擁壁等)を行います。
3月の作業内容	後片付けを行って完成です。工事期間中はご協力ありがとうございました。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 西尾 0574-42-2001
進捗率	<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 0102030405060708090100 </div> <div style="background-color: #4a86e8; width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>着工前</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>2月末</p>  </div> </div>	

a

平成28年2月末時点

業者名	曙開発（株）
工事名	平成27年度 新丸山ダム管理所敷地造成工事
工事期間	平成27年7月29日～平成28年5月26日
工事内容	新丸山ダム管理所の敷地造成工事を行います。
3月の作業内容	敷地下側の擁壁（現場制作L型擁壁）を完了しました。今後擁壁周りをを埋め戻して、敷地上のブロック積や側溝工事を行う予定です。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 今井 TEL：0574-43-2332
進捗率	<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 0102030405060708090100 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="background-color: #4a86e8; width: 60%; height: 20px;"></div> <div style="border-top: 1px dashed black; width: 40%; height: 20px; margin-left: 5px;"></div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>着工前</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>2月末</p>  </div> </div>	
