


工事進捗 5月期

新丸山ダム工事事務所 平成28年度

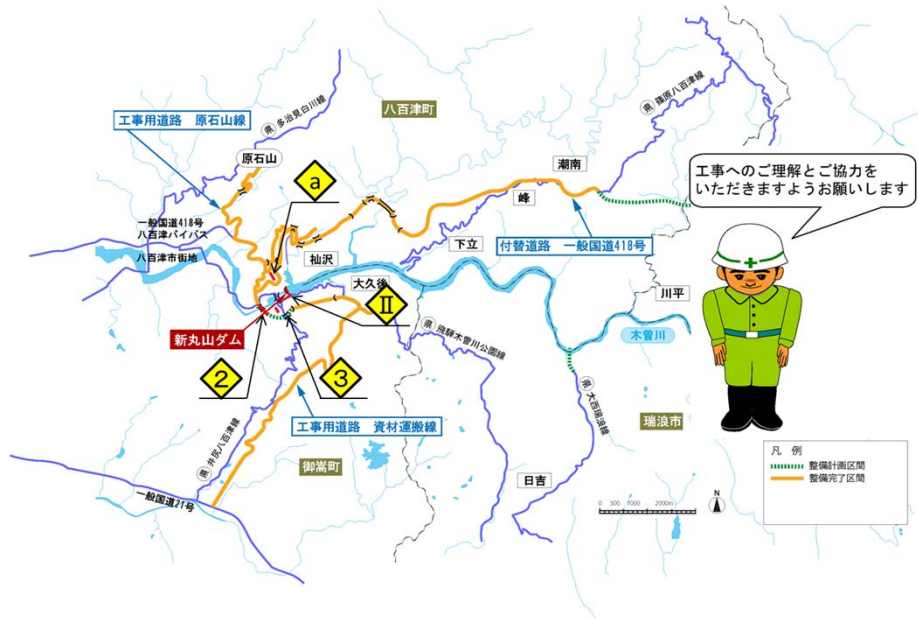

(仮称)新小和沢橋及び(仮称)第2小和沢橋は平成28年度末の完成を目標としています。

II

平成28年4月末時点

業者名	小池土木(株)
工事名	平成27年度 新丸山ダム転流工工事用道路工事
工事期間	平成28年2月11日～平成28年8月19日
工事内容	新丸山ダム建設に必要な転流工(仮排水路)を整備するための工事用道路を造ります。
5月の作業内容	伐採が完了しましたので土工事にかかっていきます。 1日40台程度、ダンプトラックにて土砂の運搬を行っていきます。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 肥田 0574-43-0050
進捗率	



着工前



4月末

土を盛ります

2

平成28年4月末時点

業 者 名	(株) IHI インフラ建設
工 事 名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋PC上部工事
工事期間	平成27年 3月12日～平成29年 3月 8日 ※ 工期末が変更されました
工事内容	(仮称)新小和沢橋の上部工(橋桁)を架設します。
5月の作業内容	左岸側：P1橋脚柱頭部（鉄筋型枠生コン）の施工を行います。 右岸側：張出架設工法により、PC片持箱桁(8・97 ㍉)製作工の施工を行います。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 河合 0574-43-4650
進捗率	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>左岸側P1橋脚</p> <p>左岸側 右岸側 木曾川 全景(上流側より撮影)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>柱頭部施工状況</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>右岸側P2橋脚</p> <p>87 ㍉施工状況</p> </div> </div>	

3

平成28年4月末時点

業 者 名	(株) 安部日鋼工業
工 事 名	平成27年度 新丸山ダム井尻八百津線第2小和沢橋PC上部工事
工事期間	平成27年10月22日～平成28年10月14日
工事内容	(仮称)第2小和沢橋の上部工(橋桁)を架設します。
5月の作業内容	柱頭部の施工が完了し、移動作業車の組立、張出し部の施工(型枠・鉄筋・PC・コンクリート)を行います。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 渡邊 健治 0574-43-0201
進捗率	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>第2小和沢橋(仮称) L=177m 小和沢 P1 A2 (木曾川右岸より左岸を望む)</p> <p>完成イメージ</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>大久保トンネル A1 P1 A2 小和沢 柱頭部完了</p> <p>4月末</p> </div> </div>	

a

平成28年4月末時点

業 者 名	曙開発(株)
工 事 名	平成27年度 新丸山ダム管理所敷地造成工事
工事期間	平成27年7月29日～平成28年6月30日 ※ 工期末が変更されました
工事内容	新丸山ダムを作る際に移転する管理所の敷地をつくる工事を行います。
5月の作業内容	工期が変更になりました。建物のできる、敷地上のブロック積や水路、公民館裏の階段等をつくっています。このあとフェンス、神社への道をつくる予定です。工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解と協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 今井 TEL:0574-43-2332
進捗率	
	
着工前	4月末
