


令和3年8月末 中津川出張所 工事進捗状況

①（落合川流域）		進 捗 率		②（中津川出張所管内）		進 捗 率		③（落合川流域）		進 捗 率		④（落合川流域）		進 捗 率	
工 事 名：令和2年度 木曽川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事		予定		工 事 名：令和3年度 中津川出張所整備工事		予定		工 事 名：令和2年度 木曽川水系 薬師沢第1砂防堰堤工事		予定		工 事 名：令和2年度 木曽川水系 本谷砂防堰堤改築工事		予定	
契 約 工 期：令和2年12月7日 ～ 令和3年11月30日 変更予定工期：令和3年12月28日		実施	70.9%	契 約 工 期：令和3年4月1日 ～ 令和3年11月30日		実施	24.6%	契 約 工 期：令和3年4月12日 ～ 令和4年1月31日		実施	54.4%	契 約 工 期：令和3年4月20日 ～ 令和4年3月30日		実施	
請負業者名：（株）鳴海組		差		請負業者名：（株）鳴海組		差		請負業者名：（株）吉川工務店		差		請負業者名：（株）鳴海組		差	
															
今月作業：コンクリート堰堤工（床堀り）、災害復旧 等				今月作業：本谷谷止め工、荒道谷・本谷工事用道路流出土砂撤去 等				今月作業：コンクリート副堰堤工、災害復旧 等				今月作業：砂防土工（右岸側坂路設置）、災害復旧 等			
来月予定：構造物撤去工（既設堰堤取壊し）等				来月予定：本谷工事用道路流出土砂撤去 等				来月予定：コンクリート副堰堤工 等				来月予定：流出土砂撤去、仮設水路撤去、工事用道路補修 等			
⑤（中津川流域）		進 捗 率		⑥（中津川流域）		進 捗 率		⑦（中津川流域）		進 捗 率		⑧（本川筋）		進 捗 率	
工 事 名：令和3年度 木曽川水系 下平次第8砂防堰堤改築工事		予定		工 事 名：令和3年度 木曽川水系 中津川第2護岸整備工事		予定		工 事 名：令和3年度 木曽川水系 川上流路工事		予定		工 事 名：令和3年度 木曽川水系 アクラ沢管理用道路工事		予定	
契 約 工 期：令和3年4月20日 ～ 令和4年3月25日		実施	21.1%	契 約 工 期：令和3年8月18日 ～ 令和4年2月28日		実施	0.5%	契 約 工 期：令和2年9月1日 ～ 令和4年2月28日		実施	0.0%	契 約 工 期：令和2年9月14日 ～ 令和4年2月28日		実施	0.0%
請負業者名：（株）加藤工務店		差		請負業者名：（株）加藤工務店		差		請負業者名：（株）中島工務店		差		請負業者名：（株）中島工務店		差	
															
今月作業：コンクリート堰堤本体工 等				今月作業：書類作成、準備工 等				今月作業：－				今月作業：－			
来月予定：コンクリート堰堤本体工 等				来月予定：仮設工 等				来月予定：書類作成、準備工 等				来月予定：書類作成、準備工 等			

※9／19に予定されていた中津川青年会議所主催の「みんなの防災減災フェスタ」は中止となった

工事着手前

令和3年8月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

①

工事名： 令和2年度
庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事

工期： 令和3年3月3日 ～ 令和3年9月30日

施工業者：(株)藤本組

進捗率： 実施 67.7%

砦山地区



②

工事名： 令和3年度
妻木出張所整備工事

工期： 令和3年4月1日 ～ 令和3年11月30日

施工業者：(株)藤本組

進捗率： 実施 48.5%

オリベ堰堤



富士下堰堤



《今月作業》【砦山地区】コンクリート堰堤工(垂直壁工)

《10月作業》【砦山地区】コンクリート堰堤工(垂直壁工、側壁工、水叩工)

《今月作業》オリベ堰堤 市之倉川流路

《10月作業》オリベ堰堤

③

工事名： 令和2年度
庄内川水系 一の洞第2砂防堰堤工事

工期： 令和3年4月5日 ～ 令和4年1月31日

施工業者：(株)吉川組

進捗率： 実施 29.8%



④

工事名： 令和3年度
庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事

工期： 令和3年5月28日 ～ 令和4年3月25日

施工業者：小池土木(株)

進捗率： 実施 8.1%

市之倉地区



《今月作業》砂防土工 コンクリート堰堤工

《10月作業》砂防土工 コンクリート堰堤工

《今月作業》鍛冶ヶ入地区：仮締切及び転流工
市之倉工区：仮締切及び転流工、砂防土工

《10月作業》鍛冶ヶ入地区：工事用道路、砂防土工
市之倉工区：構造物撤去工、コンクリート堰堤工

令和3年 8月末 上松出張所 工事進捗状況

①	令和2年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)	②	令和2年度 木曽川水系 下洞沢流路工事 施工業者 木曽土建工業(株)	③	令和2年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)	④	令和2年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 大宗土建(株)
	進捗率(予定工程) % 81.3		進捗率(予定工程) % 56.0		進捗率(予定工程) % 41.3		進捗率(予定工程) % 43.8
	R2.11.30～R3.11.30 週休2日		R3. 2. 8～R4. 3.22 週休2日		R3. 3.29～R4. 3.22 週休2日		R3. 4. 1～R3.10.22 週休2日
							
今月 作業	護岸流路工(3号～4号) 4号床固工	砂防土工、法面工、床固め工、流路護岸工、 砂防堰堤付属物設置工		構造物撤去工・コンクリート堰堤工		準備工	
来月 予定	4号床固工 4号側壁工 4号水叩工	砂防土工、法面工、床固め工、流路護岸工		コンクリート堰堤工		帯工・工事用道路	
⑤	令和2年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)	⑥	令和3年度 上松出張所整備工事 施工業者 大宗土建(株)	⑦	令和2年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株)	⑧	令和3年度 木曽川水系 桂川第1砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 大宗土建(株)
	進捗率(予定工程) % 27.5		進捗率(予定工程) % 126.0		進捗率(予定工程) % 21.6		進捗率(予定工程) % 8.4
	R3. 4. 1～R4. 1.31 週休2日		R3. 4. 1～R3.11.30 週休2日		R3. 4.28～R4. 1.31 週休2日		R3. 6. 10～R4. 3.25 週休2日
							
今月 作業	仮設工、コンクリート削孔・切断	十王沢町道(上松町)整備		法面工・鉄筋挿入工・工事用道路工		伐採工	
来月 予定	仮設工、コンクリート削孔・切断・取壊し	和合(南木曽町)整備 北股沢法面(上松町)仮復旧		法面工・鉄筋挿入工・工事用道路工		伐採工	

令和3年 8月末 上松出張所 工事進捗状況

	⑨	令和3年度 木曽川水系 宮の沢砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 奥田工業(株)			⑩	令和3年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曽土建工業(株)			⑪	施工業者			⑫	施工業者		
		進捗率(予定工程)		%		15.3	進捗率(予定工程)			%	1.4	進捗率(予定工程)		%		
		R3. 6.22～R4. 3.25		週休2日		R3. 8. 2～R4. 2.28		週休2日、ICT								
																
今月 作業	準備工(立木伐採)				掘削工及び土砂等運搬工											
来月 予定	準備工(立木伐採・運搬処分) 道路土工(掘削工)				掘削工及び土砂等運搬工											


	⑬	施工業者			⑭	施工業者			⑮	施工業者			⑯	施工業者		
		進捗率(予定工程)		%			進捗率(予定工程)			%		進捗率(予定工程)		%		
今月 作業																
来月 予定																

令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



19号(上) 52.20kp～52.10kp 道路除草工
工 期：令和02年10月30日～令和05年10月31日
施工業者：日本ハイウェイ・サービス(株)
施工箇所：R19 31.5kp～55.2kp
R21 3.0kp～22.0kp 可児御嵩BP

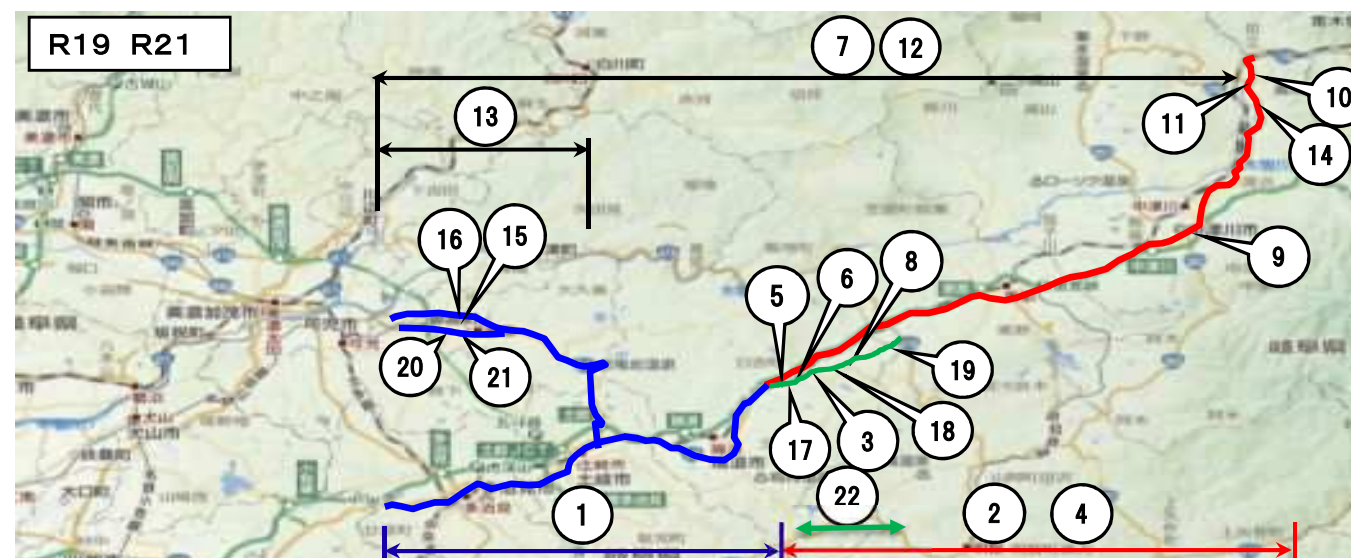

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号57.200kp(上) 路面清掃工(歩道清掃)
工 期：令和02年04月01日～令和04年10月31日
施工業者：(有)木曾ハイウェイサービス
施工箇所：R19 55.2kp～97.0kp

令和元年度瑞浪恵那道路公文垣地区道路建設工事

③



打ち切り
工 期：令和02年05月11日～令和03年07月2日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

完

令和2年度 多治見国道交通事故対策工事

④



恵那工区 標識工(標識移設)
工 期：令和02年07月01日～令和03年12月28日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市～中津川市地先

令和2年度 瑞浪恵那道路下沢地区下部工事

⑤



A2橋台 躯体施工 工事用道路 路体盛土・セ
工 期：令和02年09月03日～令和03年11月30日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

⑥



路体盛土、4号横断函渠工
工 期：令和02年09月04日～令和03年11月30日
施工業者：板垣建設(株)
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道通信設備工事

⑦



道路情報表示設備工
工 期：令和02年08月24日～令和03年08月31日
施工業者：松栄電子工業(株)
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

完

令和2年度瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事

⑧



(1工区)大型ブロック積工 (2工区)道路土工
工 期：令和02年10月23日～令和04年02月25日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道四ツ目川右岸耐震補強工事

⑨



準備工
工 期：令和02年10月14日～令和03年07月30日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：岐阜県中津川市中津川地先

完

令和2年度多治見国道整備工事

⑩



組立歩道工 防護柵工
工 期：令和02年10月17日～令和03年12月15日
施工業者：板垣建設(株)
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

令和2年度多治見国道車両計測設備修繕工事

⑪



センサ据付工・半たわみ舗装工・試運転調整工
工 期：令和02年12月22日～令和03年09月10日
施工業者：オムロンフィールドエンジニアリング(株)
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

完

令和2年度多治見国道橋梁補修工事

⑫



・橋梁支保工・橋梁付属物工・橋梁補修工・仮設工
工 期：令和03年03月22日～令和04年3月2日
施工業者：(株)梅田組
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道西部整備工事 ⑬  落石雪害防止工・土工 工 期：令和3年03月25日～令和4年3月29日 施工業者：(株)藤本組 施工箇所：土岐市泉～可児市中恵土地内	令和2年度多治見国道中津川地区整備工事 ⑭  補強地山土工・土工 工 期：令和02年03月29日～令和03年12月28日 施工業者：(株)加藤工務店 施工箇所：岐阜県中津川市山口地先	令和2年度多治見国道21号御嵩地区亜炭坑充填工事 ⑮  地下空洞充填工(削孔工) 工 期：令和02年03月29日～令和04年02月17日 施工業者：徳倉建設(株) 施工箇所：可児郡御嵩町地先	令和2年度多治見国道21号中地区亜炭坑充填工事 ⑯  充填孔設置工、充填到達観測孔設置工、充填プラント組立工 工 期：令和02年03月25日～令和04年02月25日 施工業者：飛鳥建設(株) 施工箇所：可児郡御嵩町地先	令和2年度瑞浪恵那道路公文垣内地区道路建設工事 ⑰  推進工、道路土工 工 期：令和03年05月10日～令和04年02月25日 施工業者：(株)吉川工務店 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先
令和2年度瑞浪恵那道路中切地区道路建設工事 ⑱  準備工(測量・試掘)・仮設工 工 期：令和03年05月10日～令和04年02月25日 施工業者：(株)鳴海組 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先	令和2年度瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事 ⑲  準備工(伐採) 道路土工(路体盛土、土砂運搬) 工 期：令和03年05月11日～令和04年03月18日 施工業者：恵中建設(株) 施工箇所：恵那市武並町地先	令和2年度可児御嵩バイパス古屋敷地区舗装工事 ⑳  防草シート撤去・仮区画線・表土すきとり 工 期：令和03年05月19日～令和04年02月10日 施工業者：(株)市川工務店 施工箇所：可児郡御嵩町地内	令和2年度可児御嵩バイパス御嵩地区舗装工事 ㉑  道路土工、構造物撤去工、区画線工 工 期：令和03年04月15日～令和04年02月10日 施工業者：大有建設(株) 施工箇所：可児郡御嵩町地内	令和3年度瑞浪恵那道路整備工事 ㉒  排水構造物工(芝原②工区) 工 期：令和03年05月28日～令和04年03月18日 施工業者：(株)中島工務店 施工箇所：瑞浪市土岐町鶴城～釜戸町地内
令和3年度 多治見国道電気通信設備整備工事 ㉓ 準備工 工 期：令和03年08月17日～令和03年12月28日 施工業者：松栄電子工業(株) 施工箇所：土岐市～中津川市一本松地先	令和3年度 多治見国道小里川橋耐震補強工事 ㉔ 準備工 工 期：令和03年09月13日～令和04年06月30日 施工業者：(株)吉川工務店 施工箇所：瑞浪市土岐町地先	令和3年度 多治見国道瑞浪地区歩道整備工事 ㉕ 準備工 工 期：令和03年09月13日～令和04年02月28日 施工業者：鳴海組 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先	令和3年度 多治見国道車両計測設備修繕工事 ㉖ 準備工 工 期：令和03年09月03日～令和04年02月28日 施工業者：オムロンフィールドエンジニアリング(株) 施工箇所：中津川市山口地先	
