

工事進捗状況 (令和6年1月末)

中津川出張所

①		②		③		④	
工事名	令和4年度 木曾川水系川上流路工事	工事名	令和4年度 木曾川水系アラクラ沢砂防堰堤工事	工事名	令和4年度 中津川出張所管内整備工事	工事名	令和4年度 木曾川水系本谷砂防堰堤改築工事
工期	当初 R4.9.1~R5.3.16 変更 R4.9.1~R5.7.31	工期	当初 R4.9.1~R5.3.16 変更 R3.9.1~R5.6.30	工期	当初 R4.12.14~R5.11.30 変更	工期	当初 R5.4.17~R6.2.29 変更 R5.4.17~R6.3.29
受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)鳴海組
進捗率	予定 100 実施 100 差 0.0	進捗率	予定 100 実施 100 差 0	進捗率	予定 - 実施 100.0 差 -	進捗率	予定 62.0 実施 62.0 差 0
今月作業	-	今月作業	-	今月作業	完成検査(12月8日)	今月作業	コンクリート堰堤床掘り、仮設モルタル吹付、鉄筋挿入、残土処理
来月作業	-	来月作業	-	来月作業	-	来月作業	コンクリート堰堤床掘り、仮設モルタル吹付、鉄筋挿入、残土処理



⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和4年度 木曾川水系和田沢砂防堰堤工事	工事名	令和5年度 木曾川水系地獄谷管理用道路工事	工事名	令和5年度 木曾川水系アラクラ沢砂防堰堤工事	工事名	令和5年度 木曾川水系荒道谷砂防堰堤改築工事
工期	当初 R5.4.28~R6.2.29 変更	工期	当初 R5.6.19~R6.3.15 変更	工期	当初 R5.7.26~R6.3.13 変更	工期	当初 R5.8.1~R6.3.8 変更
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)鳴海組
進捗率	予定 90.7 実施 81.2 差 -9.5	進捗率	予定 100 実施 100 差 0	進捗率	予定 82.6 実施 83.5 差 0.9	進捗率	予定 87.3 実施 84.4 差 -2.9
今月作業	コンクリート堰堤本体(D7'ロック1/5)、コンクリート側壁(12/12)、かご工(右岸側)	今月作業	後片付け、完成検査(12月26日)	今月作業	コンクリート堰堤本体(D7'ロック4/4、E7'ロック4/4)、垂直壁(1/3)	今月作業	コンクリート堰堤本体工(B7'ロック3/4、C7'ロック5/7、D7'ロック6/7、F7'ロック5/5)
来月作業	コンクリート堰堤本体(D7'ロック5/5)、かご工(右・左岸側)	来月作業	-	来月作業	床固め本体(A7'ロック4/4、B7'ロック4/4)、垂直壁(3/3)	来月作業	コンクリート堰堤本体工(B7'ロック4/4、C7'ロック7/7、D7'ロック7/7)、後片付け



工事進捗状況 (令和6年1月末)

中津川出張所

⑨		⑩		⑪			
工事名	令和5年度 木曾川水系中津川管内施設改築工事	工事名	令和5年度 木曾川水系新梨沢砂防堰堤工事	工事名	令和5年度 中津川出張所管内整備工事	工事名	
工期	当初 R5.8.1~R6.3.8 変更 R5.8.1~R6.6.20	工期	当初 R5.9.25~R6.3.13 変更 R5.9.25~R6.6.25	工期	当初 R5.12.1~R6.11.29 変更	工期	当初 変更
受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	(株)鳴海組	受注者名	
進捗率	予定 35.4 実施 37.6 差 2.2	進捗率	予定 26.8 実施 26.8 差 0.0	進捗率	予定 - 実施 3.5 差 -	進捗率	予定 実施 差
今月作業	【川上地区】仮締切撤去	今月作業	準備工、道路土工、伐採	今月作業	中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、大又沢雨量観測所伐採、馬籠雨量観測所伐採等	今月作業	
来月作業	【川上地区】仮締切撤去、河床整正	来月作業	準備工、道路土工、擁壁工(1号)	来月作業	中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、地獄谷土壌調査、冷川排水路整備、大玉石採取等	来月作業	
							
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更
受注金額	当初 変更	受注金額	当初 変更	受注金額	当初 変更	受注金額	当初 変更
進捗率	予定 実施 差	進捗率	予定 実施 差	進捗率	予定 実施 差	進捗率	予定 実施 差
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	

工事進捗状況 (令和6年1月末)

妻木出張所

①					②					③					④												
工事名	令和4年度 妻木出張所管内整備工事				工事名	令和4年度 富士下第2砂防堰堤改築工事				工事名	令和5年度 妻木管内砂防施設整備工事				工事名	令和5年度 寺下第3砂防堰堤改築工事											
工期	当初 R4.12.1~R5.11.30 変更				工期	当初 R5.4.3~R6.2.29 変更 R5.4.3~R6.3.25				工期	当初 R5.5.15~R6.3.15 変更				工期	当初 R5.8.1~R6.3.13 変更											
受注者名	(株) 藤本組				受注者名	(株) 藤本組				受注者名	(株) 吉川組				受注者名	(株) 藤本組											
進捗率%	予定	100	実施	100	差	0	進捗率%	予定	86.0	実施	88.4	差	2.4	進捗率%	予定	87.0	実施	85.7	差	-1.3	進捗率%	予定	89.1	実施	84.3	差	-4.8
今月作業	-				今月作業	法面補強工、排水構造物工、伐木工				今月作業	流路護岸工 ブロック積、床固め工(寺下富士)。仮設工 工事用道路撤去(鍛冶ヶ入)				今月作業	排水構造物工、法面工、舗装工、道路付属施設工											
来月作業	-				来月作業	砂防土工、道路土工、排水構造物工				来月作業	流路護岸工 ブロック積、床固め工(寺下富士)。仮設工 工事用道路撤去(鍛冶ヶ入)				来月作業	準備工											
工事完成										<p style="text-align: center;">鍛冶ヶ入地区</p>  <p style="text-align: center;">寺下富士地区</p> 																	
⑤					⑥					⑦					⑧												
工事名	令和5年度 妻木出張所管内整備工事				工事名					工事名					工事名												
工期	当初 R5.12.11~R6.11.29 変更				工期	当初 変更				工期	当初 変更				工期	当初 変更											
受注者名	(株) 藤本組				受注者名					受注者名					受注者名												
進捗率%	予定	7	実施	6.2	差	-0.8	進捗率%	予定		実施		差	0	進捗率%	予定		実施		差	0	進捗率%	予定		実施		差	0
今月作業	指示 1 【大平堰堤整備】				今月作業					今月作業					今月作業												
来月作業	指示 1 【生田川整備】				来月作業					来月作業					来月作業												
																											

工事進捗状況 (令和6年1月末)

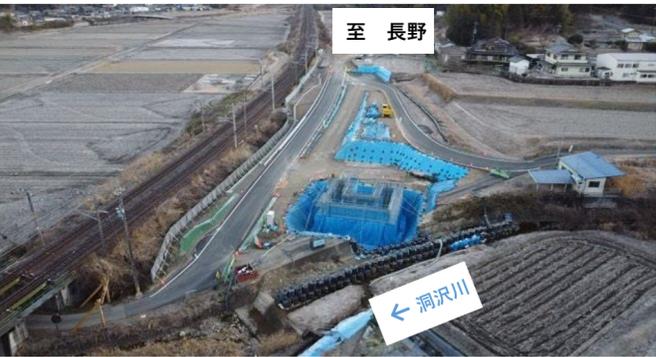
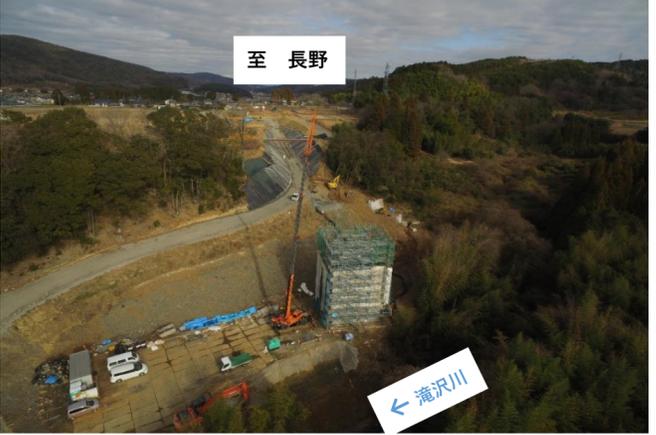
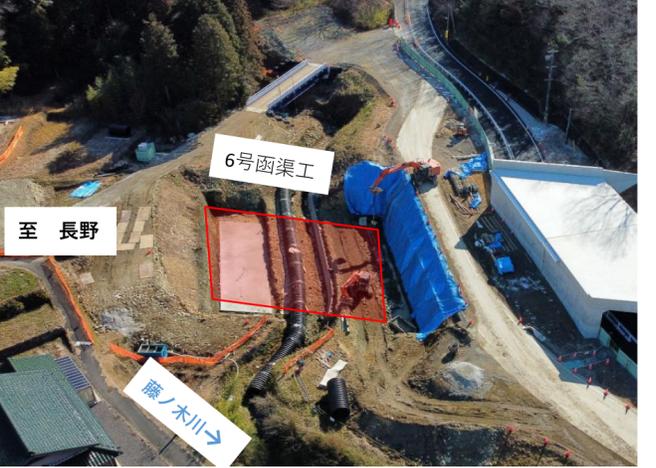
上松出張所

①				②				③				④															
工事名	令和4年度 多治見砂防電気通信設備工事			工事名	令和4年度 木曾川水系 桂川第1砂防堰堤工事			工事名	令和4年度 上松出張所管内整備工事			工事名	令和4年度 木曾川水系 宮の沢・下在蛇抜沢砂防設備工事														
工期	当初	R4.9.26~R5.2.28	変更	R5.10.6	工期	当初	R4.11.1~R6.1.31	変更	R5.2.29	工期	当初	R4.12.1~R5.11.30	変更	-	工期	当初	R5.4.3~R6.2.29	変更	R5.4.3~R6.3.21								
受注者名	朝日電気工業(株)			受注者名	大宗土建(株)			受注者名	大宗土建(株)			受注者名	奥田工業(株)														
進捗率	予定	-	実施	-	差	-	進捗率	予定	99.7	実施	99.6	差	-0.1	進捗率	予定	-	実施	100.0	差	-	進捗率	予定	92.6	実施	93.7	差	1.1
今月作業	-			今月作業	側溝工、後片付け			今月作業	-			今月作業	舗装工(アスファルト舗装工)														
来月作業	-			来月作業	路盤整正、後片付け			来月作業	-			来月作業	舗装工(アスファルト舗装工)、片付け														
																											
⑤				⑥				⑦				⑧															
工事名	令和4年度 木曾川水系 猿沢砂防施設整備工事			工事名	令和4年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂地工事			工事名	令和4年度 木曾川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事			工事名	令和5年度 木曾川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事														
工期	当初	R5.4.3~R6.1.31	変更	R6.3.29	工期	当初	R5.4.3~R6.2.29	変更	-	工期	当初	R5.4.28~R6.2.29	変更	-	工期	当初	R5.5.16~R6.3.15	変更	-								
受注者名	奥田工業(株)			受注者名	大宗土建(株)			受注者名	木曾土建工業(株)			受注者名	奥田工業(株)														
進捗率	予定	82.2	実施	95.5	差	13.3	進捗率	予定	100.0	実施	100.0	差	0.0	進捗率	予定	97.5	実施	99.5	差	2.0	進捗率	予定	93.4	実施	91.6	差	-1.8
今月作業	強靱ワイヤーネット工			今月作業	片付け			今月作業	無し			今月作業	コンクリート堰堤工(脱枠、仕上げ)、仮設工(上流掘削)														
来月作業	強靱ワイヤーネット工			来月作業	2月9日完成検査予定			来月作業	無し			来月作業	仮設工(上流掘削、大型土のう)														
																											



工事進捗状況 (令和6年 1月末)

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①		②		③		④	
工事名	令和3年度 瑞浪恵那道路 中切道路建設工 <b>完成</b>	工事名	令和3年度 瑞浪恵那道路 中畑道路建設工 <b>完成</b>	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 上平地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 芝原地区下部工事
工期	当初 R4. 3. 31~R5. 3. 24 変更 R5. 8. 30	工期	当初 R4. 4. 1~R5. 2. 28 変更 R5. 11. 15	工期	当初 R4. 9. 9~R6. 2. 29 変更 R6. 6. 28	工期	当初 R4. 10. 3~R6. 2. 29 変更 R6. 3. 29
受注者名	(株) 中島工務店	受注者名	(株) 中島工務店	受注者名	(株) 中島工務店	受注者名	(株) 吉川組
今月作業		今月作業		今月作業	擁壁工、仮設工、地盤改良工、準備工	今月作業	道路土工、橋台工
来月作業		来月作業		来月作業	道路土工、排水構造物工、土留め工、仮設工	来月作業	道路土工、排水構造物工、法覆護岸工
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 上切道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 名滝地区下部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 名滝地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 宿地区道路建設工事
工期	当初 R5. 1. 16~R6. 2. 29 変更 R6. 3. 29	工期	当初 R5. 4. 14~R5. 9. 29 変更 ~R6. 3. 22	工期	当初 R5. 4. 28~R6. 2. 29 変更 R6. 3. 29	工期	当初 R4. 12. 6~R6. 2. 29 変更 R6. 3. 29
受注者名	(株) 加藤工務店	受注者名	板垣建設(株)	受注者名	(株) 鳴海組	受注者名	(株) 吉川工務店
今月作業	護岸工(仮設工)・6号函渠工(中層混合処理)	今月作業	橋台工・法尻排水工・放流工	今月作業	仮設工(鋼管杭圧入) 排水構造物工	今月作業	カルバート工
来月作業	重力式擁壁・6号函渠工	来月作業	橋台工・法尻排水工・放流工	来月作業	排水構造物工	来月作業	カルバート工
							

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪4号橋鋼上部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪3号橋鋼上部工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 恵那地区道路建設工事
工期	当初 R4.9.9~R6.2.29 変更	工期	当初 R4.9.27~R7.2.28 変更	工期	当初 R5.3.16~R7.2.28 変更	工期	当初 R5.7.7~R6.1.31 変更 R5.7.7~R6.3.29
受注者名	宇野重工(株)	受注者名	瀧上工業(株)	受注者名	(株)北都鉄工	受注者名	恵中建設(株)
今月作業	現場塗装工、作業ヤード整備工	今月作業	工場製作	今月作業	工場製作	今月作業	地盤改良工
来月作業	現場塗装工	来月作業	工場製作	来月作業	工場製作	来月作業	地盤改良工
							
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 中切地区道路建設工事	工事名		工事名		工事名	
工期	当初 R5.9.1~R7.2.28 変更	工期		工期		工期	
受注者名	(株)中島工務店	受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業	準備工、仮設工、橋台工	今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業	橋台工、法覆護岸工	来月作業		来月作業		来月作業	
		写真		写真		写真	

工事進捗状況 (令和5年1月末)

瑞浪国道維持出張所

① 完		②		③ 完		④ 完	
工事名	令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和4年度 多治見国道東部維持修繕工事	工事名	令和3年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和4年度 多治見国道標識工事
工期	当初 R2. 10. 30~R5. 10. 31 変更	工期	当初 R4. 10. 1~R6. 10. 31 変更	工期	当初 R4. 4. 30~R4. 12. 16 変更 R5. 6. 30	工期	当初 R4. 4. 30~R5. 2. 28 変更 R5. 5. 31
受注者名	日本ハイウェイサービス (株)	受注者名	(有) 木曾ハイウェーサービス	受注者名	(株) 加藤工務店	受注者名	(株) キクテック
今月作業		今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 舗装修繕工	今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 舗装修繕工	来月作業		来月作業	
							
⑤ 完		⑥		⑦ 完		⑧ 完	
工事名	令和4年度 多治見国道電気通信設備工事	工事名	令和4年度 多治見国道防災工事	工事名	令和4年度 多治見国道橋梁補修工事	工事名	令和4年度 多治見国道21号中地区垂炭坑充填工事
工期	当初 R4. 8. 2~R5. 2. 28 変更 R5. 8. 18	工期	当初 R5. 3. 1~R6. 2. 28 変更 R6. 3. 29	工期	当初 R5. 3. 13~R6. 1. 31 変更 R5. 11. 29	工期	当初 R5. 3. 30~R6. 2. 28 変更
受注者名	エフコム (株)	受注者名	(株) 加藤工務店	受注者名	(株) 梅田組	受注者名	徳倉建設 (株)
今月作業		今月作業	ロープ伏、仮設撤去、伐採、法面修繕	今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業	ロープ伏、仮設撤去、法面修繕	来月作業		来月作業	
							

⑨		⑩		⑪		⑫			
工事名	令和4年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和4年度 多治見国道照明設備工事	工事名	令和4年度 多治見国道瑞浪維持管内整備工事	工事名	令和5年度 多治見国道西部維持修繕工事		
工期	当初 R5. 4. 3~R6. 2. 28 変更 R6. 3. 28	工期	当初 R5. 4. 20~R6. 2. 29 変更	工期	当初 R5. 4. 24~R6. 1. 31 変更 R6. 2. 28	工期	当初 R5. 10. 1~R7. 10. 31 変更		
受注者名	(株) 加藤工務店	受注者名	(株) 関電工事	受注者名	セントラル建設(株)	受注者名	日本ハイウェイサービス(株)		
今月作業	地山補強土工(ルートパイル)	今月作業	照明設備工	今月作業	地下横断歩道補修工、舗装工、区画線工	今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他		
来月作業	地山補強土工(ルートパイル)	来月作業	道路照明設備工	来月作業	準備工	来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他		
									
⑬		⑭		⑮		写真			
工事名	令和5年度 多治見国道西部除雪作業工事	工事名	令和5年度 多治見国道東部除雪作業工事	工事名	令和5年度 多治見国道橋梁補修工事			工事名	
工期	当初 R5. 11. 15~R6. 3. 31 変更	工期	当初 R5. 11. 10~R6. 3. 31 変更	工期	当初 R5. 12. 11~R7. 2. 28 変更			工期	
受注者名	セントラル建設(株)	受注者名	(株) 鳴海組	受注者名	(株) 梅田組			受注者名	
今月作業	除雪工、凍結防止工	今月作業	除雪工、凍結防止工	今月作業	準備工	今月作業			
来月作業	除雪工、凍結防止工	来月作業	除雪工、凍結防止工	来月作業	多治見地区 橋梁付属物工 橋梁補修工 仮設工	来月作業			
		 <div data-bbox="816 1566 991 1780" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p>工事名 令和5年度 多治見国道東部除雪作業工事</p> <p>工種 融雪剤搬入</p> <p>測点 融雪剤搬入 塩化カルシウム1t(12袋) 恵那雪寒倉庫 令和6年1月29日</p> </div>							
