

工事進捗状況 (令和7年3月末)

中津川出張所

①		②		③		④	
工事名	令和6年度 木曾川水系和田沢第2砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 木曾川水系中津川護岸整備工事	工事名	令和6年度 木曾川水系アラクラ沢砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 木曾川水系正ヶ根第2砂防堰堤改築工事
工期	当初 R6. 8. 20~R7. 3. 14 変更 R7. 6. 30	工期	当初 R6. 8. 20~R7. 3. 19 変更 R7. 6. 30	工期	当初 R6. 8. 24~R7. 3. 19 変更 R7. 7. 31	工期	当初 R6. 10. 10~R7. 6. 30 変更
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)中島工務店
今月作業	法面工 植生基材吹付 道路工	今月作業	護岸工 大型ブロック積	今月作業	コンクリート堰堤工、仮設工、流路護岸工、法面工	今月作業	置換工・洗掘対策工・堰堤本体工
来月作業	道路工 排水工	来月作業	護岸工 大型ブロック積	来月作業	コンクリート堰堤工、流路護岸工、排水構造物工	来月作業	置換工・堰堤本体工
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 中津川出張所管内整備工事	工事名	令和6年度 木曾川水系新梨沢砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 木曾川水系荒道谷砂防施設改築工事	工事名	令和6年度 木曾川水系地獄谷除石工事
工期	当初 R6. 12. 13~R7. 11. 28 変更	工期	当初 R7. 4. 1~R8. 1. 30 変更	工期	当初 R7. 4. 1~R8. 1. 30 変更	工期	当初 R7. 4. 1~R8. 1. 30 変更
受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	(株)鳴海組	受注者名	(株)吉川工務店
今月作業	荒道管理用道路整備、中津川第2砂防堰堤残土処理場整備 等	今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業	下平次林道整備	来月作業	準備工	来月作業	準備工	来月作業	準備工
							
荒道管理用道路整備(舗装工)							

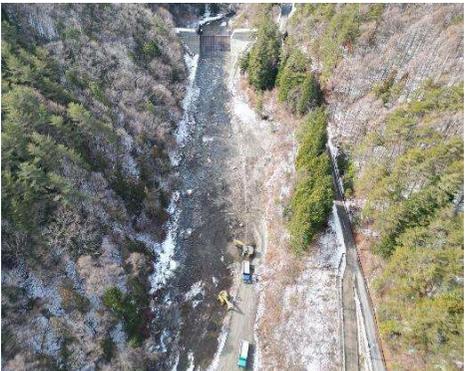
工事進捗状況 (令和7年3月末)

庄内川水系 (旧妻木出張所)

①		②		③		④	
工事名	令和6年度 妻木出張所管内整備工事	工事名 完	令和6年度 庄内川水系寺下第3砂防堰堤改築工事	工事名 完	令和6年度 庄内川水系富士下第2・第3砂防堰堤改築工事	工事名	令和6年度庄内川水系星ヶ台砂防堰堤工事
工期	当初 R6.12.2 ~R7.11.28 変更	工期	当初 R6.5.7~R7.2.28 変更 R7.3.28	工期	当初 R6.6.17~R7.3.14 変更 R7.3.28	工期	当初 R7.4.1~R7.12.19 変更
受注者名	(株) 藤本組	受注者名	(株) 藤本組	受注者名	(株) 藤本組	受注者名	(株) 吉川組
今月作業	指示：4【寺下・鍛冶ヶ入整備】防草工、指示：7【寺下護岸整備】	今月作業	完成	今月作業	完成	今月作業	準備工（施工計画・設計照査・地元説明会①）
来月作業	指示：10【鍛冶ヶ入整備】防草工	来月作業		来月作業		来月作業	準備工（地元説明会②、関係者協議・申請）
指示：4【小家洞道路整備】防草シート・張コンクリート 							
				↑ 第2堰堤 ↑ 流路			
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	

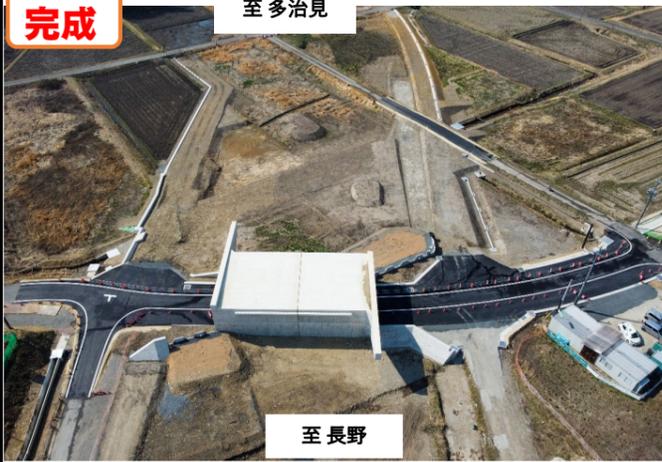
工事進捗状況 (令和7年 3月末)

上松出張所 NO.1

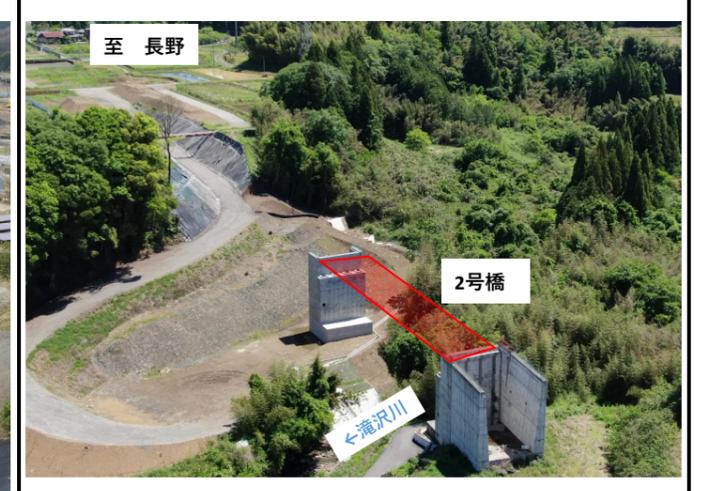
①		②		③		④	
工事名	令和6年度 木曾川水系 小梨子沢第4砂防堰堤流路工事	工事名	令和6年度 木曾川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 上松出張所管内整備工事	工事名	令和6年度 木曾川水系 太田第1砂防堰堤流路工事
工期	当初 R6.8.19~R7.3.14 変更 R7.10.31	工期	当初 R6.8.26~R7.3.19 変更 R7.6.30	工期	当初 R6.11.1~R7.11.28 変更	工期	当初 R6.11.22~R7.6.30 変更 R7.12.25
受注者名	木曾土建工業(株)	受注者名	神福建設(株)	受注者名	奥田工業(株)	受注者名	奥田工業(株)
今月作業	床固め本體工(型枠、打設、脱型)、巨石積工	今月作業	擁壁工(3号補強土壁)・道路土工(路体盛土)・堰堤工(床掘)	今月作業	十王沢第2砂防堰堤上流整備・上田沢倒木処理	今月作業	準備工(伐採工) 仮設工(工事用道路工)
来月作業	垂直壁工(掘削、型枠、打設)	来月作業	擁壁工(天端コン)・堰堤工(床掘)・仮設工(工事用道路)	来月作業	十王沢第2砂防堰堤上流整備	来月作業	砂防土工(掘削工) 法面工(法面吹付、鉄筋挿入)
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 木曾川水系 地蔵沢第1砂防堰堤管理用道路工事	工事名	令和6年度 木曾川水系 深沢砂防堰堤工事	工事名		工事名	
工期	当初 R7.3.6~R8.2.27 変更	工期	当初 R7.4.1~R8.1.30 変更	工期		工期	
受注者名	大宗土建(株)	受注者名	奥田工業(株)	受注者名		受注者名	
今月作業	施工計画	今月作業	-	今月作業		今月作業	
来月作業	準備工	来月作業	施工計画	来月作業		来月作業	
							

工事進捗状況 (令和7年3月末)

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①		②		③		④	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 上切地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 宿地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪3号橋鋼上部工事
工期	当初 R5.1.16~R6.2.29 変更 R6.10.31	工期	当初 R4.12.6~R6.2.29 変更 R6.12.27	工期	当初 R4.9.27~R7.2.28 変更 R7.4.30	工期	当初 R5.3.16~R7.2.28 変更 R6.11.8
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	瀧上工業(株)	受注者名	(株)北都鉄工
今月作業		今月作業		今月作業	高力ボルト締付、ペント解体、渡河工事用道路撤去、現場塗装	今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業	ペント解体、仮締切撤去、現場塗装	来月作業	
<p>完成</p> 		<p>完成</p> 		<p>完成</p> 		<p>完成</p> 	
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 中切地区下部工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 土岐地区道路建設工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区床版工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 新田地区道路建設工事
工期	当初 R5.9.1~R7.2.28 変更 R7.3.28	工期	当初 R6.4.12~R7.2.28 変更 R7.3.31	工期	当初 R6.4.8~R7.2.28 変更 R7.3.31	工期	当初 R6.4.15~R7.2.28 変更 R7.3.31
受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	恵中建設(株)
今月作業	後片付け	今月作業	後片付け	今月作業	後片付け	今月作業	道路土工・伐採工・排水構造物工・舗装工・後片付け
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
<p>完成</p> 		<p>完成</p> 		<p>完成</p> 		<p>完成</p> 	

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区整備工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 下沢地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪2号橋鋼上部工事
工期	当初 R6.7.31~R7.3.31 変更	工期	当初 R6.7.31~R8.2.27 変更	工期	当初 R6.8.30~R8.2.27 変更	工期	当初 R6.8.30~R8.2.27 変更
受注者名	(株)鳴海組	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	板垣建設(株)	受注者名	駒井ハルテック
今月作業	道路土工、法面工、舗装工、仮設工、後片付け	今月作業	カルバート工、擁壁工、排水構造物工、仮設工	今月作業	U型擁壁工 足場工、鉄筋工、型枠工、コンクリート打設	今月作業	工場製作
来月作業		来月作業	カルバート工、擁壁工、排水構造物工	来月作業	U型擁壁工 型枠脱枠、足場撤去、土砂受取、濁水処理工 受電	来月作業	工場製作



⑬	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

⑭	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

⑮	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

⑯	
工事名	
工期	
受注者名	
今月作業	
来月作業	

写真

写真

写真

写真

工事進捗状況 (令和7年3月末)

瑞浪国道維持出張所

①		②		③		④	
工事名	令和5年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和6年度 多治見国道東部維持修繕工事	工事名	令和5年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和6年度 多治見国道舗装修繕工事
工期	当初 R5.10.1~R7.10.31 変更	工期	当初 R6.10.1~R9.10.31 変更	工期	当初 R6.5.7~R7.2.28 変更 R7.5.31	工期	当初 R6.11.01~R7.06.30 変更
受注者名	日本ハイウェイサービス(株)	受注者名	(有)木曾ハイウェーサービス	受注者名	㈱加藤工務店	受注者名	大林道路(株)
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱) 舗装修繕工	今月作業	地山補強土工(ルートパイル)	今月作業	準備工(抑制期間)
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱) 舗装修繕工	来月作業	地山補強土工(ルートパイル)	来月作業	連続鉄筋コンクリート舗装工、切削オーバーレイ工
							
		防草シート工 56,400上					
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 多治見国道管内橋梁補修工事	工事名	令和6年度 多治見国道管内整備工事	工事名	令和6年度 多治見道路情報表示設備工事	工事名	令和6年度 多治見国道CCTV設置工事
工期	当初 R7.3.27~R8.2.27 変更	工期	当初 R7.4.1~R8.2.27 変更	工期	当初 R7.4.1~R8.1.30 変更	工期	当初 R7.4.1~R8.1.30 変更
受注者名	梅田組(株)	受注者名	セントラル建設㈱	受注者名	(株)ナガシマ電子	受注者名	エフコム(株)
今月作業	施工計画	今月作業	準備工	今月作業	準備工	今月作業	準備工
来月作業	施工計画、設計照査	来月作業	準備工	来月作業	準備工	来月作業	準備工
写真		写真		写真		写真	
