### 中津川出張所



# 工事進捗状況 (令和7年9月末)

## 中津川出張所

9	10	10	
工事名 令和7年度 木曽川水系本谷砂防堰堤施設改築工事			  工事名
工事石		工	工期
受注者名 (株)鳴海組			土物
交ば自右   (株)鳴海祖       今月作業   コンクリート堰堤工準備工、仮設工			今月作業
来月作業 コンケリート堰堤工・構造物撤去工 等			来月作業
不月1F来   42/7 「枢炎工、悟垣彻服五工 寸	木月1F未   平岬工、戊环、加州工	术 <b>月</b> 作来 年 (日 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /	木月1F未
工事名			工事名
工期	工期	工期	工期
受注者名	受注者名	受注者名	受注者名
今月作業			今月作業
来月作業			来月作業

### 旧妻木出張所

	①	1	2)	3		<b>4</b> )		
工事名	令和6年度 妻木出張所管内整備工事	工事名		工事名		工事名	令和7年度 妻木管内整備工事	
工期	当初 R6.12.2 ~R7.11.28 変更	工期		工期		工期	当初 R7.12.1~R8.11.30 変更	
受注者名	(株) 藤本組	受注者名		受注者名		受注者名		
	【各所】完了確認					今月作業		
来月作業						来月作業		
	\$		<u>6</u>		<b></b>		8	
工事名		工事名		工事名		工事名		
工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更	
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名		
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業		
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業		

	①	I	2		3		4
工事名	令和6年度 木曽川水系 小梨子沢第4砂防堰堤流路工事	工事名	令和6年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 上松出張所管内整備工事	工事名	令和6年度 木曽川水系 太田第1砂防堰堤流路工事
工期	当初 R6.8.19~R7.3.14 変更 R7.10.31		当初 R6.8.26~R7.3.19 変更 R7.6.30	工期	当初 R6.11.1~R7.11.28 変更	工期	当初 R6.11.22~R7.6.30 変更 R7.12.25
受注者名	木曽土建工業(株)	受注者名	神稲建設(株)	受注者名	奥田工業(株)	受注者名	奥田工業(株)
今月作業	流路護岸工(ブロック積)帯工(型枠、打設)法面工(準備)	今月作業	-	今月作業	砂防教室 運営補助	今月作業	砂防土工(掘削、残土処理) 流路護岸工(プロック積工) 床固め工(作業土工、垂直壁工)
来月作業	流路護岸工(ブロック積)、法面工(吹付)、片付け	来月作業	-	来月作業	砂防教室 運営補助	来月作業	砂防土工(盛土) 法面工(かご枠工) 床固め工(2号床固め本体工、側壁工)
			完 id		II SIGN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		
* *	(5)		(6)		7		8
工事名	令和6年度 木曽川水系 地蔵沢第1砂防堰堤管理用道路工事	工事名	令和6年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤施設改築工事	工事名	令和7年度 木曽川水系 戦沢第2砂防堰堤管理用道路工事
工期	当初 R7. 3. 6~R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7.4.1~R8.1.30 変更	工期	当初 R7. 5. 12~R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7. 5. 20~R8. 2. 27 変更
受注者名		一 <i>…</i> 受注者名	奥田工業(株)	受注者名	奥田工業(株)	一 <i>///</i> 受注者名	
今月作業		今月作業	砂防土工 コンクリート堰堤工		構造物撤去工(殼運搬)、水叩工(土工、型枠、打設)		
来月作業		来月作業	砂防土エ コンクリート堰堤エ	来月作業		来月作業	
77.							


#### 工事進捗状況 (令和7年 9月末)

	9	(10)	
工事名	=	=	工事名 令和7年度 木曽川水系 板橋沢第 1 砂防堰堤工事
	当初 R7.5.22~R8.2.27 変更		工期 当初 R7.9.1~R8.6.30 変更
受注者名			受注者名 神稲建設 (株)
今月作業		今月作業 コンクリート堰堤本体工	今月作業 準備工
来月作業	鉄筋挿入工、構造物取壊し工、道路土工		来月作業 準備工・仮設工・コンクリート堰堤工
-			

## 工事進捗状況 (令和7年9月末)

## 瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)



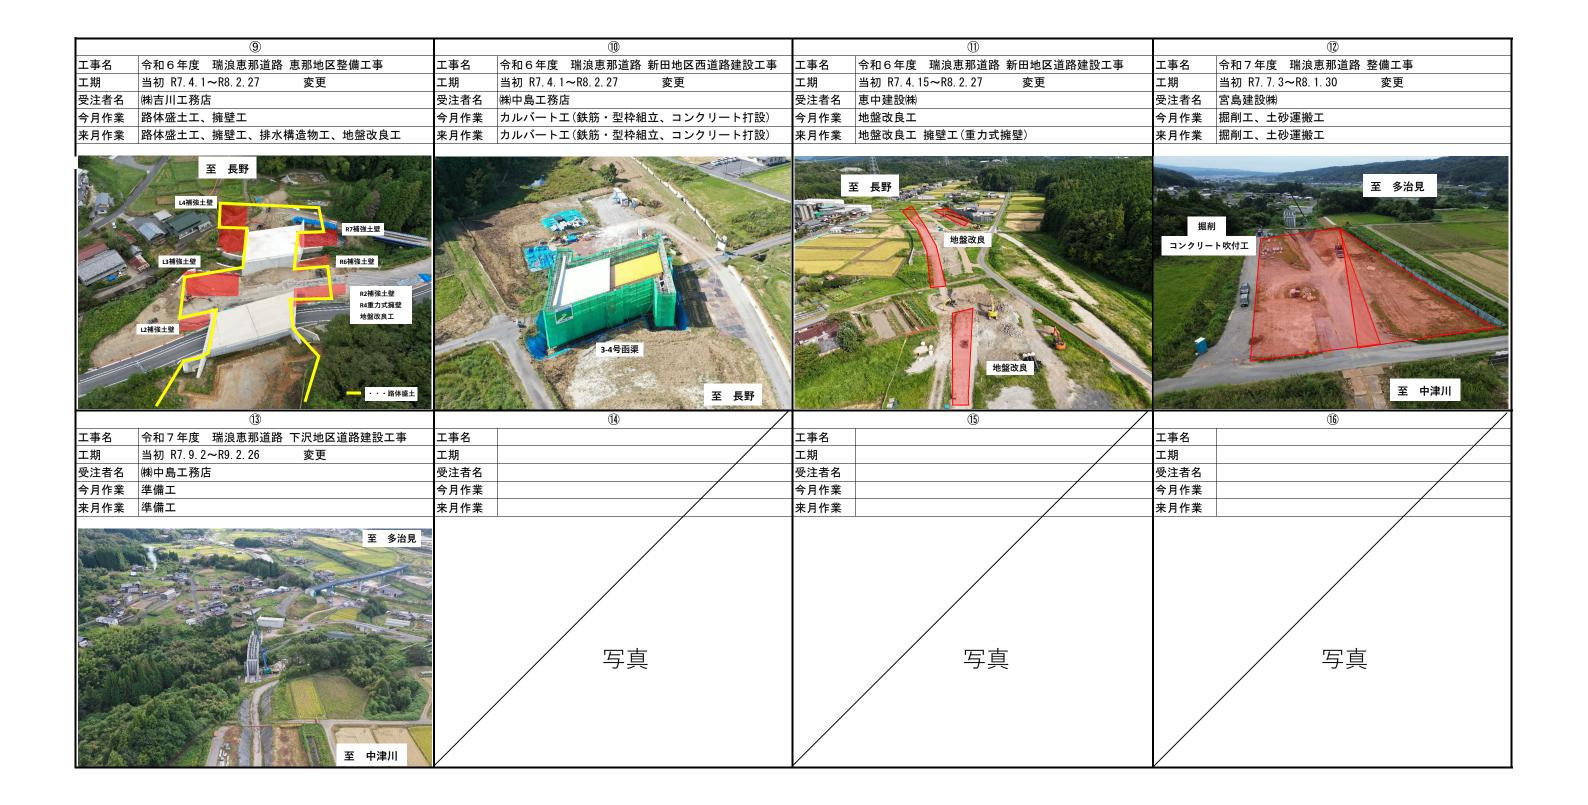

## 瑞浪国道維持出張所

	1)	2			3			4					
工事名	令和5年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和6年度	多治見国道東部	3維持修繕工事	工事名	令和5年度 多治見国道中海	 	エ事	工事名	令和6年度 多治見国道	舗装修繕工事	
工期	当初 R5. 10. 1~R7. 10. 31 変更	工期	当初 R6.10.	I ~R9. 10. 31	変更	工期	当初 R6.5.7~R7.2.28	変更	R7. 8. 29	工期	当初 R6.11.01~R7.0	6.30 変更	R7. 9. 26
受注者名	日本ハイウエイサービス(株)	受注者名	(有) 木曽/	イウェーサーヒ	こ	受注者名	㈱加藤工務店			受注者名	大林道路(株)		
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	今月作業	道路清掃工 緑地管	理工 道路照明維持工 /i T	忘急処理工 道路付属物復旧工 付属施設	今月作業	完成			今月作業	連続鉄筋コンクリート舗装工	、構造物撤去工	、道路土工
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	来月作業	道路清掃工 緑地管	 理工 道路照明維持工 /i T	S急处理工 道路付属物復旧工 付属施設 S急处理工 道路付属物復旧工 付属施設	来月作業				来月作業	連続鉄筋コンクリート舗装工	、区画線工、仮	設撤去工
	R19 52.2kp下り 道路除草		P10 70	. 900kp下 防草:				The she			多治見(1	) the G	
	(5)			6	<u> </u>		7				8		
工事名	令和6年度 多治見国道管内橋梁補修工事	工事名	令和6年度	多治見国道管内	整備工事	工事名	令和6年度 多治見道路情報	<b>服表示設備工</b>	<b></b>	工事名	令和6年度 多治見国道	CCTV設置工事	
工期	当初 R7.3.27~R8.2.27 変更	工期	当初 R7.4.	<b>~</b> R8. 2. 27	変更	工期	当初 R7. 4. 21~R8. 1. 30	変更		工期	当初 R7.4.1~R8.1.30	) 変更	
受注者名	梅田組㈱	受注者名	セントラル質	設 (株)		受注者名	(株)ナガシマ電子			受注者名	エフコム(株)		
今月作業	御嵩地区 現場塗装工、土岐地区 準備工	今月作業	御嵩地区:法枠工			今月作業	準備工 (地質調査)			今月作業	準備工		
来月作業	御嵩地区 現場塗装工、土岐地区 橋梁補修工	来月作業	御嵩地区:法枠工,地区:準備工,伐採	仮設工 恵那地区:準位	#T,試掘 中津川(2)	来月作業	準備工			来月作業	準備工・試掘		
	御嵩地区			御嵩地区		10 miles   10 miles	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	5401V			御嵩地	_	

9	10		
工事名 令和7年度 多治見国道交通事故対策工事	工事名 令和7年度 多治見国道御嵩地区亜炭坑充填工事		
工期 当初 R7.4.18~R7.12.26 変更	工期 当初 R7.07.14~R8.02.27 変更		
受注者名 セントラル建設 (株)	受注者名 徳倉建設 (株)		
今月作業 区画線工、舗装工、縁石工	今月作業 準備工		
来月作業 仮設工(足場組立、土留め)	来月作業 準備工		
AOK	工事名。1007年度多级日底直接发生的工作工作工程, 100万年度,100		
中津川(2)地区	御嵩地区		
