



## 国道21号線 坂祝バイパス工事のお知らせ

花便りが一段とにぎやかな季節となりました。皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ひきつづきご理解、ご協力の程お願い致します。

又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願いいたします。尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。**平成26年4月度工事予定**をお知らせ致します。

### 発注者



工務第二課 0572-25-8025

中央公民館にご意見箱を設置しています。各工事についてお気づきの点がございましたら、ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所にてご意見を承ります。




お知らせ  
国土交通省多治見砂防国道事務所HPを是非ご覧ください。  
<http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogibp/>

多治見砂防国道事務所

検索

※坂祝町ホームページからもリンクできます



# 各工事範囲



※各現場責任者のヘルメットには『現場代理人』・『監理技術者』と赤いシールが貼ってありますので、お気軽にお声をおかけください。

現場代理人

監理技術者

※勝手ながら今月のお知らせより書式を変更させていただきました

平成26年 4月（予定）

1

平成24年度 21号坂祝BP大針黒岩地区道路建設工事



業者名	小池土木(株)
現場代理人	土田 裕紀
現場事務所	0574-27-1161
進捗率	100%

お知らせ

3月28日をもちまして、無事に工事を完了することが出来ました。皆様のご理解・ご協力に心より感謝申し上げます。

4月の作業予定

完了



2

平成25年度 21号坂祝BP黒岩西地区道路建設工事



業者名	青協建設(株)
現場代理人	林 伸一
現場事務所	0574-42-8056
進捗率	100%

お知らせ

3月28日をもちまして、無事に工事を完了することが出来ました。皆様のご理解・ご協力に心より感謝申し上げます。

4月の作業予定

完了



平成26年 4月（予定）

3

平成24年度 21号坂祝BP坂祝トンネル工事




業者名	三井住友建設(株)
現場代理人	西海 康弘
現場事務所	0574-23-0460
進捗率	43.0%

5月からのお知らせ

5月は1号トンネルの覆工コンクリート作業と2号トンネルの掘削作業を行います。

4月の作業予定

4月は、1号トンネルでは防水シートと覆工コンクリートの作業を行います。また、2号トンネルでは掘削作業を行い、防音扉を設置した後、中旬より昼夜作業によるトンネル掘削を行っていきます。ご迷惑をお掛けいたしますがご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

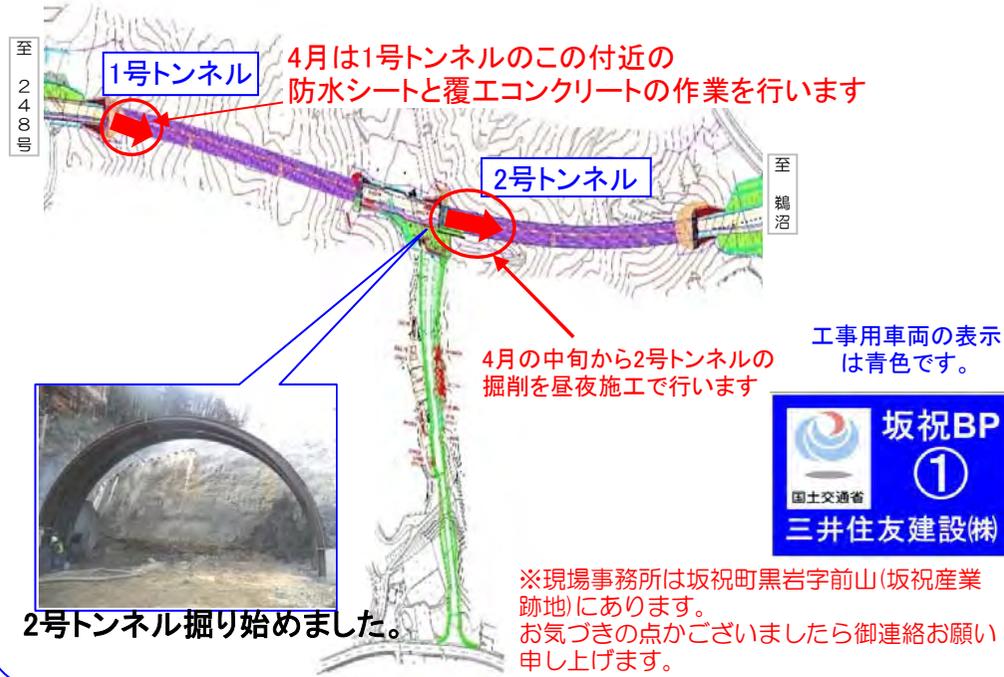

4

平成25年度 21号坂祝BP深萱地区道路建設工事



業者名	北川工務(株)
現場代理人	所 和之
現場事務所	0574-49-7199
進捗率	23.0%

5月からのお知らせ

5月も引き続き、ボックスカルバートの鉄筋及び型枠の組立、コンクリート打設を行います。

4月の作業予定

4月は、ボックスカルバートの鉄筋、型枠（コンクリートを流し込む木製の枠）、足場の組立、コンクリート打設を行います。主に、コンクリートミキサー車などの資材運搬車両が通行します。ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願い致します。



平成26年 4月（予定）

5

平成24年度 21号坂祝BP深萱地区道路建設工事



業者名	北川工務(株)
現場代理人	奥村 嘉麿
現場事務所	0574-49-7282
進捗率	100%

お知らせ

3月19日をもちまして、無事に工事を完了することが出来ました。皆様のご理解・ご協力に心より感謝申し上げます。

4月の作業予定

完了



6

平成25年度21号坂祝BP勝山地区道路建設工事



業者名	(株)市川工務店
現場代理人	山口 豪
現場事務所	0574-27-5380
進捗率	18.0%

5月からのお知らせ

5月は町道が仮橋を通る迂回路へ移動しましたので、その下で地下横断歩道の工事を予定しています。  
いよいよ、地下道全体の工事が始まります。

4月の作業予定

4月初旬に町道を迂回路へ移動します。迂回路へ町道が異動した後に、現町道を封鎖して地下横断歩道の掘削工事の準備をします。  
迂回前には皆様に看板でお知らせします。

4月は迂回した町道の下で、  
地下道の製作にとりかかります。



工事用車両の表示はピンク色です。



※現場事務所は現場の東側（坂祝町深萱79-6）にあります。  
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

平成26年 4月（予定）

7

平成25年度 21号坂祝BP黒岩地区道路建設工事

kuriyama

業者名	(株) 栗山組
現場代理人	伊藤 隆二
現場事務所	0574-42-8640
進捗率	1.0%

#### お知らせ

黒岩2号線と黒岩5号線の地盤をセメント改良し、その2路線をカルバートBOXに変え、補強土壁及び盛土でつないで坂祝バイパスを作成する工事です。

#### 4月の作業予定

4/1から黒岩2号線に続き、黒岩5号線も同時に通行止（終日）とし、地盤改良の準備工としてボーリングを行います。また、小池土木㈱さんの盛土工事を引き継いでバイパス工事を進めていきます。

※新しく工事を受注しました

工事用車両の表示は白色です。

