



国道21号線 坂祝バイパス工事のお知らせ

若葉の鮮やかな季節となりました。皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ひきつづきご理解、ご協力の程お願い致します。


又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願いいたします。尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。**平成26年5月度工事予定**をお知らせ致します。

発注者



工務第二課 0572-25-8025


中央公民館にご意見箱を設置しています。
各工事についてお気づきの点がございましたら、
ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所
にてご意見を承ります。




お知らせ
国土交通省多治見砂防国道事務所HPを
是非ご覧ください。
<http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogibp/>

多治見砂防国道事務所

検索



各工事範囲

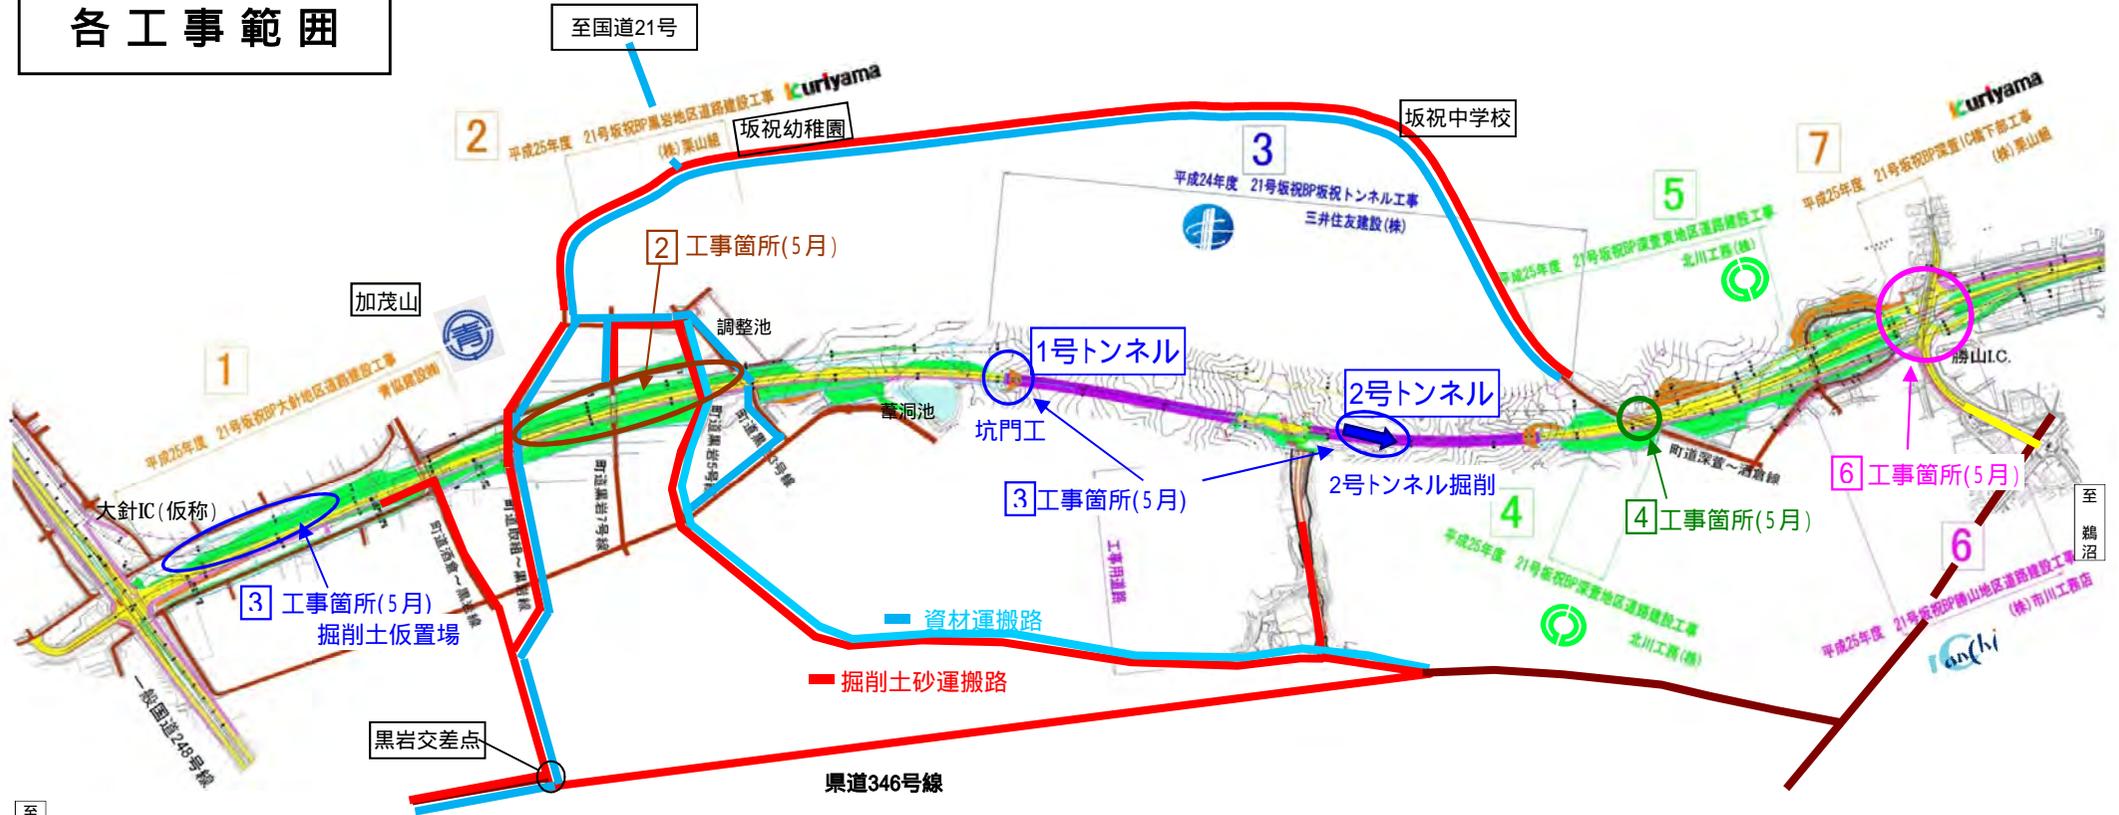

至
2
4
8
号

各現場責任者のヘルメットには『現場代理人』・『監理技術者』と赤いシールが貼ってありますので、お気軽にお声をおかけください。

現場代理人

監理技術者

平成26年 5月 (予定)

1

平成25年度 21号坂祝BP大針地区道路建設工事



業者名	青協建設(株)
現場代理人	後藤 光幸
現場事務所	0574-42-8056
進捗率	0.0%

お知らせ
この工事は、坂祝バイパスと町道酒倉黒岩線が交差する箇所に橋梁を施工し盛土を行う工事です。ご迷惑をお掛けいたしますがご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

5月の作業予定
5月は準備工として、測量を行います。



盛土・排水を施工します。

橋梁を施工します。

工事用車両の表示はオレンジ色です。



新しく工事を受注しました

現場事務所は坂祝町黒岩字宮前(加茂山団地駐車場内)にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

2


平成25年度 21号坂祝BP黒岩地区道路建設工事



業者名	(株) 栗山組
現場代理人	佐藤 卓也
現場事務所	0574-42-8640
進捗率	2.0%

6月からのお知らせ
黒岩2号線及び黒岩5号線にて地盤改良工に着手する予定です。

5月の作業予定
路体盛土を行います。

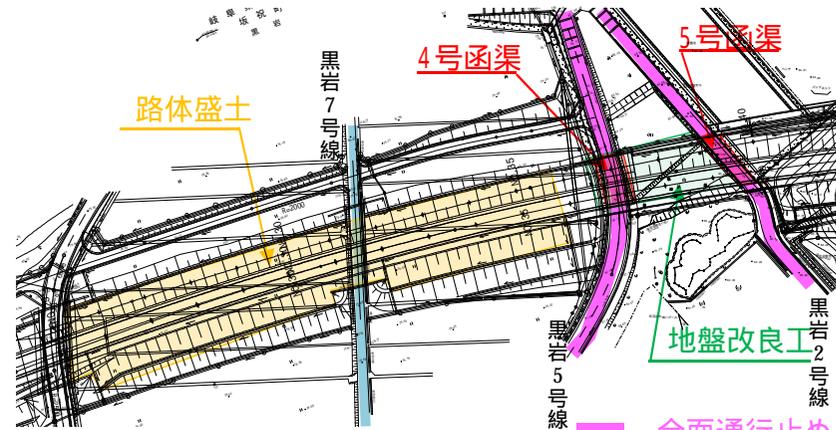

写真撮影方向

現場全景写真
4月中旬



全面通行止め

一般車両通行止



工事用車両の表示は白色です。

平成26年 5月 (予定)

3

平成24年度 21号坂祝BP坂祝トンネル工事



業者名	三井住友建設(株)
現場代理人	西海 康弘
現場事務所	0574-23-0460
進捗率	43.0%

6月からのお知らせ

6月は1号トンネルの覆工コンクリート作業と2号トンネルの掘削作業を行います。

5月の作業予定

5月は、1号トンネルでは坑門工の作業を行います。2号トンネルでは昼夜作業によるトンネル掘削を行っていきます。また、要対策土の処理作業を行います。ご迷惑をお掛けいたしますがご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

5月は1号トンネルの入口部の坑門の作業を行います

2号トンネルの掘削を昼夜施工で行います

工事用車両の表示は青色です。

2号トンネルに防音扉を設置し、4/14から昼夜作業を開始しています

現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

4

平成25年度 21号坂祝BP深萱地区道路建設工事



業者名	北川工務(株)
現場代理人	井戸 隆司
現場事務所	0574-49-7199
進捗率	27.0%

6月からのお知らせ

6月も引き続き、ボックスカルバートの鉄筋及び型枠の組立、コンクリート打設を行います。

5月の作業予定

5月は、ボックスカルバートの底板部の鉄筋、型枠(コンクリートを流し込む木製の枠)、足場の組立、コンクリート打設を行います。主に、コンクリートミキサー車などの資材運搬車両が通行します。ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

均しコンクリート完了状況

工事用車両の表示は緑色です。

5月は主に、8号ボックスカルバートの底板の部分を作っていきます。

現場事務所は坂祝町深萱(教員住宅跡地)にあります。お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

平成26年 5月 (予定)

5

平成25年度 21号坂祝BP深萱東地区道路建設工事



業者名	北川工務(株)
現場代理人	奥村 嘉磨
現場事務所	0574-49-7199 (仮)
進捗率	0.0%

6月からのお知らせ

6月中旬より、7号函渠の掘削開始予定です。

5月の作業予定

工事看板の設置、現地の調査、測量を実施致します。
今後、お世話になりますので、よろしくお願い致します。



工事車両の表示は緑色です。

新しく工事を受注しました



6

平成25年度21号坂祝BP勝山地区道路建設工事



業者名	(株)市川工務店
現場代理人	山口 豪
現場事務所	0574-27-5380
進捗率	22.0%

6月からのお知らせ

6月は5月から引き続き、地下道本体工事を行う予定をしています。

5月の作業予定

4月18日に町道深萱取組線(通学路)を迂回しました。ご迷惑をおかけしています。
5月は旧町道深萱取組線を封鎖して地下横断歩道の掘削工事をします。
切回迂回路の仮栈橋下では、地下道本体工事を行っています。



5月は迂回した町道深萱取組線の下で、地下道本体工事にとりかかります。

旧町道深萱取組線は締め切って掘削作業を行います。いよいよ、地下道全体工事が始まります。

工事車両の表示はピンク色です。

現場事務所は現場の東側(坂祝町深萱79-6)にあります。お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。



平成26年 5月 (予定)

7

平成25年度 21号坂祝BP勝山IC橋下部工事

kuriyama

業者名	(株) 栗山組
現場代理人	桜井 正臣
現場事務所	0574-26-2248
進捗率	0.0%

6月からのお知らせ

6月も引き続き付替道路の盛土を施工を行っていきます。
ご迷惑をお掛けしますがご理解ご協力をお願いします。

5月の作業予定

5月下旬から下部工事に先立ち既設構造物撤去及び国道21号付替道路の盛土の施工を順次行っています。

坂祝バイパス
勝山IC完成イメージ

下部工作業手順

- 1 基礎杭を打ち込みます
- 2 フォーミング(土留)の鉄筋を組み立てて型枠を設置します
- 3 コンクリートを打込みます
- 4 鉄筋コンクリート橋出しの完成

坂祝バイパスの橋台を建設する工事です。

平成25年度 21号坂祝BP勝山IC橋下部工事

工期 平成26年3月27日～平成27年2月27日

国土交通省 中部地方整備局 Kuriyama 株式会社 栗山組
多岐見砂防国道事務所 工事第三課 TEL:0572-25-8025 TEL:0574-26-2248

イメージアップ看板 サイズ1800×2700mm

新しく工事を受注しました

工事用車両の表示は白色です。

