



国道21号線 坂祝バイパス工事のお知らせ

梅雨の足音がすぐそこまで聞こえてまいりました。皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。工事中ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ひきつづきご理解、ご協力の程お願い致します。

又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願いいたします。尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。**平成26年6月度工事予定**をお知らせ致します。

発注者



工務第二課 0572-25-8025

中央公民館にご意見箱を設置しています。
各工事についてお気づきの点がございましたら、
ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所
にてご意見を承ります。




お知らせ
国土交通省多治見砂防国道事務所HPを
是非ご覧ください。

<http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogibp/>

多治見砂防国道事務所

検索



平成26年 6月（予定）

1

平成25年度 21号坂祝BP大針地区道路建設工事



業者名	青協建設(株)
現場代理人	後藤 光幸
現場事務所	0574-42-8056
進捗率（5月末）	0.0%

7月からのお知らせ

町道酒倉黒岩線の試掘、橋台工の作業ヤード整備を行う予定です。

6月の作業予定

工事看板の設置、現地の調査、測量を実施致します。 ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願い致します。



盛土・排水を施工します。

橋梁を施工します。

工事用車両の表示はオレンジ色です。



※現場事務所は坂祝町黒岩字宮前(加茂山団地駐車場内)にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

2

平成25年度 21号坂祝BP黒岩地区道路建設工事




業者名	(株) 栗山組
現場代理人	佐藤 卓也
現場事務所	0574-42-8640
進捗率（5月末）	6.5%

7月からのお知らせ

5号函渠に続き、4号函渠の施工を行う予定です。

6月の作業予定

6月は、地盤改良工事・路体盛土工事、5号函渠にて足場の組立を行います。地盤改良工事では、大型の機械を使用して作業を行います。ご迷惑をお掛けいたしますがご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

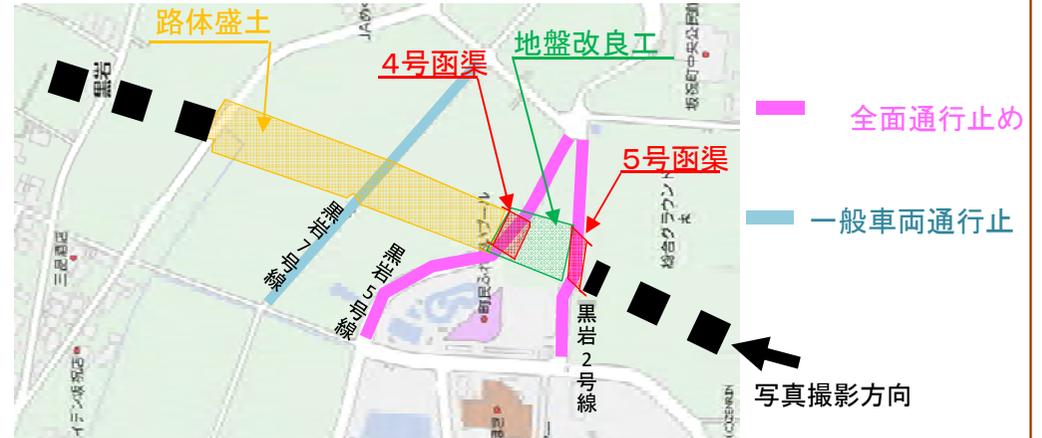

全面通行止め

一般車両通行止

写真撮影方向

現場全景写真
5月中旬



工事用車両の表示は白色です。

平成26年 6月（予定）

3

平成24年度 21号坂祝BP坂祝トンネル工事



業者名	三井住友建設(株)
現場代理人	西海 康弘
現場事務所	0574-23-0460
進捗率（5月末）	43.0%

7月からのお知らせ

7月は1号トンネルの覆工コンクリート作業と2号トンネルの掘削作業を行います。

6月の作業予定

6月は、1号トンネルでは坑門工の作業を行います。2号トンネルでは昼夜作業によるトンネル掘削と出口側の切土作業を行います。ご迷惑をお掛けいたしますがご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

1号トンネル 6月は1号トンネルの覆工コンクリートの作業を行います

2号トンネル 2号トンネルの昼夜作業による掘削と出口側の切土作業を行います

工事用車両の表示は青色です。

1号トンネルでは防水シートと覆工コンクリートの作業を行っています

※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

4

平成25年度 21号坂祝BP深萱地区道路建設工事



業者名	北川工務(株)
現場代理人	井戸 隆司
現場事務所	0574-49-7199
進捗率（5月末）	41.0%

7月からのお知らせ

7月も引き続き、ボックスカルバートの鉄筋及び型枠の組立、コンクリート打設を行います。

6月の作業予定

6月は、支保工(打込まれるコンクリートを支える部材)の組立、側壁、頂版部の鉄筋、型枠組立～コンクリート打設を行います。引き続き、コンクリートミキサー車などの資材運搬車両が通行します。ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

8号ボックスカルバート

21号坂祝BP

側壁、頂版

支保工

底版

底版施工中です

工事用車両の表示は緑色です。

6月は8号ボックスカルバートの側壁、頂版の部分を造っていきます。

※現場事務所は坂祝町深萱（教員住宅跡地）にあります。お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

平成26年 6月（予定）

5

平成25年度 21号坂祝BP深萱東地区道路建設工事



業者名	北川工務(株)
現場代理人	奥村 嘉麿
現場事務所	0574-49-7199 (仮)
進捗率 (5月末)	0.2%
7月からのお知らせ	
7月は6月から引き続き、7号函渠本体工事を行う予定をしています。	
6月の作業予定	
6月中旬より、7号函渠の掘削を開始します。 函渠工、町道近接箇所掘削影響範囲において、切廻し迂回路を一部西側に移設します。	



工事用車両の表示は緑色です。




6

平成25年度21号坂祝BP勝山地区道路建設工事



業者名	(株)市川工務店
現場代理人	山口 豪
現場事務所	0574-27-5380
進捗率 (5月末)	34.0%
7月からのお知らせ	
7月も引き続き、地下道本体工事を行う予定をしています。	
6月の作業予定	
5月に地下道全体の掘削が完了しました。 仮栈橋の両脇で地下道本体工事が進んでいきます。	

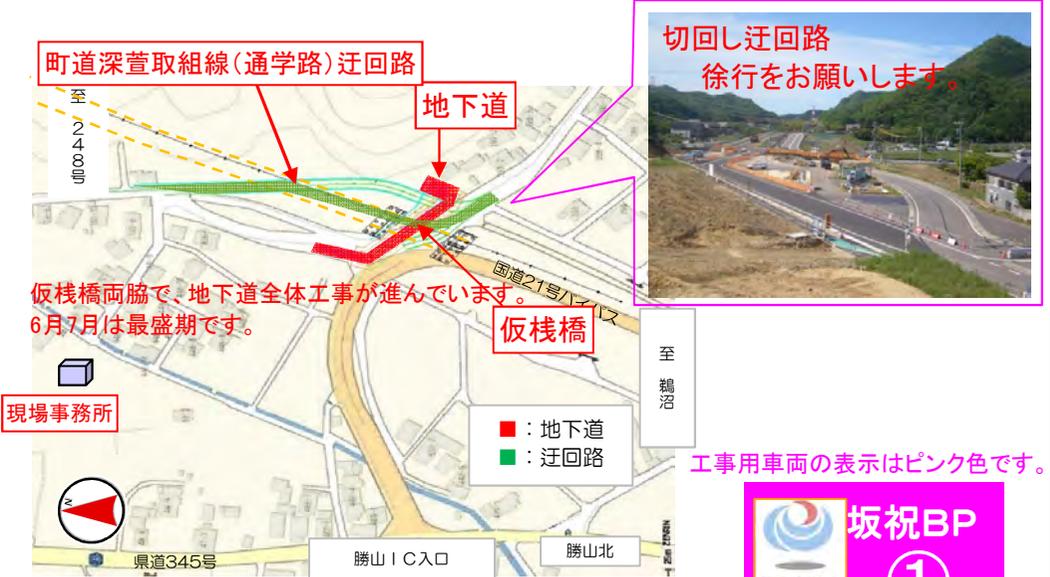

工事用車両の表示はピンク色です。



※現場事務所は現場の東側（坂祝町深萱79-6）にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

平成26年 6月（予定）

7

平成25年度 21号坂祝BP勝山IC橋下部工事

kuriyama

業者名	(株) 栗山組
現場代理人	桜井 正臣
現場事務所	0574-27-1335
進捗率（5月末）	0.0%

7月からのお知らせ

付替道路の舗装・区画線・防護柵工事を行います。
付替道路完了後 国道21号坂祝が1ヶ所を新しく切り替えを行います。
ご迷惑をお掛けしますがご理解ご協力をお願いします。

6月の作業予定

付替道路の盛土の施工を行い順次路盤及び舗装工事を行います。
ご迷惑をお掛けしますがご理解ご協力をお願いします。



※現場事務所は、（坂祝町町営住宅跡地）にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

工事用車両の表示は白色です。

