



国道21号線 坂祝バイパス工事のお知らせ

日毎暑さが増してまいりました。皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。工事中ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ひきつづきご理解、ご協力の程お願い致します。

又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願いいたします。尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。**平成26年7月度工事予定**をお知らせ致します。

発注者



工務第二課 0572-25-8025

中央公民館にご意見箱を設置しています。
各工事についてお気づきの点がございましたら、
ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所
にてご意見を承ります。




お知らせ
国土交通省多治見砂防国道事務所HPを
是非ご覧ください。

<http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogibp/>

多治見砂防国道事務所

検索



各工事範囲



至
2
4
8
号

※各現場責任者のヘルメットには『現場代理人』・『監理技術者』と赤いシールが貼ってありますので、お気軽にお声をおかけください。

現場代理人

監理技術者

平成26年 7月（予定）

1

平成25年度 21号坂祝BP大針地区道路建設工事



業者名	青協建設(株)
現場代理人	後藤 光幸
現場事務所	0574-42-8056
進捗率（6月末）	0.0%

8月からのお知らせ

場所打杭工、仮設工を行う予定です。

7月の作業予定

町道の試掘、橋台工の作業ヤード整備を行います。 ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願い致します。



試掘、作業ヤード整備

工事用車両の表示はオレンジ色です。



※現場事務所は坂祝町黒岩字宮前(加茂山団地駐車場内)にあります。お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

2

平成25年度 21号坂祝BP黒岩地区道路建設工事




業者名	(株) 栗山組
現場代理人	佐藤 卓也
現場事務所	0574-42-8640
進捗率（6月末）	20.0%

8月からのお知らせ

7月に続き、場所打ち函渠（4号函渠・5号函渠）の施工を行う予定です。

7月の作業予定

7月は、場所打ち函渠工（4号函渠・5号函渠）の足場・鉄筋・型枠・コンクリート打設を行います。コンクリートミキサー車と資材運搬車両等が通行します。ご迷惑をお掛けいたしますがご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

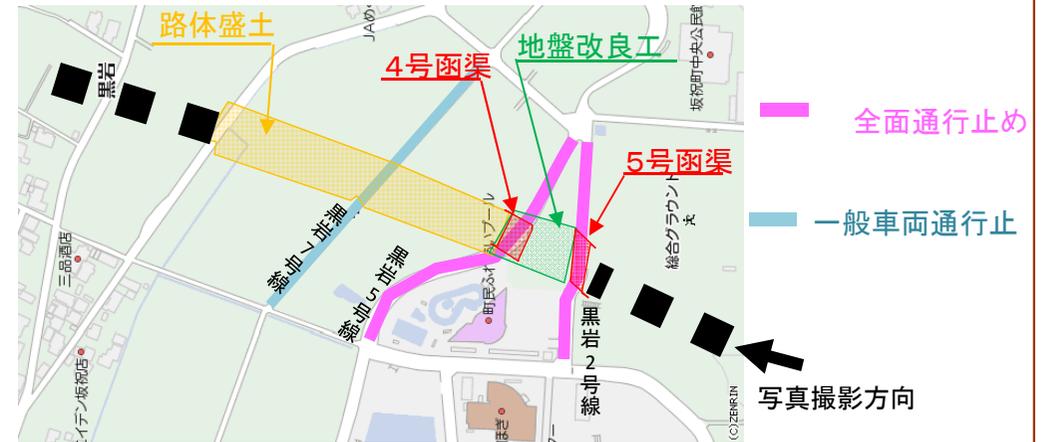

現場全景写真
6月中旬



工事用車両の表示は白色です。

平成26年 7月（予定）

3

平成24年度 21号坂祝BP坂祝トンネル工事




業者名	三井住友建設(株)
現場代理人	西海 康弘
現場事務所	0574-23-0460
進捗率（6月末）	68.0%

8月からのお知らせ

8月は1号トンネルの覆工コンクリート作業と2号トンネルの掘削、インバートの作業を行います。

7月の作業予定

7月は、1号トンネルでは覆工コンクリートの作業を行います。2号トンネルでは昼夜作業によるトンネル掘削を行います。ご迷惑をお掛けいたしますがご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

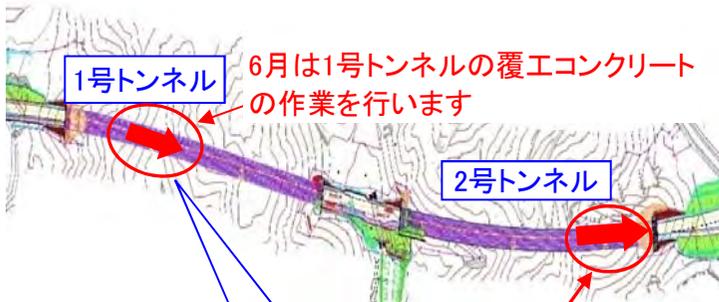

1号トンネルでは起点側の坑門工を施工しました。

2号トンネルの昼夜作業による掘削作業を行います

工用車両の表示は青色です。



※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。お気づきの点かございましたら御連絡お願い申し上げます。

4

平成25年度 21号坂祝BP深萱地区道路建設工事



業者名	北川工務(株)
現場代理人	井戸 隆司
現場事務所	0574-49-7199
進捗率（6月末）	59.0%

8月からのお知らせ

8月も引き続き、ボックスカルバートの鉄筋及び型枠の組立、コンクリート打設を行い、ボックスカルバート本体は、おおよそ完成します。引き続き、足場等の解体、埋戻しの施工を予定しています。

7月の作業予定

7月は、支保工(打込まれるコンクリートを支える部材)の組立、側壁、頂版部の鉄筋、型枠組立～コンクリート打設を行います。引き続き、コンクリートミキサー車などの資材運搬車両が通行します。ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願い致します。



側壁・頂版の鉄筋、型枠施工しています。

工用車両の表示は緑色です。



7月も8号ボックスカルバートの側壁、頂版の部分造っていきます。

※現場事務所は坂祝町深萱(教員住宅跡地)にあります。お気づきの点かございましたら御連絡お願い申し上げます。

平成26年 7月（予定）

5

平成25年度 21号坂祝BP深萱東地区道路建設工事



業者名	北川工務(株)
現場代理人	奥村 嘉彦
現場事務所	0574-49-7199 (仮)
進捗率(6月末)	9.0%
8月からのお知らせ	
8月は7号函渠の掘削を完了し、引き続き7号函渠本体工事を行う予定をしています。	
7月の作業予定	
6月中旬より、切廻し迂回路を一部西側に移設、7号函渠の掘削を開始します。 7月は6月に引き続き、7号函渠の掘削を行います。	



工事用車両の表示は緑色です。



6

平成25年度21号坂祝BP勝山地区道路建設工事



業者名	㈱市川工務店
現場代理人	山口 豪
現場事務所	0574-27-5380
進捗率(6月末)	40.0%
8月からのお知らせ	
仮橋東側を埋戻し、町道を移動させます。 地下道本体工事もいよいよ佳境となっていきます。	
7月の作業予定	
先月に引き続き、地下道本体工事を行っています。 仮橋東側が完成しますと、埋戻しにかかります。	



工事用車両の表示はピンク色です。



※現場事務所は現場の東側（坂祝町深萱79-6）にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

平成26年 7月 (予定)

7

平成25年度 21号坂祝BP勝山IC橋下部工事

kuriyama

業者名	(株) 栗山組
現場代理人	桜井 正臣
現場事務所	0574-27-1335
進捗率(6月末)	2.0%

8月からのお知らせ

橋台工(A2)工事施工ヤードの設置・場所打ち杭の施工を行う予定をしています。

7月の作業予定

付替道路の舗装・区画線・防護柵工事を行います。
付替道路完了後 国道21号坂祝が11°の切り替えを行います。
ご迷惑をお掛けしますがご理解ご協力をお願いします。



※現場事務所は、(坂祝町町営住宅跡地)にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

工事用車両の表示は白色です。

