



国道21号線 坂祝バイパス工事のお知らせ

残暑がひときは身にこたえるようでございます。皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。工事中ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ひきつづきご理解、ご協力の程お願い致します。


又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願いいたします。尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。平成26年8月の工事予定をお知らせ致します。

発注者



工務第二課 0572-25-8025

中央公民館にご意見箱を設置しています。
各工事についてお気づきの点がございましたら、
ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所
にてご意見を承ります。




お知らせ
国土交通省多治見砂防国道事務所HPを
是非ご覧ください。


<http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogibp/>

多治見砂防国道事務所

検索

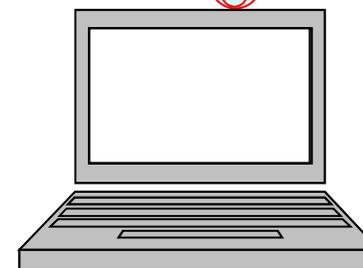

各工事範囲

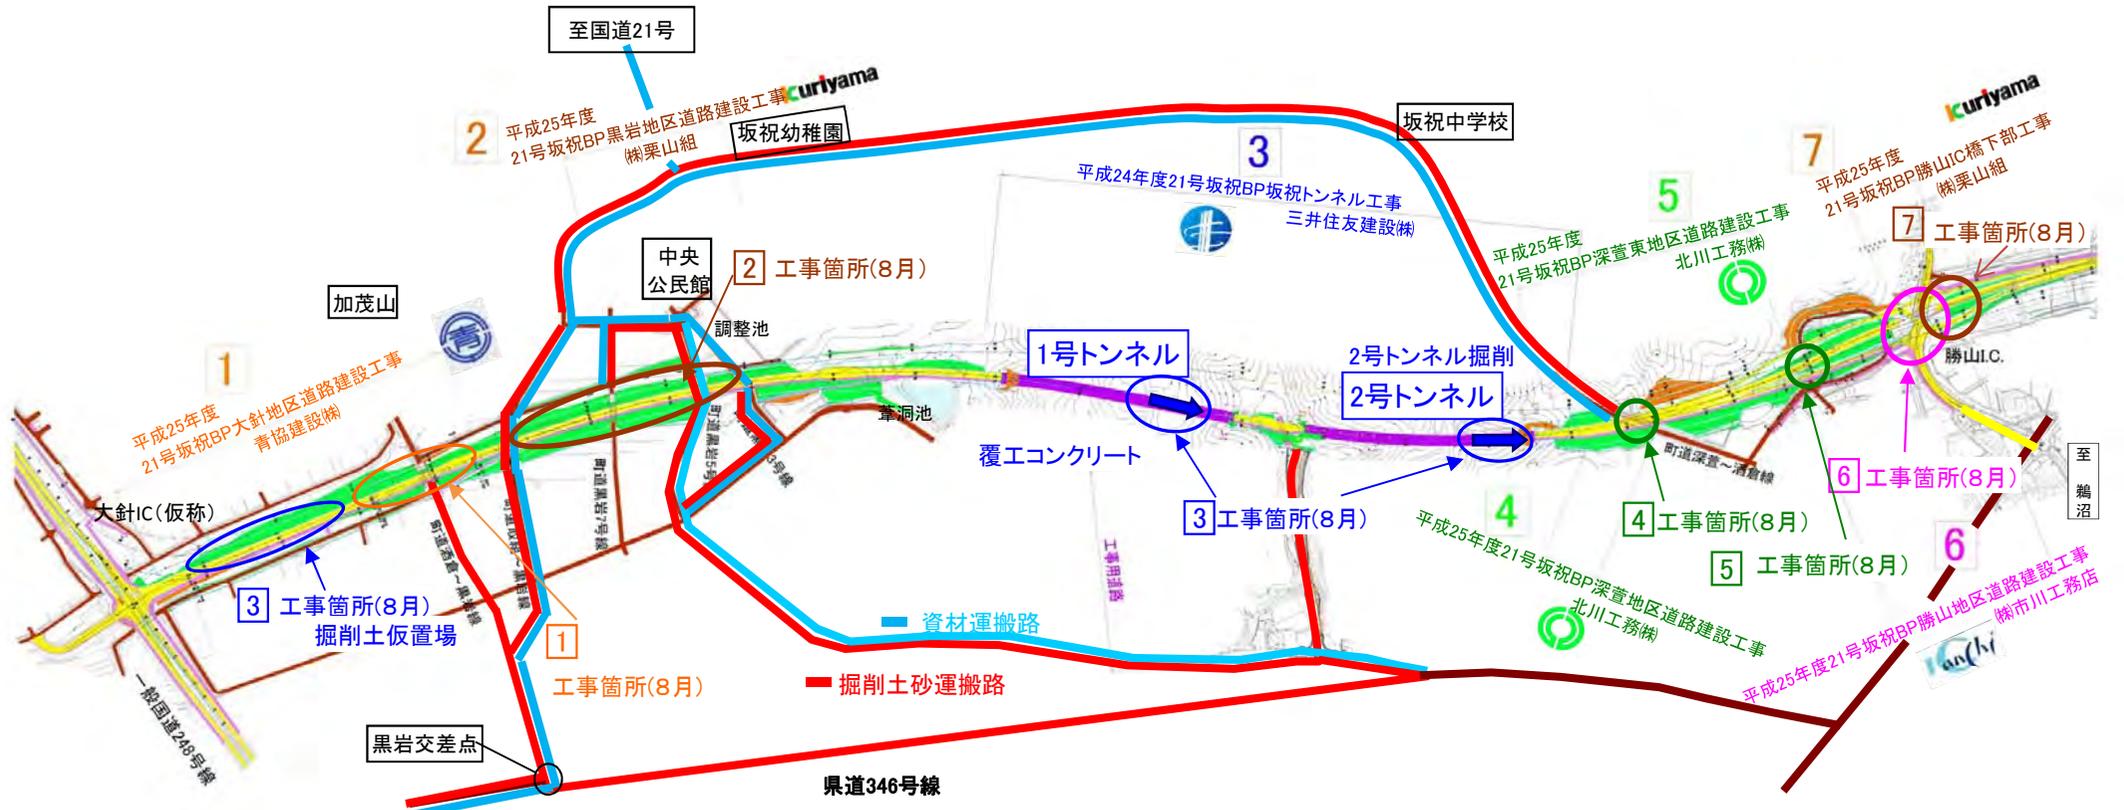

至
2
4
8
号

※各現場責任者のヘルメットには『現場代理人』・『監理技術者』と赤いシールが貼ってありますので、お気軽にお声をおかけください。

現場代理人

監理技術者

平成26年 8月（予定）

1

平成25年度 21号坂祝BP大針地区道路建設工事



業者名	青協建設(株)
現場代理人	後藤 光幸
現場事務所	0574-42-8056
進捗率（7月末）	1.0%
9月からのお知らせ	
場所打杭工、仮設工、盛土工を行う予定です。	
8月の作業予定	
場所打杭工、仮設工、盛土工を行います。 ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願い致します。	



盛土工

場所打杭工・仮設工

工事用車両の表示はオレンジ色です。




※現場事務所は坂祝町黒岩字宮前(加茂山団地駐車場内)にあります。お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

2

平成25年度 21号坂祝BP黒岩地区道路建設工事



業者名	(株) 栗山組
現場代理人	佐藤 卓也
現場事務所	0574-42-8640
進捗率（7月末）	40.0%
9月からのお知らせ	
8月に続き、場所打ち函渠（4号函渠・5号函渠）の施工を行う予定です。また、2号補強土壁工及び路体盛土を行う予定です。	
8月の作業予定	
8月は、場所打ち函渠工（4号函渠・5号函渠）の足場・鉄筋・型枠・コンクリート打設を行います。コンクリートミキサー車と資材運搬車両等が通行します。ご迷惑をお掛けいたしますがご理解・ご協力をよろしくお願い致します。	

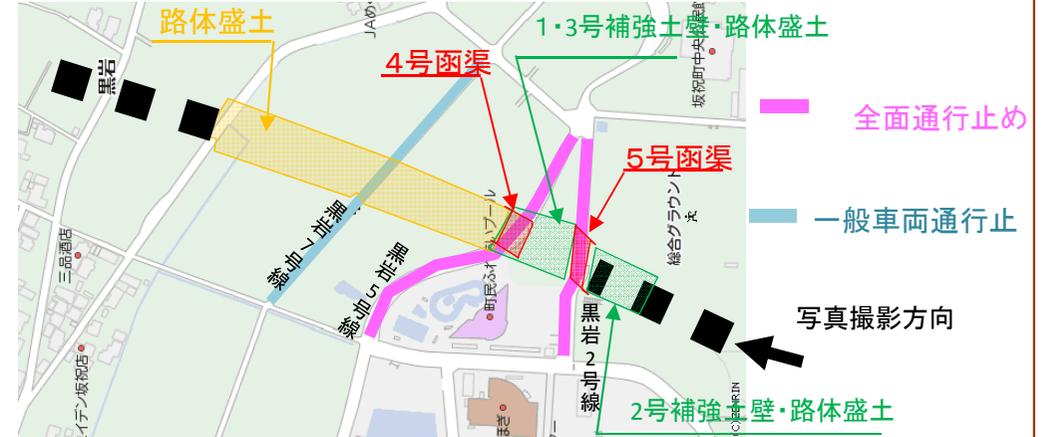

現場全景写真
7月中旬



工事用車両の表示は白色です。

平成26年 8月（予定）

3

平成24年度 21号坂祝BP坂祝トンネル工事



業者名	三井住友建設(株)
現場代理人	西海 康弘
現場事務所	0574-23-0460
進捗率（7月末）	78.8%

9月からのお知らせ

9月は1号トンネルの終点側坑門工と2号トンネルのインバート（トンネル下面）の作業を行います。

8月の作業予定

8月は、1号トンネルでは覆工コンクリートの作業を行います。2号トンネルでは昼夜作業によるトンネル掘削を行い、貫通する予定です。ご迷惑をお掛けいたしますがご理解・ご協力をよろしくお願い致します。



8月は1号トンネルの覆工コンクリートの作業を行います

2号トンネル

2号トンネルが貫通する予定です。

工用車両の表示は青色です。



2号トンネルでは出口の工事を行いました。

※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。
お気づきの点かございましたら御連絡お願い申し上げます。

4

平成25年度 21号坂祝BP深萱地区道路建設工事




業者名	北川工務(株)
現場代理人	井戸 隆司
現場事務所	0574-49-7199
進捗率（7月末）	75.0%

9月からのお知らせ

9月から、足場等の解体、埋戻し、ボックスカルバート内の舗装工事等を順次施工予定しています。

8月の作業予定

8月は、側壁、頂版部と翼壁部の鉄筋、型枠組立～コンクリート打設を行います。ボックスカルバート本体は、おおよそ完成します。引き続き、コンクリートミキサー車などの資材運搬車両が通行します。ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

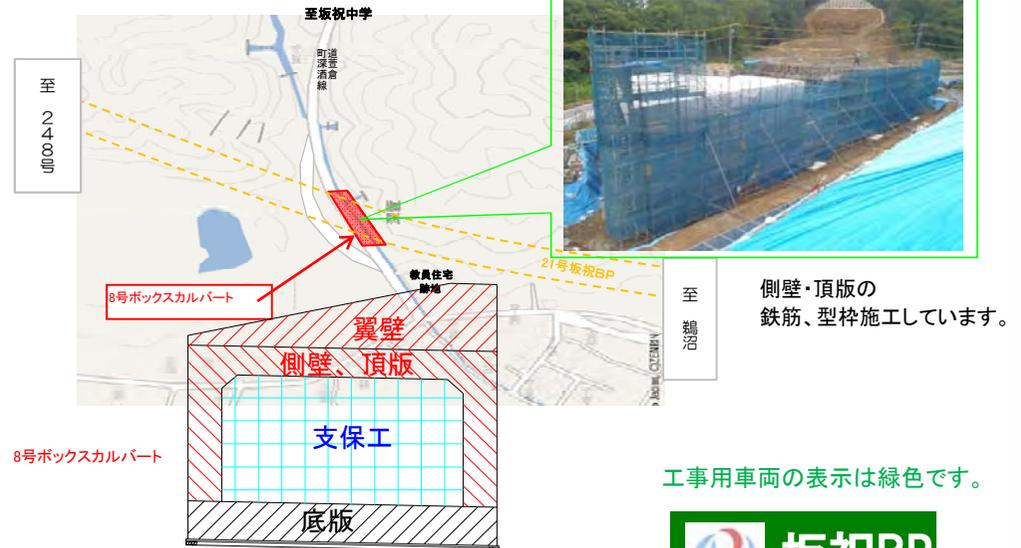

側壁・頂版の鉄筋、型枠施工しています。

工用車両の表示は緑色です。



8月は、8号ボックスカルバートの側壁、頂版、翼壁の部分を作っていきます。

※現場事務所は坂祝町深萱（教員住宅跡地）にあります。
お気づきの点かございましたら御連絡お願い申し上げます。

平成26年 8月（予定）

5

平成25年度 21号坂祝BP深萱東地区道路建設工事



業者名	北川工務(株)
現場代理人	奥村 嘉彦
現場事務所	0574-49-7199（仮）
進捗率（7月末）	19.8%

9月からのお知らせ

9月は、引き続き7号函渠本体工事(足場・鉄筋・型枠)を行います。
7号函渠の工事中は町道深萱酒倉線を切り回しています。ご不便をおかけしますが注意してご通行いただくようよろしくお願いいたします。

8月の作業予定

8月中旬に7号函渠の掘削を完了し、本体工事を開始します。



工事用車両の表示は緑色です。



6

平成25年度21号坂祝BP勝山地区道路建設工事



業者名	㈱市川工務店
現場代理人	山口 豪
現場事務所	0574-27-5380
進捗率（7月末）	46.0%

9月からのお知らせ

地下道の東西出入口の工事が続きます。
地下道本体工事もいよいよ佳境となっていきます。

8月の作業予定

仮橋東側を埋戻し、町道を移動させます。
地下道本体も埋めていきます。東西の入口の工事に入っていきます。



※現場事務所は現場の東側（坂祝町深萱79-6）にあります。工事用車両の表示はピンク色です。お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

平成26年 8月（予定）

7

平成25年度 21号坂祝BP勝山IC橋下部工事

kuriyama

業者名	(株) 栗山組
現場代理人	桜井 正臣
現場事務所	0574-27-1335
進捗率（7月末）	10.0%
9月からのお知らせ	
引続き橋台工（A2）施工をいます。 又橋台工（A1）の施工ヤードの設置・場所打ち杭・土留と施工を進める予定です。	
8月の作業予定	
橋台工（A2）工事施工ヤードの設置・場所打ち杭・土留と施工を進めていきます。 大変ご迷惑をお掛けしますがご協力をお願いします。	

7月22日（火）より国道21号勝山ICを切り回しています。



※現場事務所は、（坂祝町町営住宅跡地）にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

工事用車両の表示は白色です。

