



国道21号線 坂祝バイパス工事のお知らせ

秋の夜長、虫の音が心地よい季節になりました。皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。工事中ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ひきつづきご理解、ご協力の程お願い致します。

又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願いいたします。尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。**平成26年10月の工事予定**をお知らせ致します。

発注者



工務第二課 0572-25-8025

中央公民館にご意見箱を設置しています。
各工事についてお気づきの点がございましたら、
ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所
にてご意見を承ります。




お知らせ
国土交通省多治見砂防国道事務所HPを
是非ご覧ください。


<http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogibp/>

多治見砂防国道事務所

検索



各工事範囲

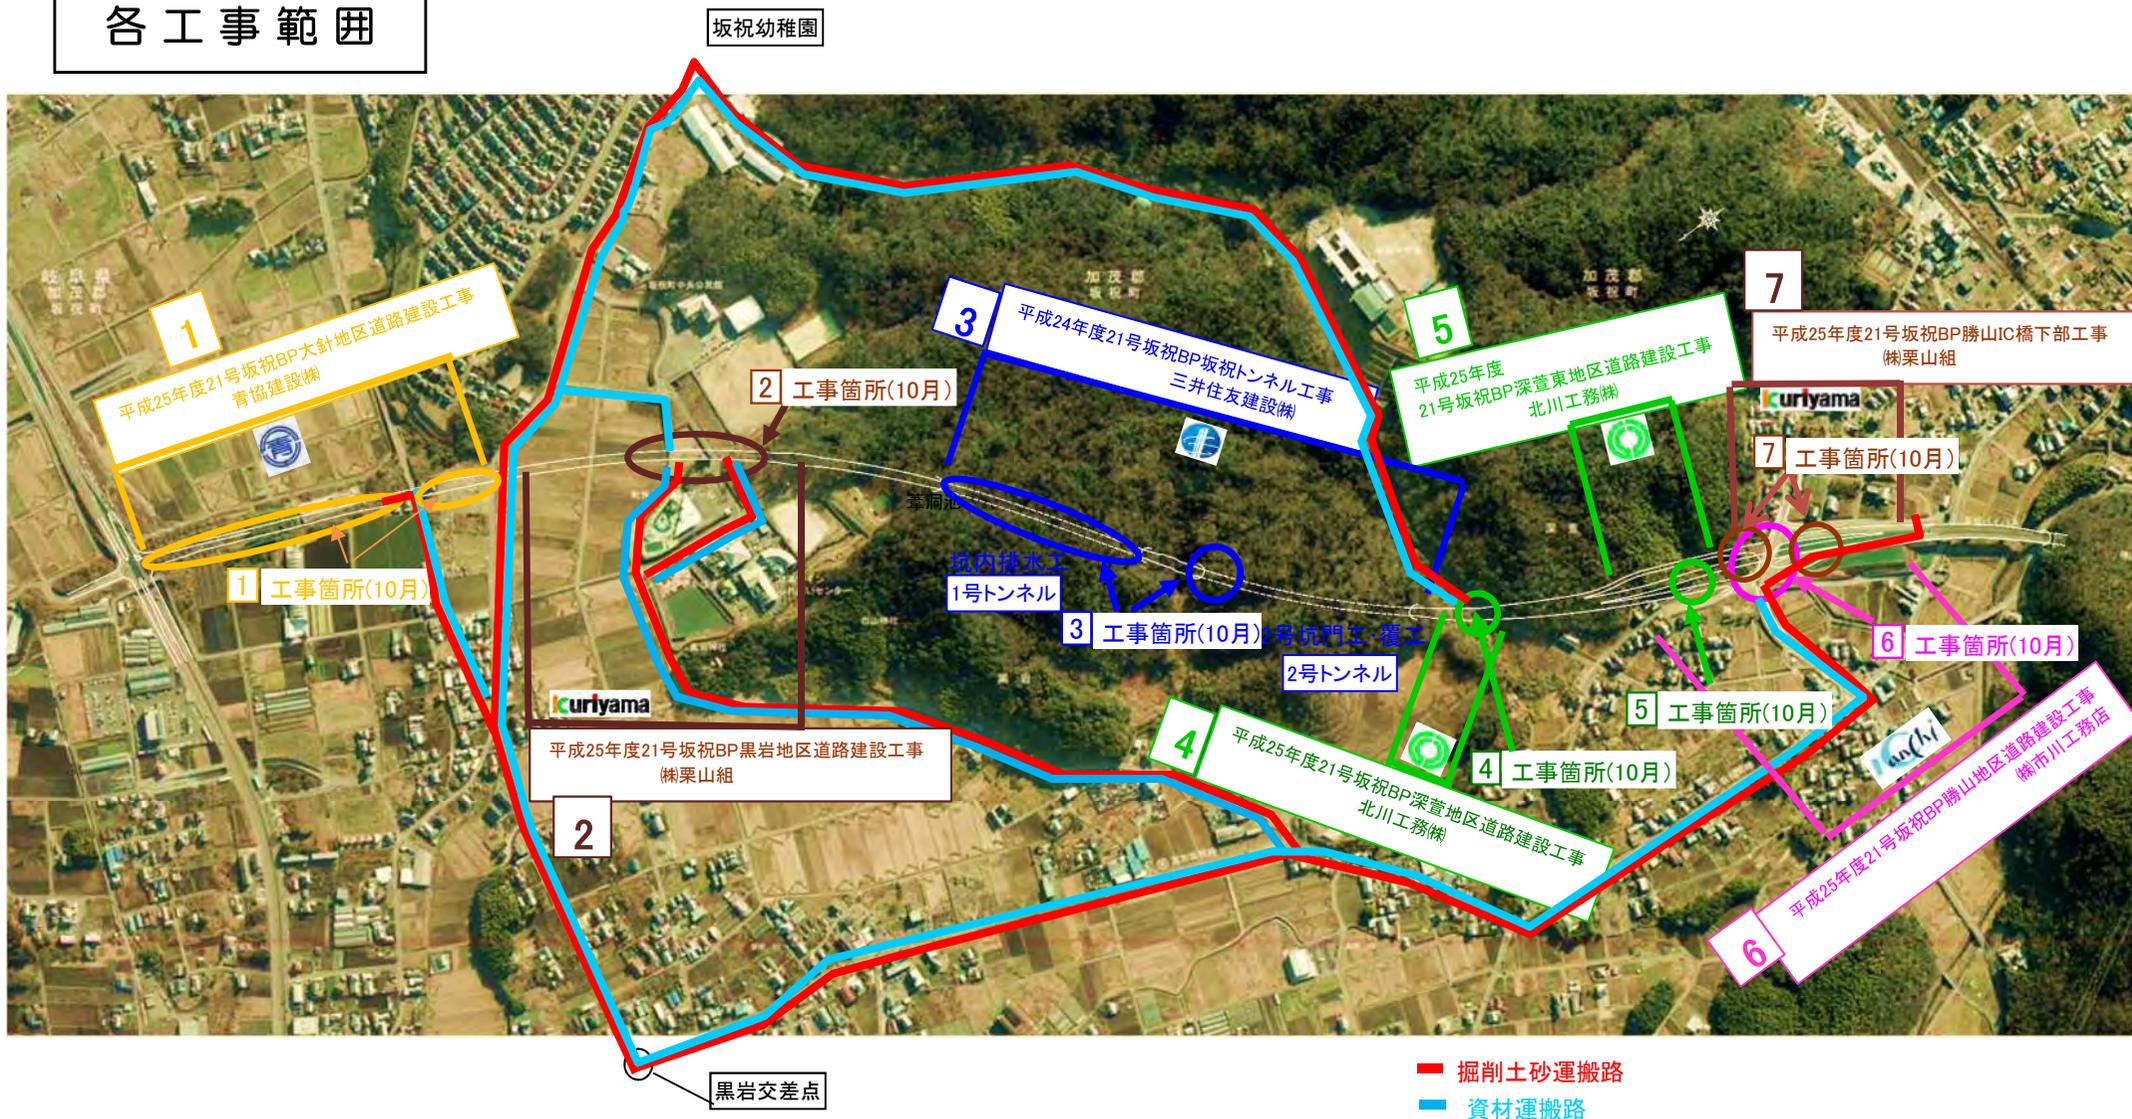

※各現場責任者のヘルメットには『現場代理人』・『監理技術者』と赤いシールが貼ってありますので、
お気軽にお声をおかけください。

現場代理人 監理技術者

平成26年10月（予定）

1

平成25年度 21号坂祝BP大針地区道路建設工事



業者名	青協建設(株)
現場代理人	後藤 光幸
現場事務所	0574-42-8056
進捗率（9月末）	16.0%

11月からのお知らせ
路体盛土工、仮設工、橋台工（掘削・基礎・杭頭処理・鉄筋・型枠）を行う予定です。

10月の作業予定
路体盛土工、排水工、仮設工（土留工）、橋台工（掘削・基礎・杭頭処理）を施工します。
ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願い致します。



路体盛土工
排水工

仮設工
橋台工

工事用車両の表示はオレンジ色です。



※現場事務所は坂祝町黒岩字宮前(加茂山団地駐車場内)にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

2


平成25年度 21号坂祝BP黒岩地区道路建設工事



業者名	(株) 栗山組
現場代理人	佐藤 卓也
現場事務所	0574-42-8640
進捗率（9月末）	72.0%

11月からのお知らせ
10月に続き、補強土壁工・路体盛土工・排水構造物工の施工を行う予定です。

10月の作業予定
場所打函渠工(4号・5号函渠)については、足場解体及び埋戻しを行い、補強土壁工(1号・3号・15号)及び路体盛土、排水構造物工を行って行きます。

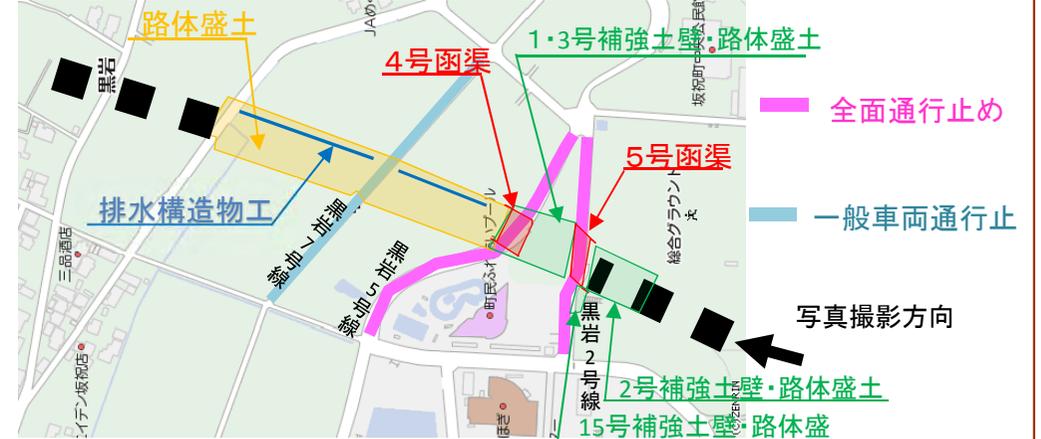

現場全景写真
9月中旬



工事用車両の表示は白色です。

平成26年 10月 (予定)

3

平成24年度 21号坂祝BP坂祝トンネル工事



業者名	三井住友建設(株)
現場代理人	西海 康弘
現場事務所	0574-23-0460
進捗率(9月末)	86.1%


11月からのお知らせ

11月は2号トンネルの防水工、覆工コンクリートの作業を行います。

10月の作業予定

10月は、1号トンネルでは坑内排水工の作業を行います。2号トンネルでは起点側坑門工の作業を行います。ご迷惑をお掛けいたしますがご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

10月の作業予定

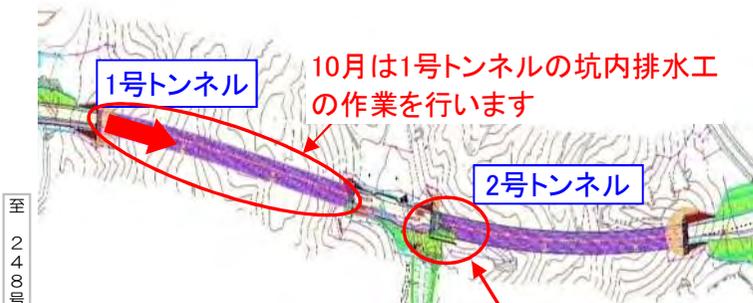

10月は1号トンネルの坑内排水工の作業を行います

10月は2号トンネルの起点側坑門工の作業を行います

至
2
4
8
号

至
鶴
沼

工事用車両の表示は青色です。



2号トンネル
防水工施工中

※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。お気づきの点かございましたら御連絡お願い申し上げます。

4

平成25年度 21号坂祝BP深萱地区道路建設工事




業者名	北川工務(株)
現場代理人	井戸 隆司
現場事務所	0574-49-7199
進捗率(9月末)	90.0%

11月からのお知らせ

11月は、ボックスカルバート内外の舗装工事、転落防止柵等の施工を予定しています。

10月の作業予定

10月は、ボックスカルバート周囲の排水構造物やボックスカルバート内の歩車道境界ブロック、照明の施工に入ります。工事も終盤となりました。引き続き、資材運搬車両等が通行します。ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

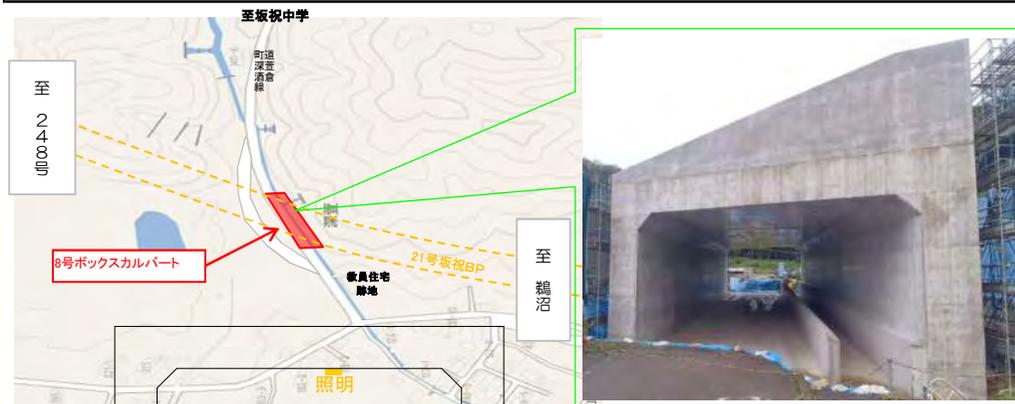

ボックスカルバート完成しました。

工事用車両の表示は緑色です。



10月からの施工予定箇所

※現場事務所は坂祝町深萱(教員住宅跡地)にあります。お気づきの点かございましたら御連絡お願い申し上げます。

平成26年 10月 (予定)

5

平成25年度 21号坂祝BP深萱東地区道路建設工事



業者名	北川工務(株)
現場代理人	奥村 嘉彦
現場事務所	0574-49-7199 (仮)
進捗率(9月末)	20.1%
11月からのお知らせ	
11月は、引き続き7号函渠本体工事及び本線盛土工事を行います。 又、町道深萱酒倉線(坂祝中学通学路)の復旧及び、切廻し道路の撤去を行います。 ご迷惑おかけしますが、ご注意くださいとご通行いただくようよろしくお願い致します。	
10月の作業予定	
7号函渠工の本体工事(足場・鉄筋・型枠、コンクリート打設)を行います。	



工事用車両の表示は緑色です。



※現場事務所は坂祝町深萱(教員住宅跡地)にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

6

平成25年度21号坂祝BP勝山地区道路建設工事



業者名	㈱市川工務店
現場代理人	山口 豪
現場事務所	0574-27-5380
進捗率(9月末)	62.0%
11月からのお知らせ	
地下道の東西出入口の工事を行います。 これが完成しますと、片付けをしまして私たちの工事は完了です。	
10月の作業予定	
地下道の東西出入口で屋根・手摺りを設置します。 これが終わりますと、工事が完了します。	

工事用車両の表示はピンク色です。



※現場事務所は現場の西側(坂祝町深萱79-6)にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

平成26年 10月（予定）

7

平成25年度 21号坂祝BP勝山IC橋下部工事

kuriyama

業者名	(株) 栗山組
現場代理人	桜井 正臣
現場事務所	0574-27-1335
進捗率（9月末）	40.3%

11月からのお知らせ

引続き橋台工（A2）の、鉄筋・型枠と施工をします。
又、橋台工（A1）も同様に、鉄筋・型枠と施工を進める予定です。

10月の作業予定

橋台工（A2）の、掘削・基礎工・均しコンの施工を行います。
又、橋台工（A1）は、掘削・基礎工・均しコン・鉄筋・型枠の施工を行います。
大変ご迷惑をお掛けしますがご協力お願いします。



※現場事務所は、（坂祝町町営住宅跡地）にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

工事用車両の表示は白色です。

