



国道21号線 坂祝バイパス工事のお知らせ

日毎に寒気加わる時節になりました。皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。工事中ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ひきつづきご理解、ご協力の程お願い致します。

又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願いいたします。尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。**平成26年11月の工事予定**をお知らせ致します。

発注者



工務第二課 0572-25-8025

中央公民館にご意見箱を設置しています。各工事についてお気づきの点がございましたら、ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所にてご意見を承ります。





お知らせ
国土交通省多治見砂防国道事務所HPを是非ご覧ください。


<http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogibp/>

多治見砂防国道事務所

検索



各工事範囲

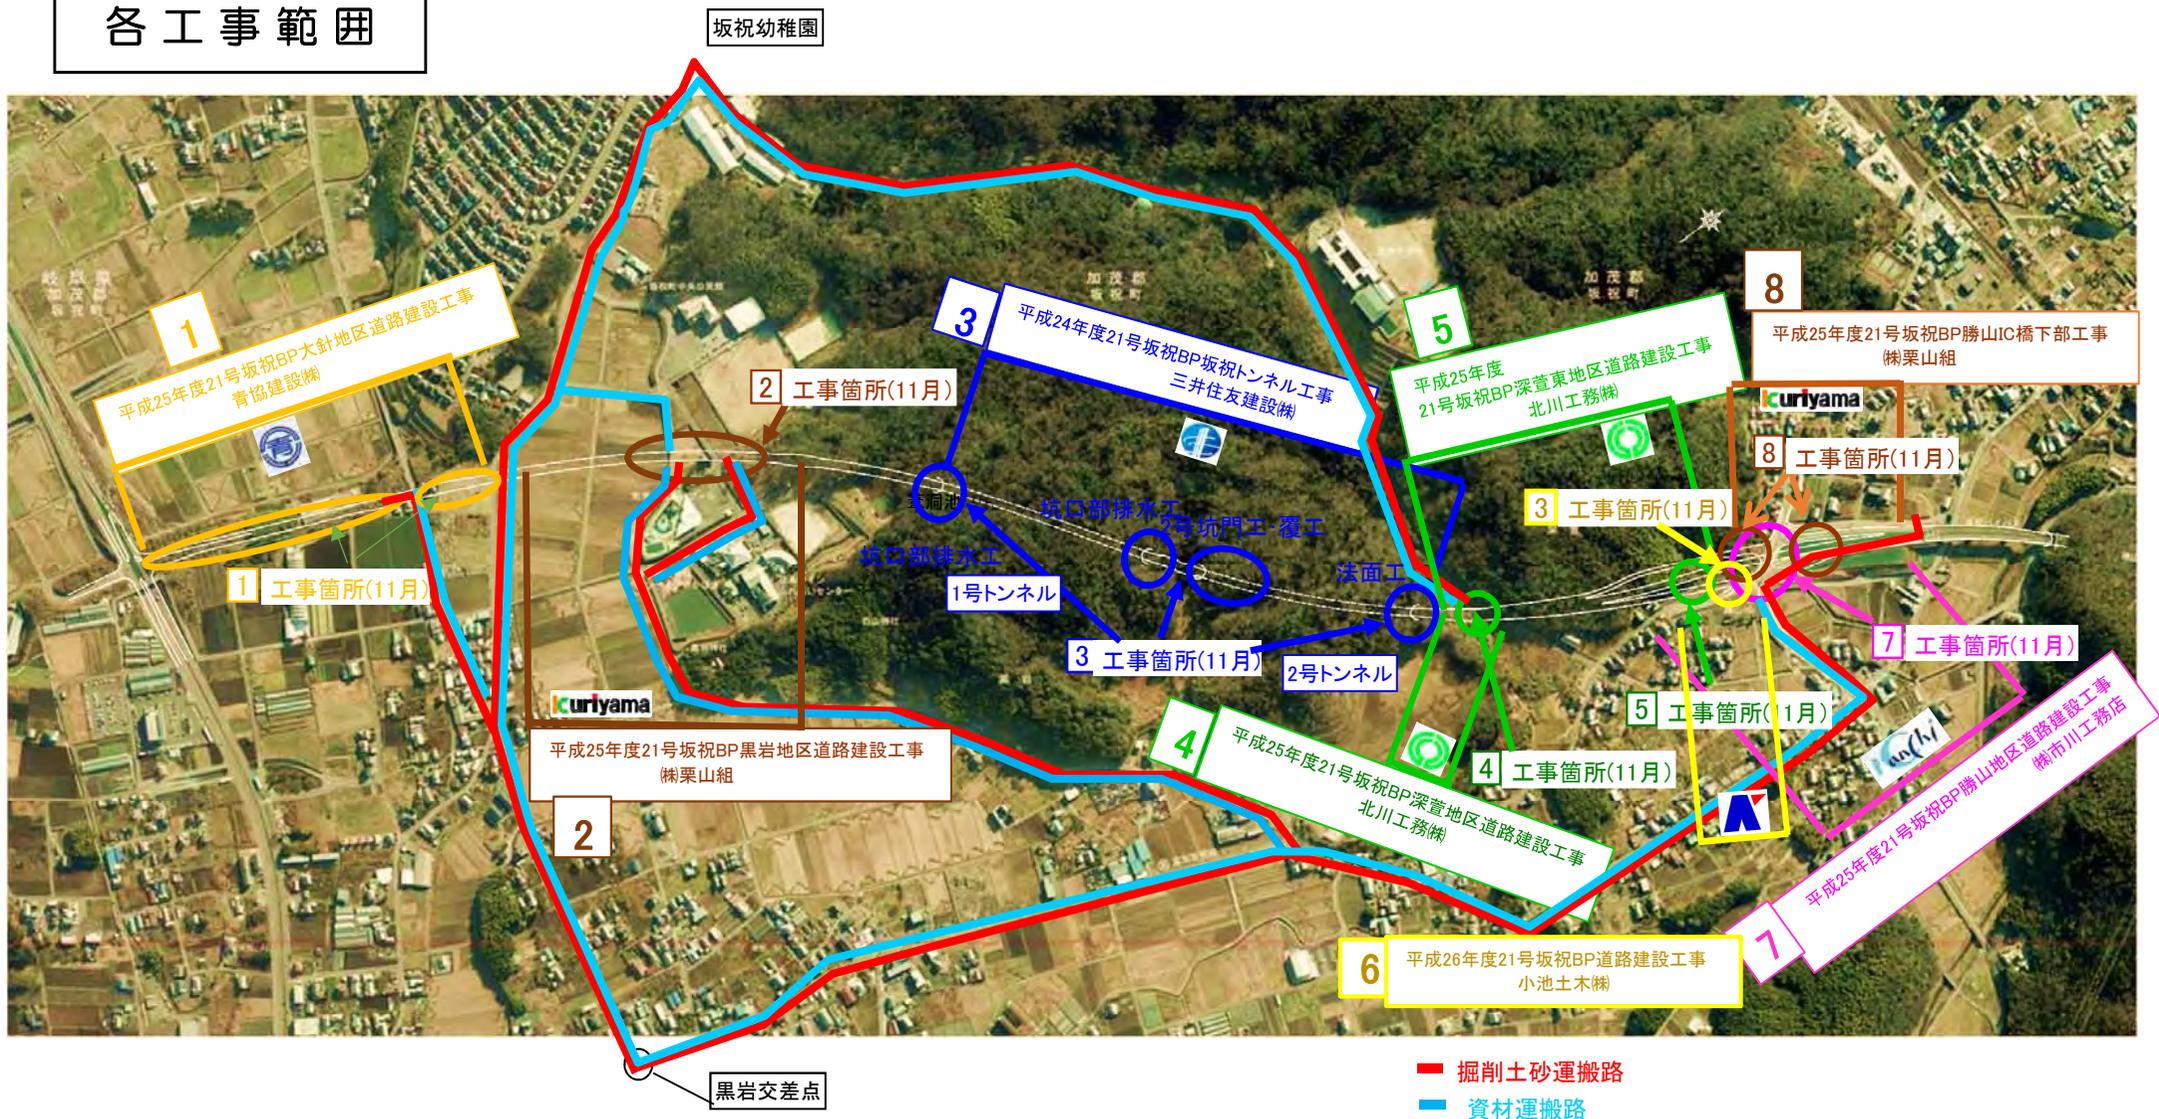

※各現場責任者のヘルメットには『現場代理人』・『監理技術者』と赤いシールが貼ってありますので、
お気軽にお声をおかけください。

現場代理人

監理技術者

平成26年11月（予定）

1

平成25年度 21号坂祝BP大針地区道路建設工事



業者名	青協建設(株)
現場代理人	後藤 光幸
現場事務所	0574-42-8056
進捗率（10月末）	32.0%
12月からのお知らせ	
橋台工（掘削・基礎・杭頭処理・鉄筋・型枠・コンクリート打設）仮設工（土留工）を行う予定です。	
11月の作業予定	
路体盛土工、排水工、仮設工（土留工）、橋台工（掘削・基礎・杭頭処理・鉄筋・型枠・コンクリート打設）を施工します。 ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願い致します。	



路体盛土工
排水工

仮設工
橋台工

工事用車両の表示オレンジ色です。




※現場事務所は坂祝町黒岩字宮前(加茂山団地駐車場内)にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡をお願い申し上げます。

2

平成25年度 21号坂祝BP黒岩地区道路建設工事



業者名	(株) 栗山組
現場代理人	佐藤 卓也
現場事務所	0574-42-8640
進捗率（10月末）	80.0%
12月からのお知らせ	
11月に続き、補強土壁工・路体盛土工・排水構造物工の施工を行う予定です。	
11月の作業予定	
場所打函渠工(4号・5号函渠)は、躯体の施工完了しました。補強土壁工（1号・3号）、重力式擁壁及び路体盛土、排水構造物工を行って行きます。	

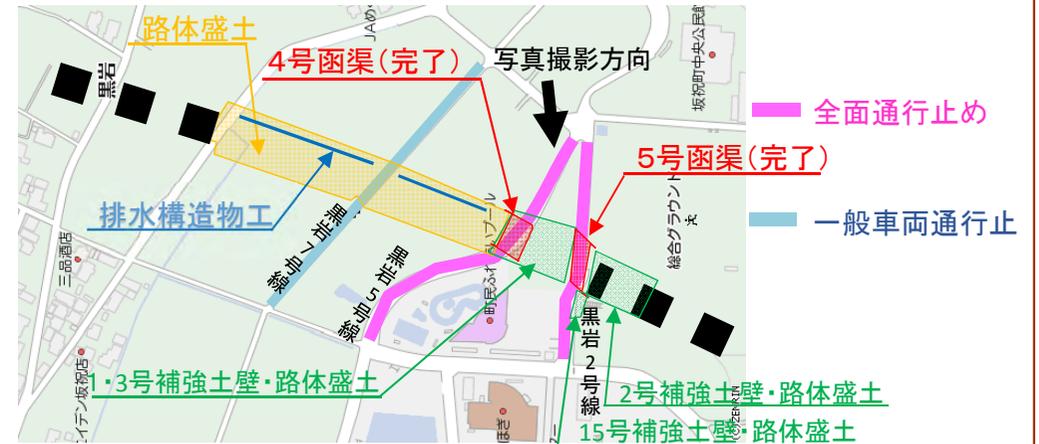

現場全景写真

10月中旬



工事用車両の表示は白色です。

平成26年 11月 (予定)

3

平成24年度 21号坂祝BP坂祝トンネル工事



業者名	三井住友建設(株)
現場代理人	西海 康弘
現場事務所	0574-23-0460
進捗率(10月末)	87.8%

12月からのお知らせ

12月は2号トンネルの覆工コンクリートの作業と坑口まわりの法面工、排水工の作業を行います。また、工事用道路の撤去作業を行っていきます。

11月の作業予定

11月は、1号トンネルでは坑口まわりの法面工と排水工の作業を行います。2号トンネルでは覆工コンクリート作業を行います。ご迷惑をお掛けいたしますがご理解・ご協力をよろしくお願い致します。



至 2400号



1号トンネル
終点側坑門工完成

11月は2号トンネルの覆工コンクリートの作業を行います

工事用車両の表示は青色です。



※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。お気づきの点かございましたら御連絡お願い申し上げます。

4

平成25年度 21号坂祝BP深萱地区道路建設工事




業者名	北川工務(株)
現場代理人	井戸 隆司
現場事務所	0574-49-7199
進捗率(10月末)	97.0%

12月からのお知らせ

11月14日をもって工事完成予定です。

11月の作業予定

工事の施工は10月で完了ですので、片付けを行います。引き続き、工事車両が通行します。ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

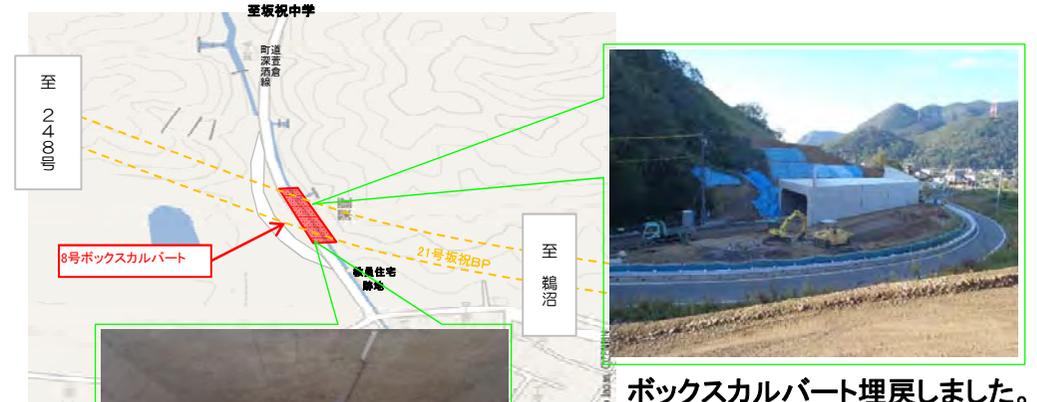

ボックスカルバート埋戻しました。

工事用車両の表示は青色です。



舗装、照明施工中です。

※現場事務所は坂祝町深萱(教員住宅跡地)にあります。お気づきの点かございましたら御連絡お願い申し上げます。

平成26年 11月 (予定)

5

平成25年度 21号坂祝BP深萱東地区道路建設工事



業者名	北川工務(株)
現場代理人	奥村 嘉彦
現場事務所	0574-49-7199
進捗率(10月末)	41.7%
12月からのお知らせ	
12月は、引き続き7号函渠本体工事及び本線盛土工事をを行います。 又、町道深萱酒倉線(坂祝中学通学路)箇所の8号函渠の取付けの擁壁を行う予定です。	
11月の作業予定	
7号函渠工の本体工事(足場・鉄筋・型枠、コンクリート打設)、切廻し道路撤去工を行います。	



工事用車両の表示は緑色です。

※現場事務所は坂祝町深萱(教員住宅跡地)にあります。
お気づきの点かございましたら御連絡お願い申し上げます。



6

平成26年度 21号坂祝BP道路建設工事



業者名	小池土木(株)
現場代理人	土田 裕紀
現場事務所	0574-62-1171(本社)
進捗率(10月末)	0.0%
12月からのお知らせ	
排水構造物工を行う予定です。	
11月の作業予定	
準備工になります。	

新しい工事です。勝山地区にて土工、排水工、擁壁工の工事を行います。ご迷惑をおかけしないよう進めて行きたいと思っておりますので、ご協力お願いいたします。



工事用車両の表示は黄色です。

※現場事務所は決まり次第お知らせいたします。



平成26年 11月（予定）


7

平成25年度21号坂祝BP勝山地区道路建設工事



業者名	(株)市川工務店
現場代理人	山口 豪
現場事務所	0574-27-5380
進捗率（10月末）	97.0%
12月からのお知らせ	
11月で現場作業は完了の予定です。	
11月の作業予定	
地下道の東西出入口の屋根・手摺りが完了しました。場内を整備して終わります。長い間、皆様にご迷惑をおかけしました。	

工事用車両の表示はピンク色です。

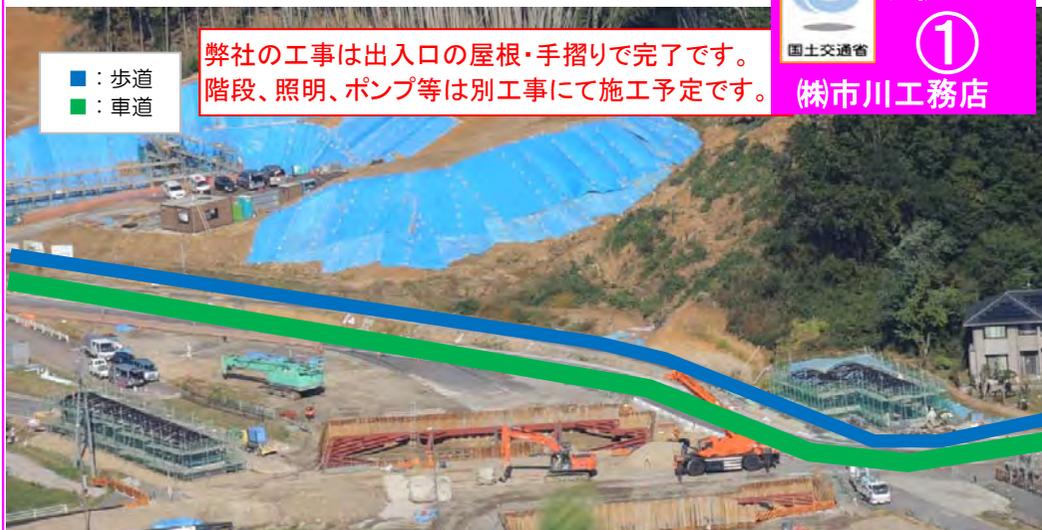

※現場事務所は現場の西側（坂祝町深営79-6）にあります。お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

8

平成25年度 21号坂祝BP勝山IC橋下部工事



業者名	(株)栗山組
現場代理人	桜井 正臣
現場事務所	0574-27-1335
進捗率（10月末）	52.0%
12月からのお知らせ	
引続き橋台工（A2）の、鉄筋・型枠と施工をいいます。又、橋台工（A1）も同様に、鉄筋・型枠の施工を進める予定です。	
11月の作業予定	
橋台工（A2）の、足場・鉄筋・型枠の施工を行います。又、橋台工（A1）も同様に、足場・鉄筋・型枠の施工を行います。大変ご迷惑をお掛けしますがご協力お願いします。	



※現場事務所は、（坂祝町町営住宅跡地）にあります。お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

工事用車両の表示は白色です。

