



国道21号線 坂祝バイパス工事のお知らせ

年末を迎え、何かとお忙しいことと存じます。皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。工事中ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ひきつづきご理解、ご協力の程お願い致します。

又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願いいたします。尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。平成26年12月の工事予定をお知らせ致します。

発注者



工務第二課 0572-25-8025

中央公民館にご意見箱を設置しています。
各工事についてお気づきの点がございましたら、
ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所
にてご意見を承ります。




お知らせ
国土交通省多治見砂防国道事務所HPを
是非ご覧ください。


<http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogibp/>

多治見砂防国道事務所

検索



各工事範囲

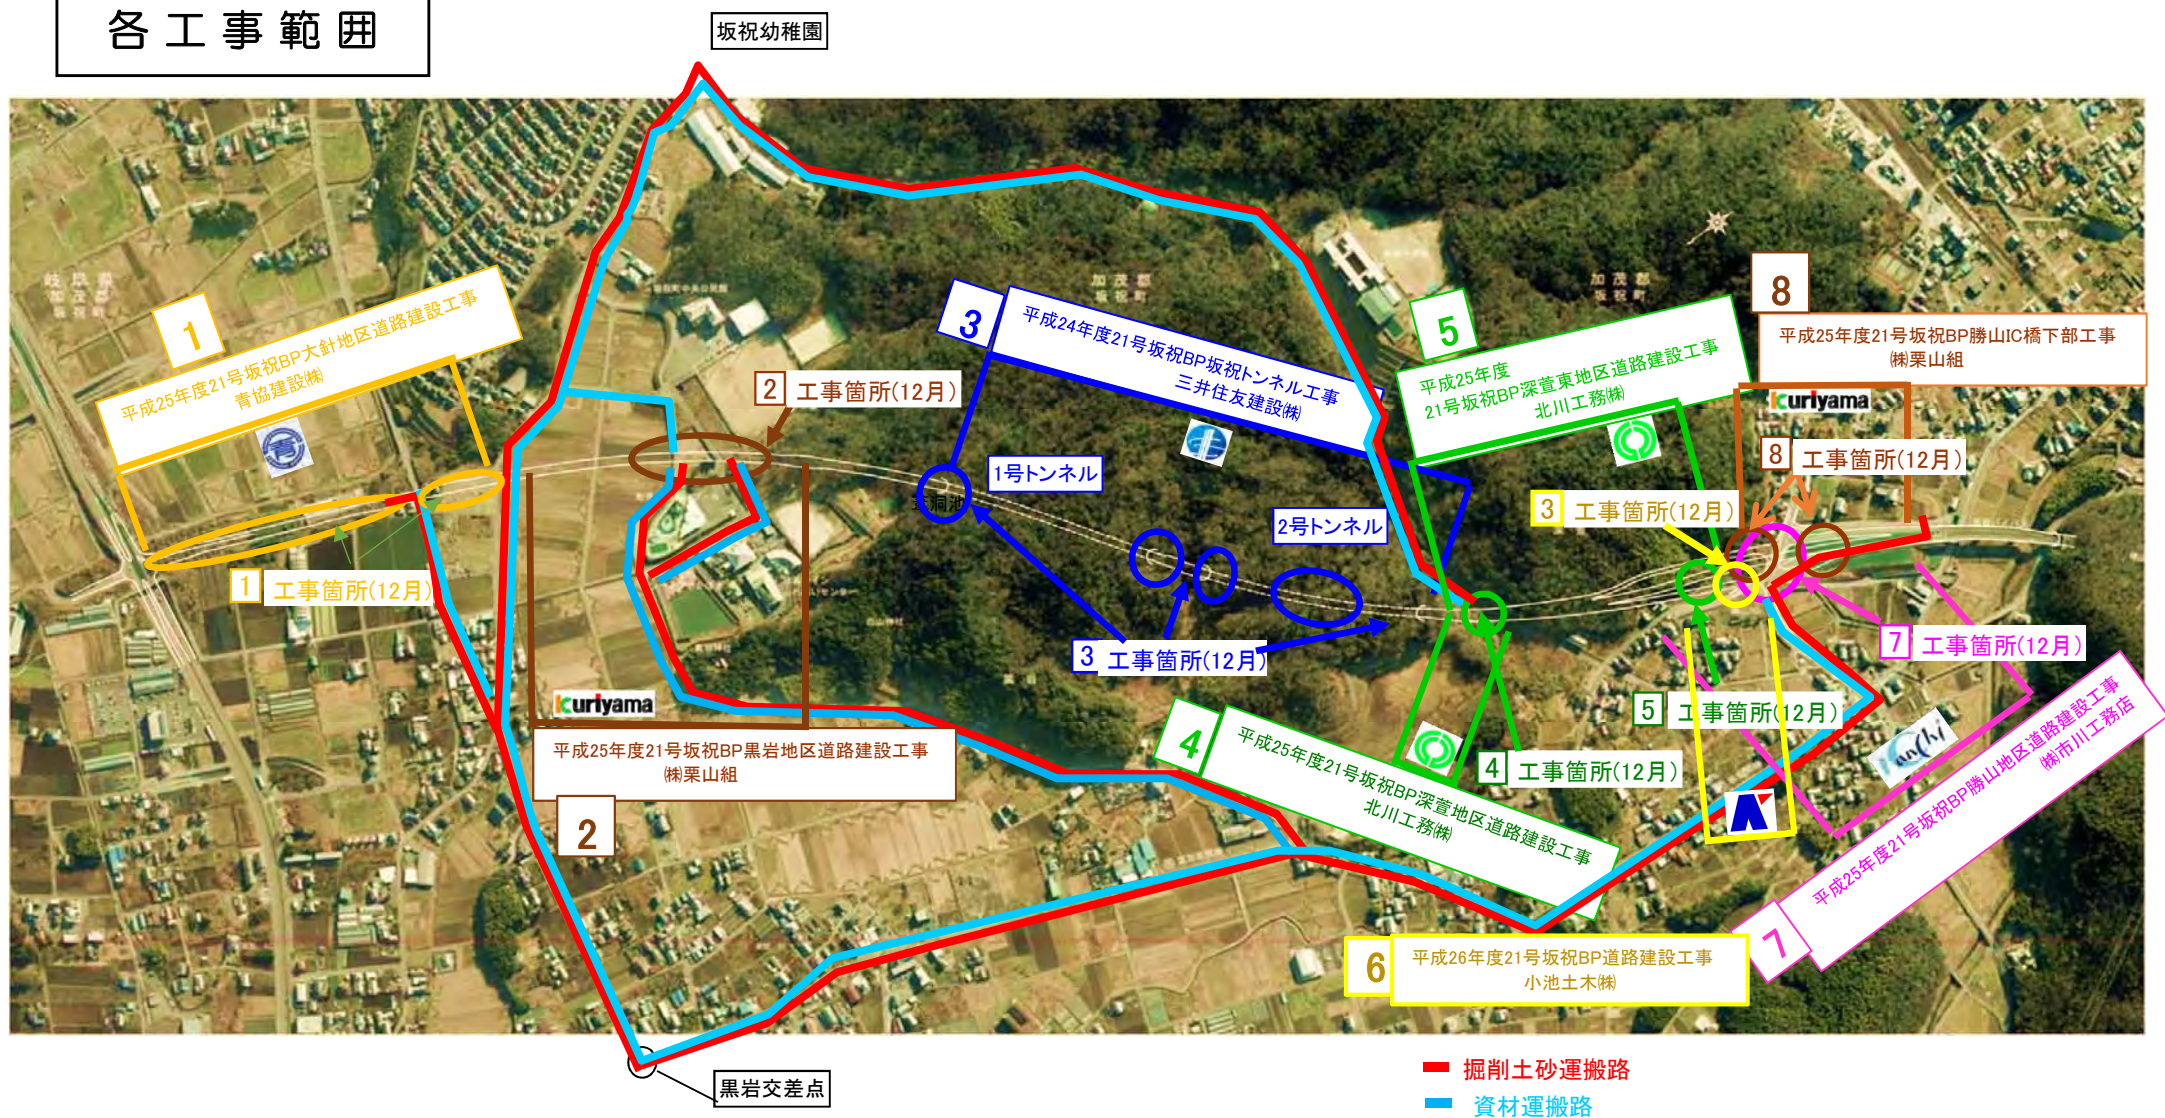

※各現場責任者のヘルメットには『現場代理人』・『監理技術者』と赤いシールが貼ってありますので、お気軽にお声をおかけください。

現場代理人

監理技術者

平成26年12月（予定）

1

平成25年度 21号坂祝BP大針地区道路建設工事



業者名	青協建設(株)
現場代理人	後藤 光幸
現場事務所	0574-42-8056
進捗率（11月末）	47.0%
1月からのお知らせ	
橋台工（鉄筋・型枠・足場・コンクリート打設）仮設工（土留工）を行う予定です。	
12月の作業予定	
橋台工（掘削・基礎・杭頭処理・鉄筋・型枠・足場・コンクリート打設）、路体盛土工を施工します。 ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願い致します。	



現場全景写真



工事用車両の表示オレンジ色です。




※現場事務所は坂祝町黒岩字宮前(加茂山団地駐車場内)にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

2

平成25年度 21号坂祝BP黒岩地区道路建設工事

kuriyama

業者名	(株) 栗山組
現場代理人	佐藤 卓也
現場事務所	0574-42-8640
進捗率（11月末）	83.0%
1月からのお知らせ	
12月に続き、補強土壁工・路体盛土工・排水構造物工の施工を行う予定です。	
12月の作業予定	
補強土壁工（1号）及び路体盛土、排水構造物工を行って行きます。	

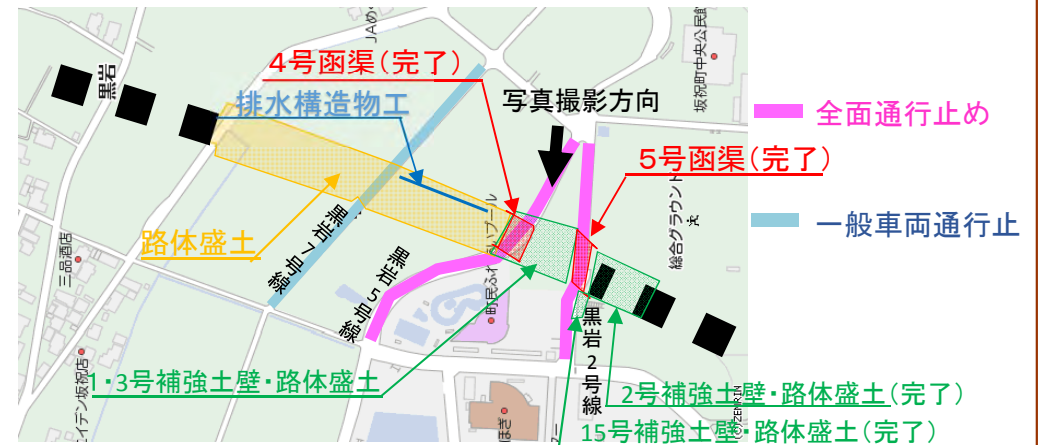

現場全景写真

11月中旬



工事用車両の表示は白色です。

平成26年 12月（予定）

3

平成24年度 21号坂祝BP坂祝トンネル工事




業者名	三井住友建設(株)
現場代理人	西海 康弘
現場事務所	0574-23-0460
進捗率（11月末）	91.2%

1月からのお知らせ

1月は2号トンネルの覆工コンクリートの作業と坑口まわりの法面工、排水工の作業を行います。また、工事用道路の撤去作業を行っていきます。

12月の作業予定

12月は、坑口まわりの法面工と排水工の作業を行います。2号トンネルでは覆工コンクリート作業を行います。ご迷惑をお掛けいたしますがご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

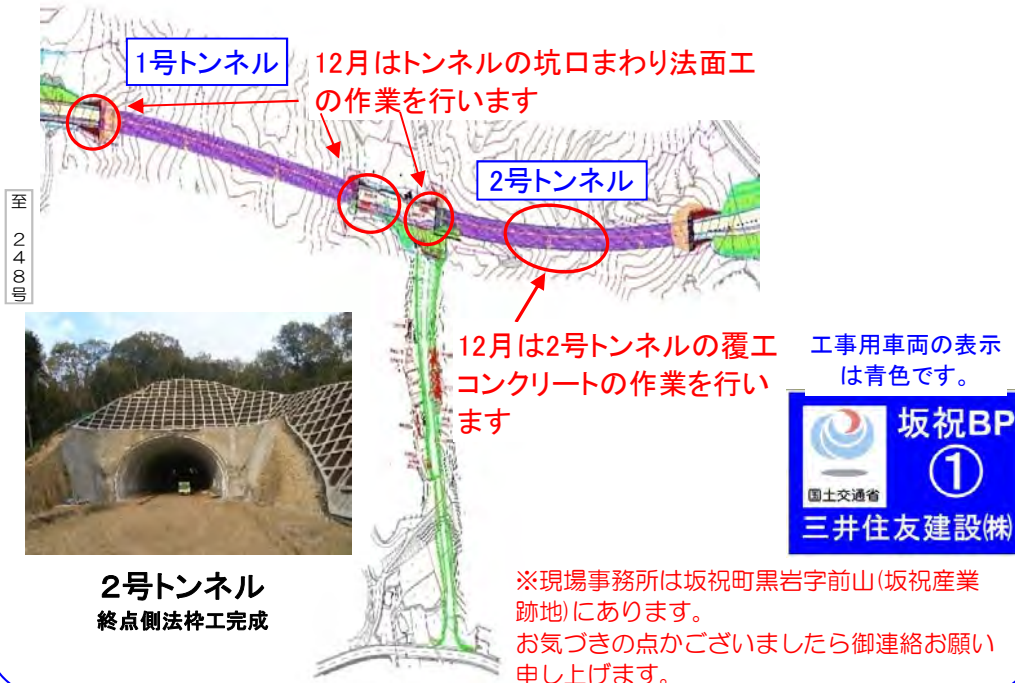

4

平成25年度 21号坂祝BP深萱地区道路建設工事



業者名	北川工務(株)
現場代理人	井戸 隆司
現場事務所	0574-49-7199
進捗率（11月末）	100%

お知らせ

11月12日をもちまして、無事に工事を完了することが出来ました。皆様のご理解・ご協力で心より感謝申し上げます。

完了



工事全体として約15ヶ月の間、皆様のご理解のもとに工事を施工できたことに御礼申し上げます。

平成26年 12月（予定）

5

平成25年度 21号坂祝BP深萱東地区道路建設工事



業者名	北川工務(株)
現場代理人	奥村 嘉彦
現場事務所	0574-49-7199
進捗率（11月末）	52.5%
1月からのお知らせ	
1月は、7号函渠工の埋戻し作業を行います。 又、町道深萱酒倉線(坂祝中学通学路)箇所の8号函渠の取付けの擁壁、本線盛土工事を行う予定です。	
12月の作業予定	
7号函渠工の本体工事(足場・鉄筋・型枠、コンクリート打設)、掘削工、路体盛土工、地盤改良工を行います。	



工事用車両の表示は緑色です。

※現場事務所は坂祝町深萱（教員住宅跡地）にあります。
お気づきの点かございましたら御連絡お願い申し上げます。



6

平成26年度 21号坂祝BP道路建設工事



業者名	小池土木(株)
現場代理人	土田 裕紀
現場事務所	0574-62-1171(本社)
進捗率（11月末）	1.3%
1月からのお知らせ	
排水構造物工事、擁壁工事、地下道内の照明施設工事を行う予定です。	
12月の作業予定	
擁壁工事及び構造物取壊工を行います。	



工事用車両の表示は黄色です。

※現場事務所は決まり次第お知らせいたします。



平成26年 12月（予定）

7

平成25年度21号坂祝BP勝山地区道路建設工事



業者名	㈱市川工務店
現場代理人	山口 豪
現場事務所	058-251-2244(本社)
進捗率（11月末）	100.0%

お知らせ

11月をもちまして、無事に工事を完了することが出来ました。皆様のご理解・ご協力に心より感謝申し上げます。

完了

左出入口



右出入口



約13ヶ月の間、皆様のご理解のもとに工事を施工できたことに御礼申し上げます。
弊社の工事はこれで完了ですが、階段、照明、ポンプ等は別工事にて施工予定です。
横断地下道使用可能までしばらくお待ちください。

8

平成25年度 21号坂祝BP勝山IC橋下部工事



業者名	(株) 栗山組
現場代理人	桜井 正臣
現場事務所	0574-27-1335
進捗率（11月末）	68.0%

1月からのお知らせ

引続き橋台工（A2）の、壁鉄筋・壁型枠・コンクリート打設と施工をします。
又、橋台工（A1）も同様に、壁鉄筋・壁型枠・コンクリート打設と施工を進める予定です。

12月の作業予定

橋台工（A2）の、足場・壁鉄筋・壁型枠・コンクリート打設の施工を行います。
又、橋台工（A1）も同様に、足場・壁鉄筋・壁型枠・コンクリート打設の施工を行います。
大変ご迷惑をお掛けしますがご協力お願いします。



※現場事務所は、（坂祝町町営住宅跡地）にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

工事用車両の表示は白色です。

