



国道21号線 坂祝バイパス工事のお知らせ

立春とは名ばかりの厳しい寒さが続いています、皆様いかがお過ごしでしょうか。

皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。工事中ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、引き続きご理解、ご協力の程お願い致します。

又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願い致します。

尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。**平成27年2月の工事予定**をお知らせ致します。

発注者



工務第二課 0572-25-8025

中央公民館にご意見箱を設置しています。
各工事についてお気づきの点がございましたら、
ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所に
てご意見を承ります。




お知らせ

国土交通省多治見砂防国道事務所HPを
是非ご覧ください。


[http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/
r21/sakahogibp/](http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogibp/)

多治見砂防国道事務所

検索



各工事範囲

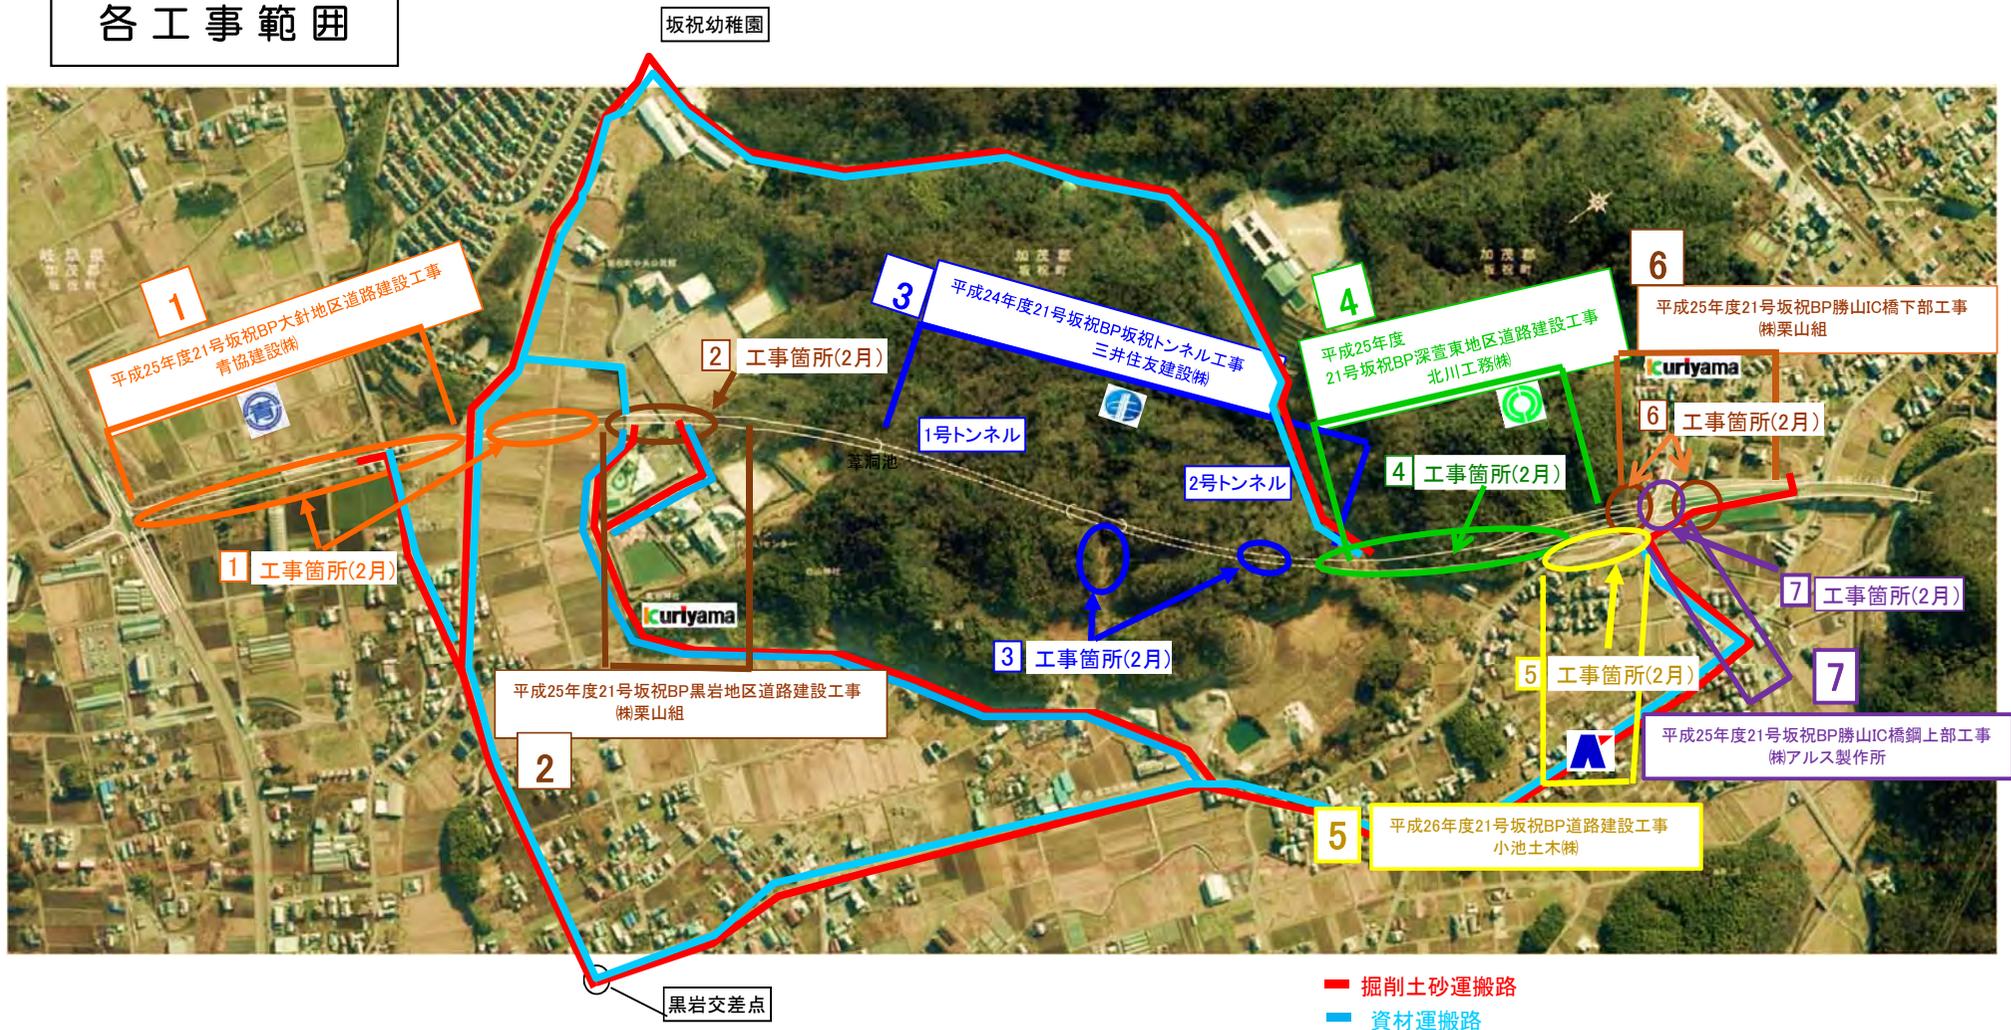

※各現場責任者のヘルメットには『現場代理人』・『監理技術者』と赤いシールが貼ってありますので、お気軽にお声をおかけください。

現場代理人

監理技術者

平成27年2月（予定）

1

平成25年度 21号坂祝BP大針地区道路建設工事



業者名	青協建設(株)
現場代理人	後藤 光幸
現場事務所	0574-42-8056
進捗率（1月末）	61.0%

3月からのお知らせ
橋台工（鉄筋・型枠・足場・コンクリート打設）仮設工(土留工)を行う予定です。

2月の作業予定
橋台工（埋戻し・鉄筋・型枠・足場・コンクリート打設）、仮設工(土留工)、土工、土質改良工を施工します。 ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願い致します。



※現場事務所は坂祝町黒岩字宮前(加茂山団地駐車場内)にあります。お気づきの点がございましたら御連絡をお願い申し上げます。



2

平成25年度 21号坂祝BP黒岩地区道路建設工事



業者名	(株) 栗山組
現場代理人	佐藤 卓也
現場事務所	0574-42-8640
進捗率（1月末）	95.0%

3月からのお知らせ
排水構造物工・町道舗装工の施工を行う予定です。

2月の作業予定
路体盛土、排水構造物工、照明施設等を行って行きます。



現場全景写真 1月中旬



工事用車両の表示は白色です。

3

平成24年度 21号坂祝BP坂祝トンネル工事



業者名	三井住友建設(株)
現場代理人	西海 康弘
現場事務所	0574-23-0460
進捗率(1月末)	97.1%

3月からのお知らせ

3月は2号トンネル勝山側坑口まわりの法面工、排水工の作業を行います。

2月の作業予定

2月は2号トンネル勝山側の坑門工と坑口まわりの法面工、排水工の作業を行います。また、工事用道路の撤去作業を行っていきます。



工事用車両の表示は青色です。



4

平成25年度 21号坂祝BP深萱東地区道路建設工事



業者名	北川工務(株)
現場代理人	奥村 嘉麿
現場事務所	0574-49-7199
進捗率(1月末)	75.3%

3月からのお知らせ

3月も引き続き本線切土・盛土、排水構造物工及び7号函渠の埋戻しを行います。又、町道深萱酒倉線(坂祝中学通学路)箇所の8号函渠の取付けの擁壁工事を行う予定です。

2月の作業予定

本線盛土(路体盛土工)、法面整形作業を行います。



平成27年 2月 (予定)

5

平成26年度 21号坂祝BP道路建設工事



業者名	小池土木(株)
現場代理人	土田 裕紀
現場事務所	0574-25-6775
進捗率(1月末)	18.1%

3月からのお知らせ

排水構造物工事、擁壁工事、地下道内の歩床工事、電気引込工事を行う予定です。

2月の作業予定

地盤改良工事、擁壁工事、構造物取壊工事、排水構造物工事、水道本管布設工事、地下道内の歩床工事を行います。



※現場事務所は坂祝町深堂にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。



6

平成25年度 21号坂祝BP勝山IC橋下部工事



業者名	(株) 栗山組
現場代理人	桜井 正臣
現場事務所	0574-27-1335
進捗率(1月末)	93.0%

3月からのお知らせ

2月をもちまして、橋台工が完了となります。皆様のご理解・ご協力に心より感謝申し上げます。

2月の作業予定

橋台工(A2)の、足場解体・埋戻し・矢板引抜きを行います。
又、橋台工(A1)も同様に、足場解体・埋戻し・矢板引抜きを行います。
大変ご迷惑をお掛けしますがご協力お願いします。



※現場事務所は、(坂祝町町営住宅跡地)にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

工事用車両の表示は白色です。



平成27年 2月（予定）

7

平成25年度21号坂祝BP勝山IC橋鋼上部工事

業者名	(株)アルス製作所
現場代理人	坂本 新太郎
現場事務所	0574-25-6840
進捗率（1月末）	69.5%

3月からのお知らせ

3月は鋼橋架設工・橋梁足場等設置工の施工を行う予定です。

2月の作業予定

2月下旬より現場工事を着工し、測量等準備作業を行います。



※現場事務所は坂祝町酒倉にあります。
お気付きの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

勝山IC橋に鋼製の橋桁を架設する工事です。2月下旬より準備作業に着手し、3月から大型クレーンを使って橋桁の架設を行います。



勝山インター橋イメージ
