



## 国道21号線 坂祝バイパス工事のお知らせ

春まだ浅い今日このごろでございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。工事中ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ひきつづきご理解、ご協力の程お願い致します。

又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願い致します。

尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。**平成27年3月の工事予定**をお知らせ致します。

発注者



工務第二課 0572-25-8025

中央公民館にご意見箱を設置しています。  
各工事についてお気づきの点がございましたら、  
ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所  
にてご意見を承ります。



お知らせ

国土交通省多治見砂防国道事務所HPを  
是非ご覧ください。

[http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/  
r21/sakahogibp/](http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogibp/)

多治見砂防国道事務所

検索




工事の進捗に伴い下記の道路の供用、交通規制解除を行います。

○勝山地区にて工事を行っている横断地下歩道「勝山地下道」について4月1日(水)より供用します。

○黒岩地区（中央公民館、サンライフ坂祝周辺）の町道黒岩2号線、5号線、7号線について3月末に交通規制を解除します。  
※実際の規制解除日については確定次第、現地看板等により周知します。



# 各工事範囲

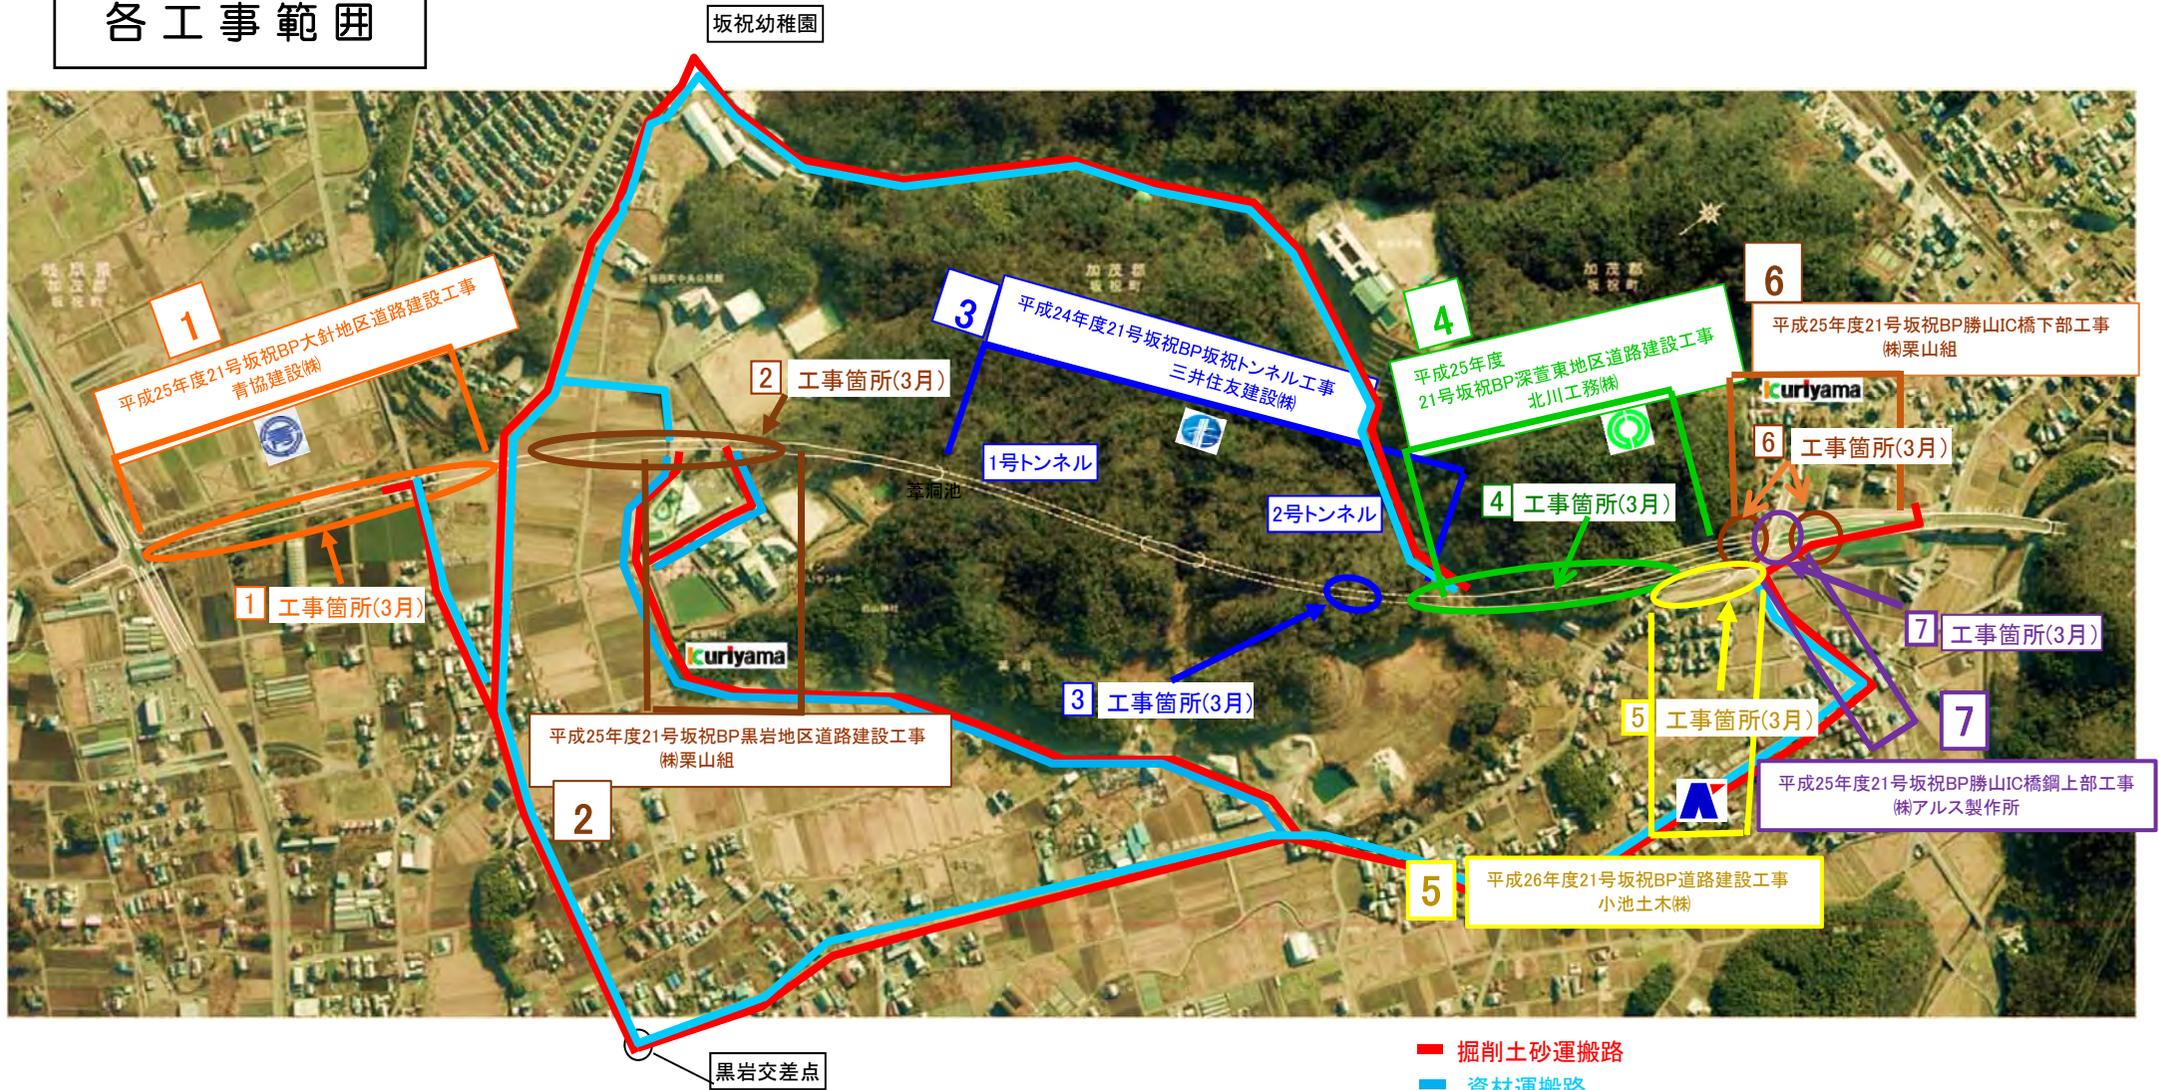

※各現場責任者のヘルメットには『現場代理人』・『監理技術者』と赤いシールが貼ってありますので、お気軽にお声をおかけください。

現場代理人

監理技術者

平成27年3月（予定）

1

平成25年度 21号坂祝BP大針地区道路建設工事



|  |              |
|--|--------------|
| 業者名  | 青協建設(株)      |
| 現場代理人  | 後藤 光幸        |
| 現場事務所  | 0574-42-8056 |
| 進捗率（2月末）   | 66.3%        |
| <b>4月からのお知らせ</b>   |              |
| 橋台工（埋戻し・鉄筋・型枠・足場・コンクリート打設）、仮設工（土留工）、土工を行う予定です。                               |              |
| <b>3月の作業予定</b>   |              |
| 橋台工（埋戻し・鉄筋・型枠・足場・コンクリート打設）、仮設工（土留工）、土工を施工します。ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願い致します。 |              |

2

平成25年度 21号坂祝BP黒岩地区道路建設工事



|  |              |
|--|--------------|
| 業者名  | (株) 栗山組      |
| 現場代理人  | 佐藤 卓也        |
| 現場事務所  | 0574-42-8640 |
| 進捗率（2月末）   | 98.0%        |
| <b>お知らせ</b>  |              |
| 3月末頃に、今まで通行止めしていました町道（町道黒岩2号・5号・7号線）について通行止めの解除を行う予定です。<br>また、3月末にて当現場の工事完了する予定です。 |              |
| <b>3月の作業予定</b>   |              |
| 路体盛土・法面整形、歩行道ブロック、舗装工事を行って行きます。  |              |




橋台工  
仮設工

工事用車両の表示オレンジ色です。



※現場事務所は坂祝町黒岩字宮前(加茂山団地駐車場内)にあります。  
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

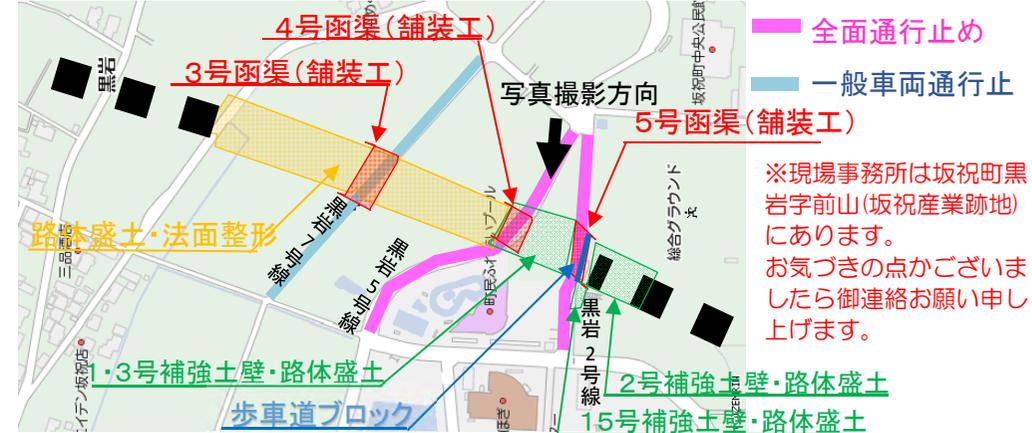

全面通行止め  
一般車両通行止

※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。  
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

現場全景写真

2月中旬



工事用車両の表示は白色です。

平成27年 3月（予定）

3

平成24年度 21号坂祝BP坂祝トンネル工事



|  |              |
|--|--------------|
| 業者名  | 三井住友建設(株)    |
| 現場代理人  | 西海 康弘        |
| 現場事務所  | 0574-23-0460 |
| 進捗率（2月末）   | 97.7%        |
| 4月からのお知らせ<br>4月は工事現場内の最終整備および片付け作業になります。                                 |              |
| 3月の作業予定<br>3月は2号トンネル勝山側坑口まわりの法面工、排水工の作業を行います。また、2号トンネル内の整地と工事用道路撤去を行います。 |              |



4

平成25年度 21号坂祝BP深萱東地区道路建設工事



|  |              |
|--|--------------|
| 業者名  | 北川工務(株)      |
| 現場代理人  | 奥村 嘉麿        |
| 現場事務所  | 0574-49-7199 |
| 進捗率（2月末）   | 75.3%        |
| お知らせ<br>3月末日に今回工事完成予定です。皆様には、大変ご迷惑をお掛けしましたがご協力ありがとうございました。 |              |
| 3月の作業予定<br>2月に引続き、本線盛土(路体盛土工)・盛土法面整形・排水構造物を作業を行います。        |              |



平成27年 3月（予定）

5

### 平成26年度 21号坂祝BP道路建設工事



|          |              |
|----------|--------------|
| 業者名      | 小池土木(株)      |
| 現場代理人    | 土田 裕紀        |
| 現場事務所    | 0574-25-6775 |
| 進捗率（2月末） | 50.8%        |

#### お知らせ

3月をもちまして、工事が完了となります。皆様のご理解、ご協力に心より感謝申し上げます。  
地下横断歩道（勝山地下道）について、4月1日より供用の予定です。

#### 3月の作業予定

土工事、擁壁工事、構造物取壊工事、排水構造物工事、水道本管布設工事、地下道内の歩床工事、電気工事を行います。



※現場事務所は坂祝町深菅にあります。  
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

6

### 平成25年度 21号坂祝BP勝山IC橋下部工事



|          |              |
|----------|--------------|
| 業者名      | (株) 栗山組      |
| 現場代理人    | 桜井 正臣        |
| 現場事務所    | 0574-27-1335 |
| 進捗率（2月末） | 98.0%        |

#### 3月の作業予定

3月をもちまして全工事を終了します。  
皆様には、大変ご迷惑をお掛けしましたがご協力ありがとうございました。



※現場事務所は、(坂祝町町営住宅跡地)にあります。  
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

工事用車両の表示は白色です。



平成27年 3月（予定）

7

### 平成25年度21号坂祝BP勝山IC橋鋼上部工事

|   |              |
|---|--------------|
| 業者名   | (株)アルス製作所    |
| 現場代理人   | 坂本 新太郎       |
| 現場事務所   | 0574-25-6840 |
| 進捗率（2月末）  | 72.6%        |
| <b>4月からのお知らせ</b><br>4月は現場塗装工、巻き立てコンクリート工の施工を行う予定です。 |              |
| <b>3月の作業予定</b><br>3月は鋼橋架設工、橋梁足場等設置工の施工を行います。        |              |



※現場事務所は坂祝町酒倉にあります。  
お気付きの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。
