



国道21号線 坂祝バイパス工事のお知らせ

草花のつぼみが膨らみ始め、陽の光も輝きを増す今日この頃、如何お過ごしでしょうか。

地域の皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。工事中ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ひきつづきご理解、ご協力の程お願い致します。

又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願い致します。

尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。**平成27年4月の工事予定**をお知らせ致します。

発注者



工務第二課 0572-25-8025

中央公民館にご意見箱を設置しています。
各工事についてお気づきの点がございましたら、
ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所に
てご意見を承ります。




お知らせ

国土交通省多治見砂防国道事務所HPを是非ご覧ください。


<http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogib/>

多治見砂防国道事務所

検索



各工事範囲

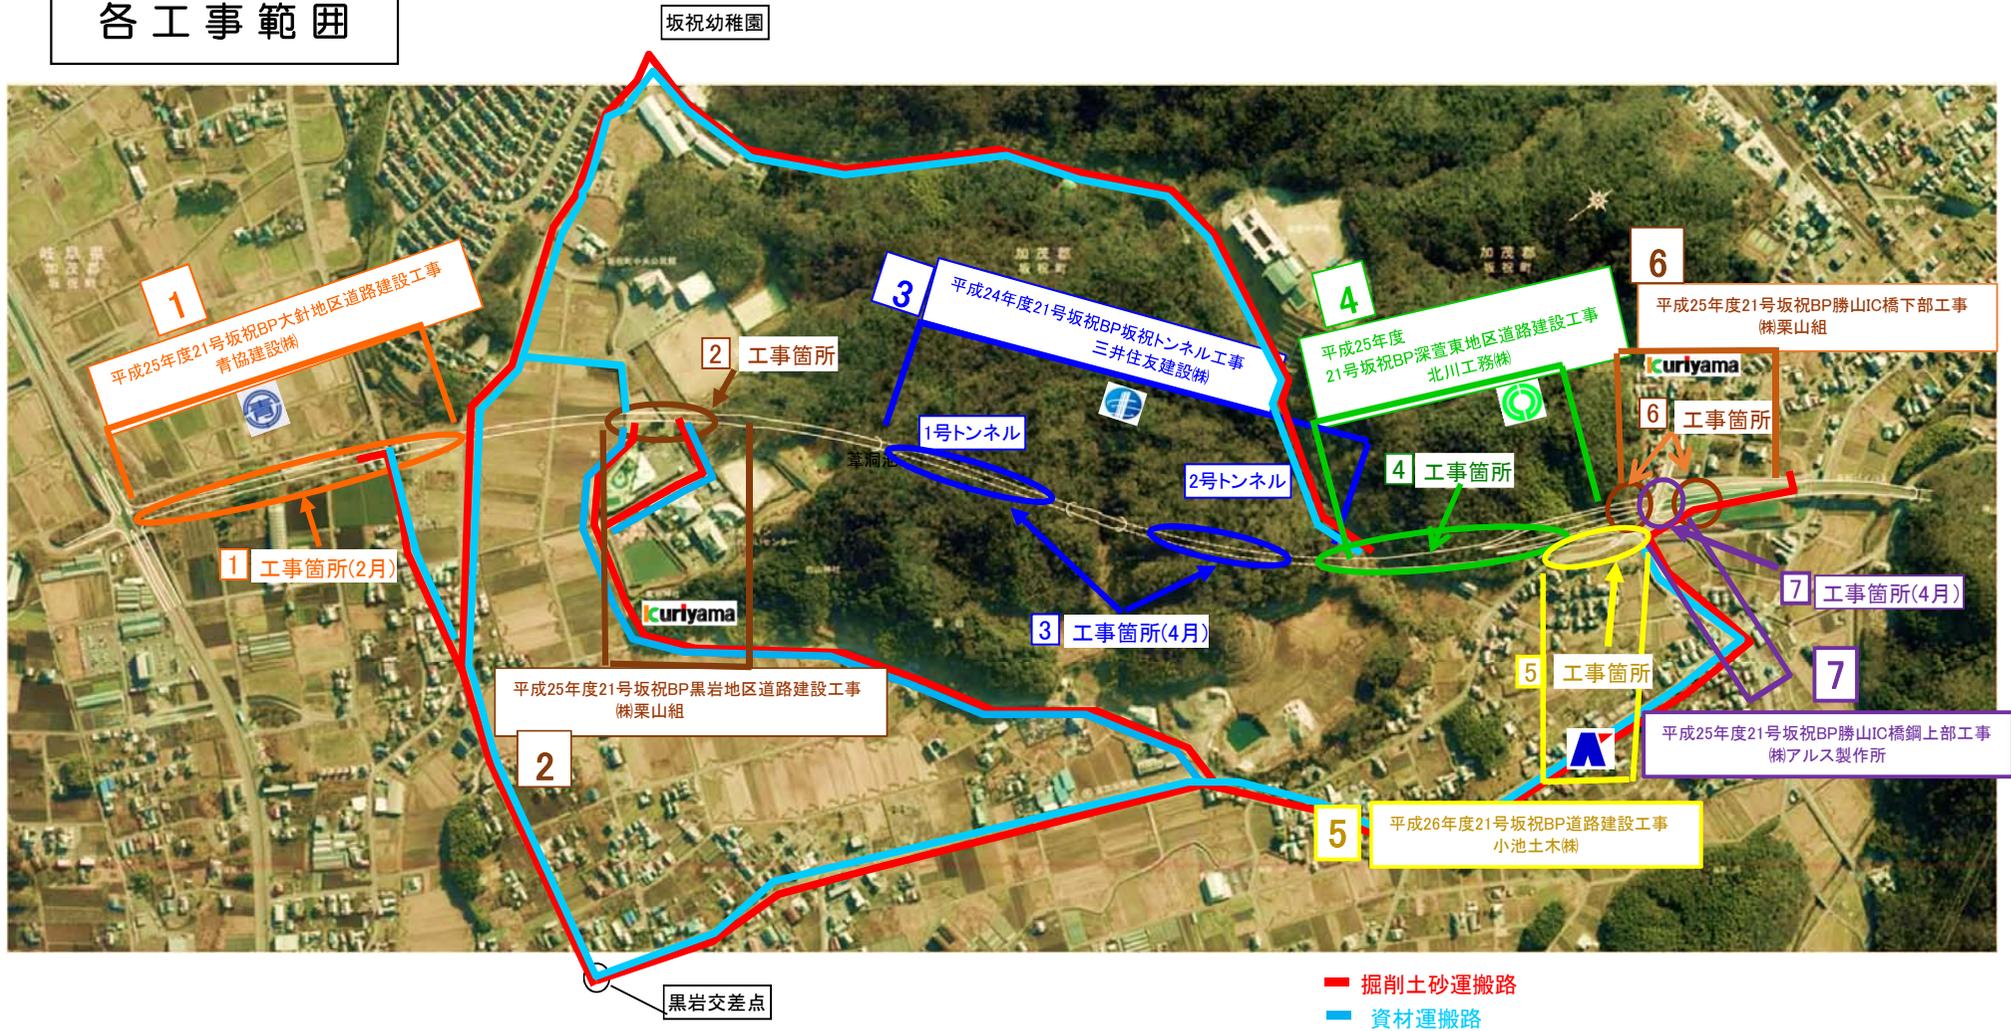

※各現場責任者のヘルメットには『現場代理人』・『監理技術者』と赤いシールが貼ってありますので、お気軽にお声をおかけください。

現場代理人

監理技術者

平成27年4月（予定）

1

平成25年度 21号坂祝BP大針地区道路建設工事



業者名	青協建設(株)
現場代理人	後藤 光幸
現場事務所	0574-42-8056
進捗率（3月末）	81.1%

5月からのお知らせ

PC橋工（PC桁架設）、橋梁附属物工を行う予定です。交通規制を行い主桁の架設を行う予定です。

4月の作業予定

橋台工（型枠・足場・コンクリート打設）、PC橋工、防草工を施工します。ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願い致します。



防草工

橋台工
PC橋工

工事用車両の表示オレンジ色です。



※現場事務所は坂祝町黒岩字宮前(加茂山団地駐車場内)にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

2

平成25年度 21号坂祝BP黒岩地区道路建設工事



業者名	(株) 栗山組
現場代理人	佐藤 卓也
現場事務所	0574-42-8640
進捗率（3月末）	100.0%

お知らせ

3月をもちまして当現場の工事が無事完了しました。地域の皆様方には約1年の長きに渡りご理解、ご協力ありがとうございました。

完 了

工事完了全景写真



町道黒岩5号線（4号函渠）



町道黒岩5号線（5号函渠）



4号函渠～工事起点側

平成27年 4月 (予定)

3

平成24年度 21号坂祝BP坂祝トンネル工事




業者名	三井住友建設(株)
現場代理人	西海 康弘
現場事務所	0574-23-0460
進捗率(3月末)	98.0%

5月からのお知らせ

5月は工事現場内の片付け作業になります。

4月の作業予定

4月は全体の仕上げ作業を行います。

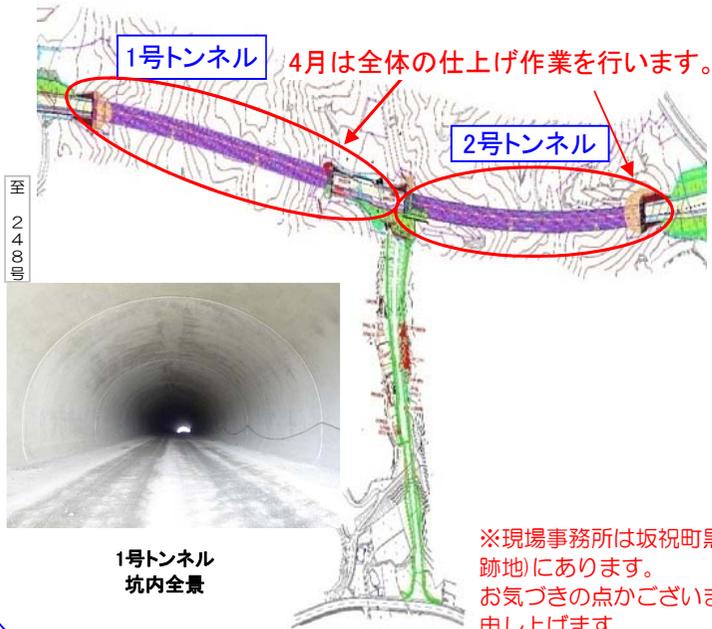

工事用車両の表示
は青色です。



※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

4

平成25年度 21号坂祝BP深萱東地区道路建設工事



業者名	北川工務(株)
現場代理人	奥村 嘉麿
現場事務所	0574-49-7199
進捗率(3月末)	100.0%

お知らせ

3月をもちまして、工事が完成しました。
皆様には、大変ご迷惑をお掛けしましたがご協力ありがとうございました。

完 了

工事完了全景写真



平成27年 4月 (予定)

5

平成26年度 21号坂祝BP道路建設工事



業者名	小池土木(株)
現場代理人	土田 裕紀
現場事務所	0574-25-6775
進捗率(3月末)	100.0%

お知らせ

3月をもちまして、工事が完了となりました。皆様のご理解、ご協力に心より感謝申し上げます。

完 了

工事完了全景写真



6

平成25年度 21号坂祝BP勝山IC橋下部工事

kuriyama

業者名	(株) 栗山組
現場代理人	桜井 正臣
現場事務所	0574-27-1335
進捗率(3月)	100.0%

お知らせ

3月をもちまして、全工事が完了しました。皆様のご理解・ご協力に心より感謝申し上げます。

完 了

工事完了全景写真



平成27年 4月（予定）

7

平成25年度21号坂祝BP勝山IC橋鋼上部工事

業者名	(株)アルス製作所
現場代理人	坂本 新太郎
現場事務所	0574-25-6840
進捗率（3月末）	87.2%
5月からのお知らせ	
5月は巻き立てコンクリート工の型枠を解体を行う予定です。	
4月の作業予定	
4月は現場塗装工・巻き立てコンクリート工の施工を行う予定です。	



町工事用車両の表示は紫色です。



※現場事務所は坂祝町酒倉にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

4月からの新工事のご紹介

	工 事 名	工事内容
1	平成26年度21号坂祝BP勝山深萱地区道路建設工事	一般土木工事
2	平成26年度21号坂祝BP大針黒岩地区道路建設工事	一般土木工事
3	平成26年度21号坂祝BP北部舗装工事	アスファルト舗装工事
4	平成26年度21号坂祝BPトンネル舗装工事	セメント・コンクリート舗装工事
5	平成26年度21号坂祝BPトンネル照明工事	電気設備工事
6	平成26年度21号坂祝BPトンネル防災設備工事	通信設備工事
