



# 国道21号線 坂祝バイパス工事のお知らせ

青葉若葉が目にしみるすがすがしい季節となりましたが、如何お過ごしでしょうか。

地域の皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。工事中ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ひきつづきご理解、ご協力の程お願い致します。

又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願い致します。

尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。**平成27年5月の工事予定**をお知らせ致します。

発注者



工務第二課 0572-25-8025

中央公民館にご意見箱を設置しています。  
各工事についてお気づきの点がございましたら、  
ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所  
にてご意見を承ります。




お知らせ  
国土交通省多治見砂防国道事務所HPを  
是非ご覧ください。


<http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogibp/>

多治見砂防国道事務所

検索



# 各工事範囲

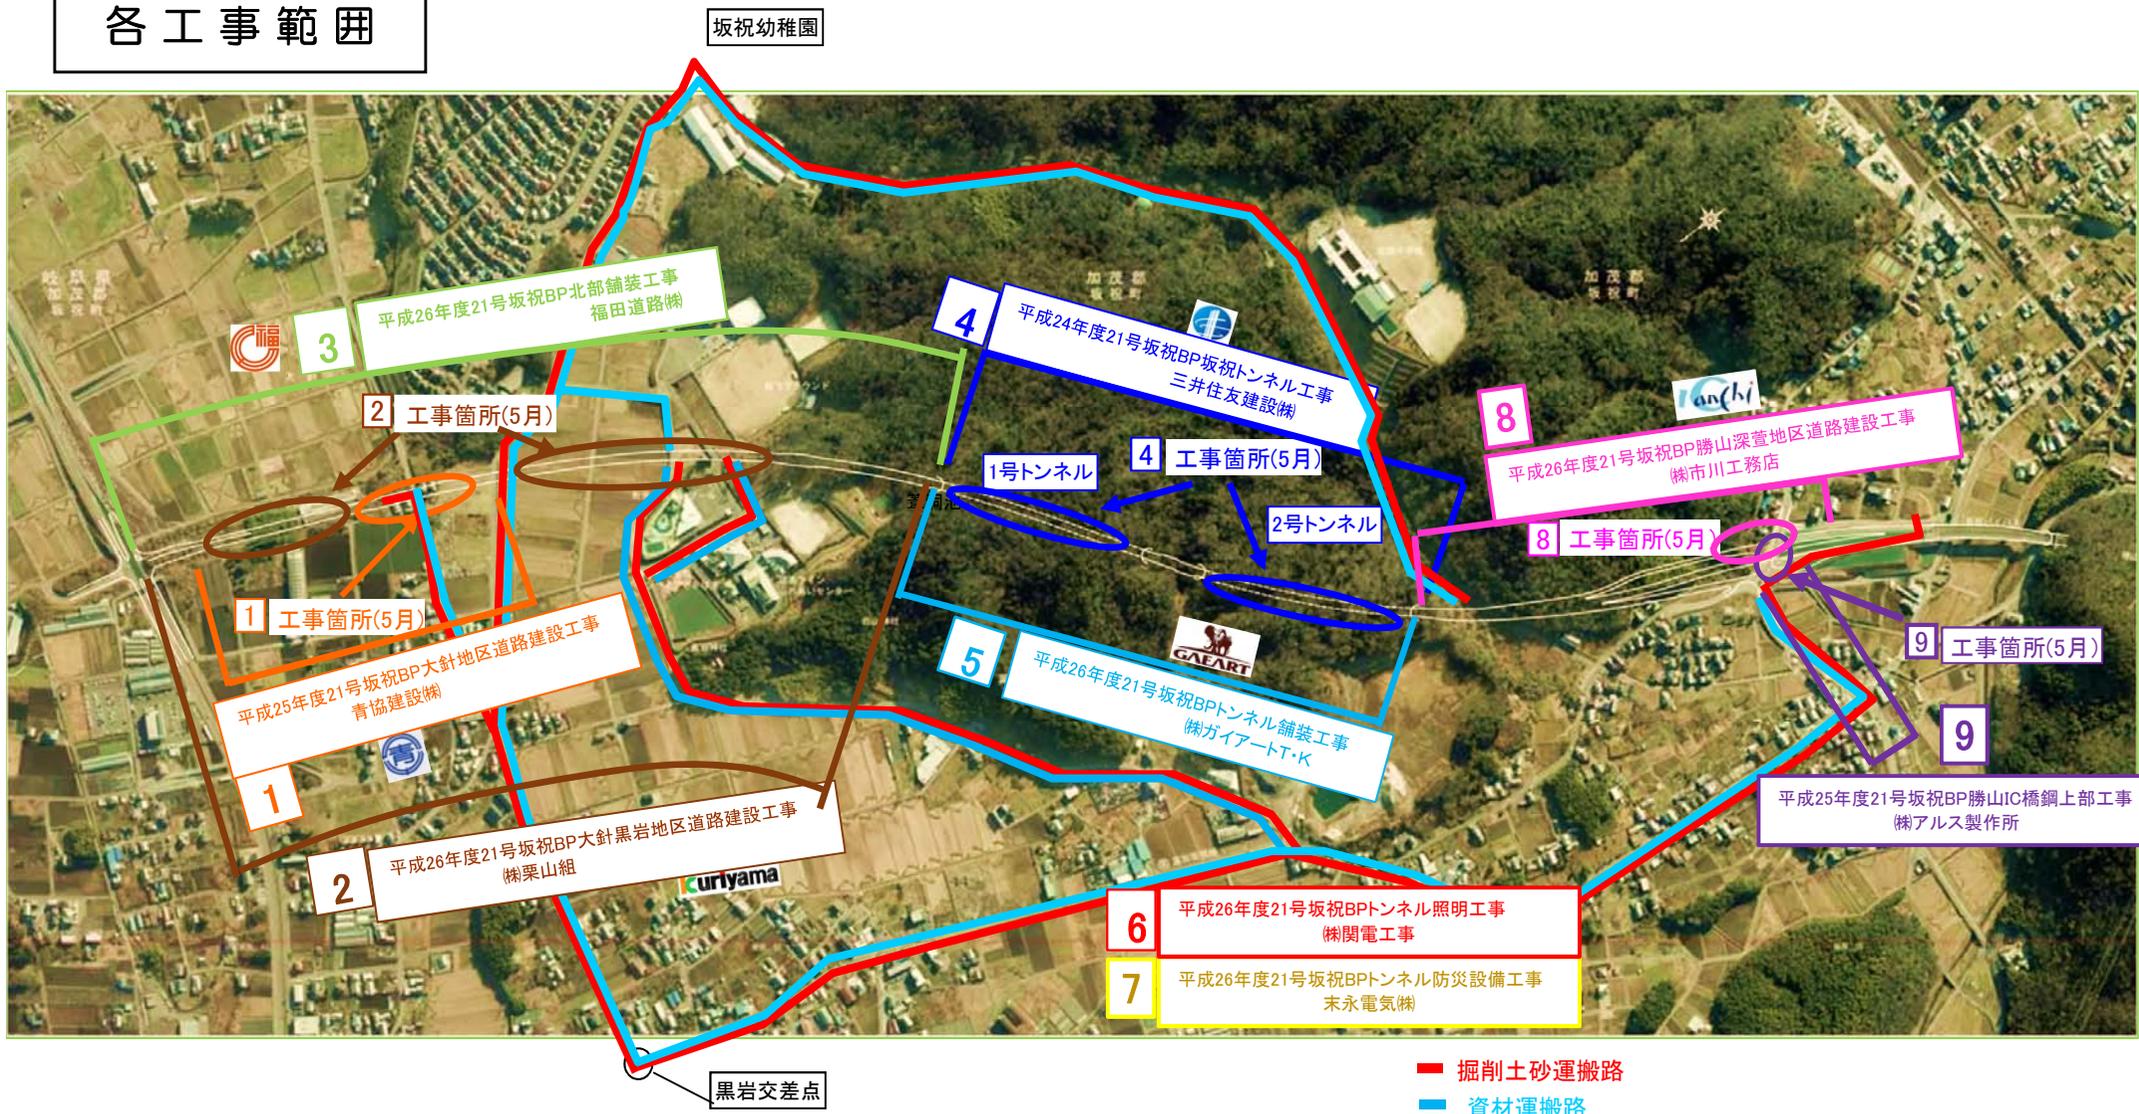

※各現場責任者のヘルメットには『現場代理人』・『監理技術者』と赤いシールが貼ってありますので、  
お気軽にお声をおかけください。

現場代理人

監理技術者

平成27年5月（予定）

1

平成25年度 21号坂祝BP大針地区道路建設工事



業者名	青協建設㈱
現場代理人	後藤 光幸
現場事務所	0574-42-8056
進捗率（4月末）	85.8%

6月からのお知らせ

PC橋工、橋梁附属物工を行う予定です。

5月の作業予定

黒岩橋上部工の架設、橋梁附属物工の施工を行います。  
5月11日より5月13日まで夜間通行止（時間規制）にて上部工の架設作業を行います。  
ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願い致します。



PC橋工  
橋梁附属物工

工事用車両の表示オレンジ色です。



※現場事務所は坂祝町黒岩字宮前(加茂山団地駐車場内)にあります。  
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

2

平成26年度 21号坂祝BP大針黒岩地区道路建設工



業者名	(株) 栗山組
現場代理人	林 浩
現場事務所	0574-42-8585
進捗率（4月末）	0.1%

6月からのお知らせ

5月の作業予定

5月より工事着手します。道路土工（路体盛土・路床盛土）の施工に伴い、盛土材料等の搬入のためダンプトラックが通行します。ご迷惑をお掛けしますが、ご協力よろしくお願い致します。



※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。  
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。



工事用車両の表示は白色です。

平成27年 5月（予定）

### 3 平成26年度 21号坂祝BP北部舗装工事



業者名	福田道路(株)
現場代理人	清水 一秋
現場事務所	0572-27-3445（準備期間中の仮事務所）
進捗率（4月末）	0.0%


#### ご挨拶

この度、平成26年度 21号坂祝BP北部舗装工事を受注しました福田道路㈱と申します。  
1号トンネルから国道248号までの区間の舗装を行います。国道248号線の交差点整備も施工予定です。

地元の皆様方にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご協力のほど宜しくお願い致します。

#### 5月の作業予定

事前の測量作業や各種調査（埋設物・架空線等）を行う予定です。

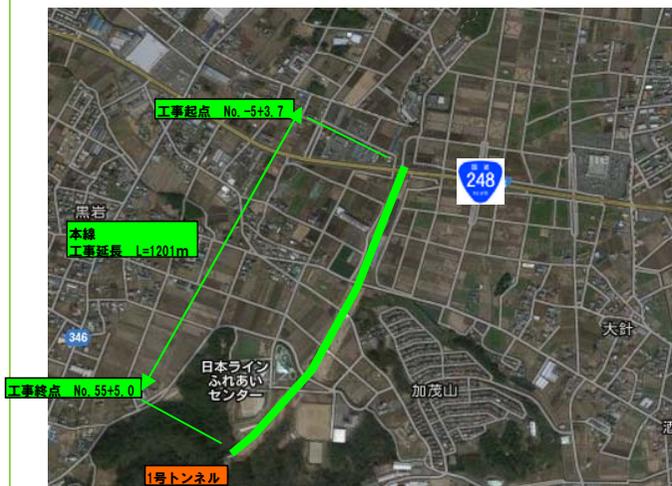

#### 【作業内容】

- ①1号トンネルから国道248号までの舗装工事
- ②21号坂祝バイパスと国道248号が交わる交差点整備

工事用車両の表示は黄緑色です。



※現場事務所は現場周辺に設置予定です。  
設置次第、改めて御連絡致します。



### 4 平成24年度 21号坂祝BP坂祝トンネル工事



業者名	三井住友建設(株)
現場代理人	西海 康弘
現場事務所	0574-23-0460
進捗率（4月末）	100.0%

#### 6月からのお知らせ

5月末をもちまして工事を完了いたします。

#### 5月の作業予定

5月は工事現場内の片付け作業になります。



工事用車両の表示は青色です。



※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。  
お気づきの点かございましたら御連絡お願い申し上げます。

平成27年 5月（予定）

5

### 平成26年度 21号坂祝BPトンネル舗装工事




業者名	㈱ガイアートT・K
現場代理人	田中 直巳
現場事務所	0583-82-6513
進捗率（4月末）	0.0%

#### 6月からのお知らせ

6月は、排水構造物工を予定しております。

#### 5月の作業予定

本工事はトンネル内を舗装（コンクリート）する工事です。工事中は何かとご迷惑をお掛け致しますが、細心の注意を払いつつ工事を進めて参りますので何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。5月は、工区範囲での準備工を予定しております。

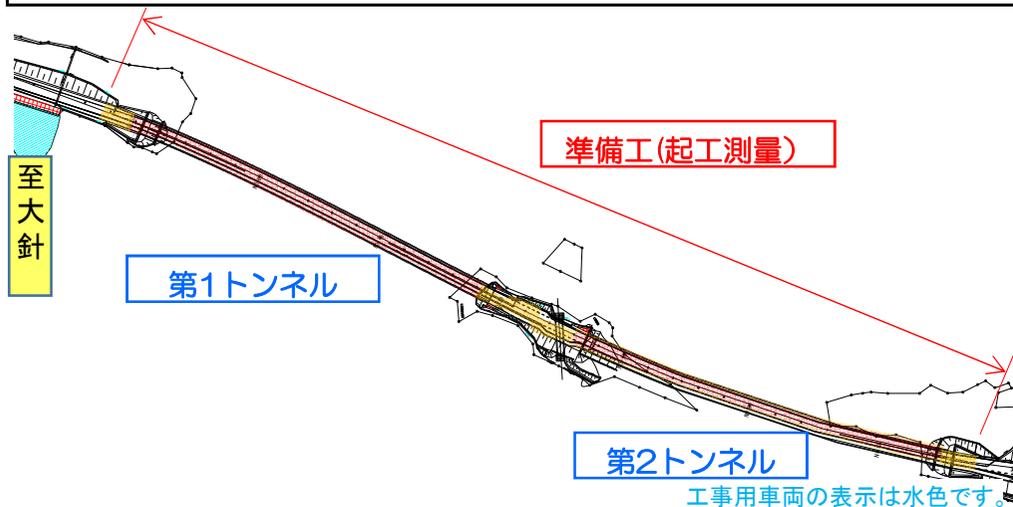

工事用車両の表示は水色です。

※（仮）現場事務所は、各務原市那加前洞にあります。



6

### 平成26年度 21号坂祝BPトンネル照明工事



業者名	㈱関電工事
現場代理人	永島 裕樹
現場事務所	未定
進捗率（4月末）	0.0%

#### 6月からのお知らせ

準備工

#### 5月の作業予定

準備工

本工事は道路照明及びトンネル照明を設置する工事です。安全には十分配慮し工事を行います。ご理解ご協力よろしく申し上げます。

工事用車両の表示は赤色です。



平成27年 5月（予定）


7

平成26年度 21号坂祝BPトンネル防災設備工事



業者名	末永電気(株)
現場代理人	成宮 義人
現場事務所	0585-22-2148（会社）
進捗率（4月末）	1.3%
6月からのお知らせ 準備工（工場にて機器製作を行う予定です。）	
5月の作業予定 準備工（機器仕様の詳細を設計する予定です。）	

本工事は道路トンネル内における災害発生時に通報及び警報表示させる設備を工事します。  
安全には十分配慮し工事を行います。  
ご理解ご協力よろしくお願いします。

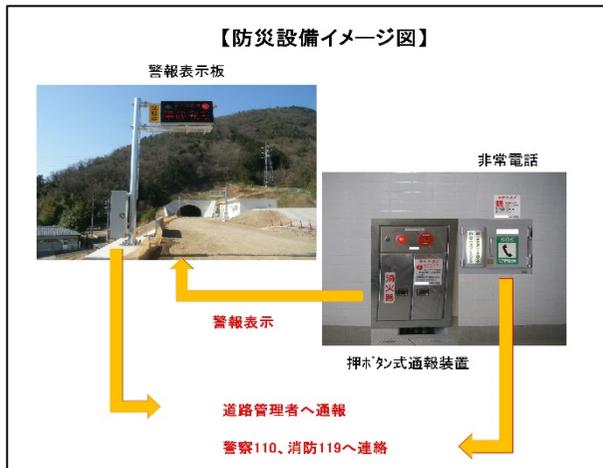

工事用車両の表示は黄色です。



8

平成26年度 21号坂祝BP勝山深萱地区道路建設工



業者名	(株)市川工務店
現場代理人	高木 広志
現場事務所	0574-28-3209
進捗率（4月末）	0.0%
6月からのお知らせ 場所打杭工、逆T擁壁工、地盤改良工、重力式擁壁工、路体の切盛土を行う予定です。	
5月の作業予定 5月より工事着手します。工事の施工に伴い、資機材等の搬入のため大型車両が通行します。ご迷惑をお掛けしますが、ご協力よろしくお願いします。	



工事用車両の表示はピンク色です。



※現場事務所は現場の西側(坂祝町深萱79-6)にあります。  
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

平成27年 5月 (予定)

9

平成25年度21号坂祝BP勝山IC橋鋼上部工事

業者名	(株)アルス製作所
現場代理人	坂本 新太郎
現場事務所	0574-25-6840
進捗率(4月末)	96.1%
6月からのお知らせ	
5月末をもちまして工事を完了いたします。	
5月の作業予定	
5月は巻立コンクリート型枠解体、工事現場内の片付け作業を行います。	



※現場事務所は坂祝町酒倉にあります。  
お気付きの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。
