



国道21号線 坂祝バイパス工事のお知らせ

本格的な暑さになってまいりましたが、如何お過ごしでしょうか。

地域の皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。工事中ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ひきつづきご理解、ご協力の程お願い致します。

又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願い致します。


尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。**平成27年7月の工事予定**をお知らせ致します。

発注者



工務第二課 0572-25-8025

中央公民館にご意見箱を設置しています。
各工事についてお気づきの点がございましたら、
ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所
にてご意見を承ります。




お知らせ
国土交通省多治見砂防国道事務所HPを
是非ご覧ください。


[http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/
r21/sakahogibp/](http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogibp/)

多治見砂防国道事務所

検索



各工事範囲

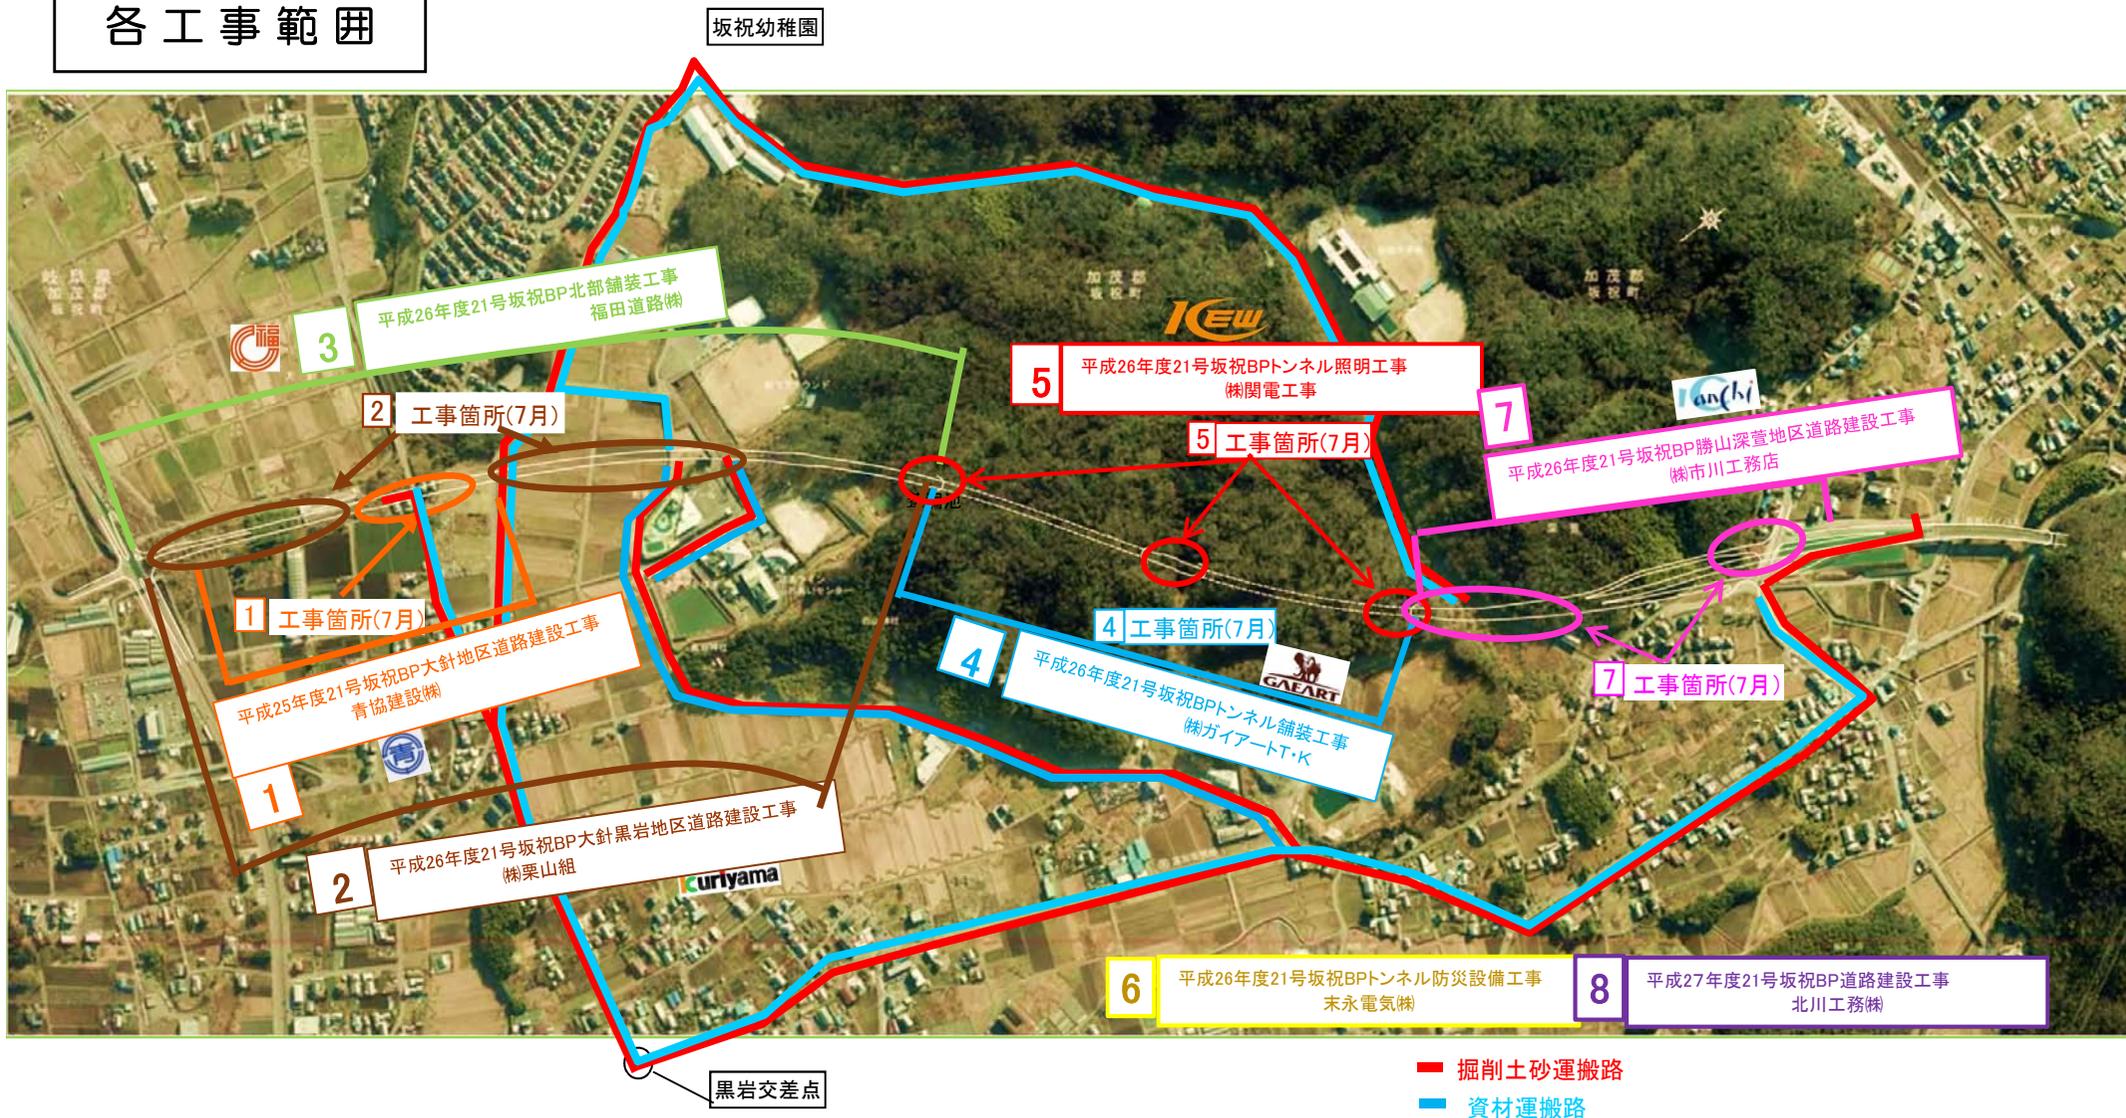

※各現場責任者のヘルメットには『現場代理人』・『監理技術者』と赤いシールが貼ってありますので、
お気軽にお声をおかけください。

現場代理人

監理技術者

平成27年 7月 (予定)

1

平成25年度 21号坂祝BP大針地区道路建設工事



業者名	青協建設(株)
現場代理人	後藤 光幸
現場事務所	0574-42-8056
進捗率(6月末)	99.0%

8月からのお知らせ

7月末をもちまして工事を完了いたします。

7月の作業予定

7月は工事現場内の片付け作業になります。
ご迷惑をお掛けしますがご理解、ご協力をよろしくお願い致します。



跡片付け

工事用車両の表示オレンジ色です。



※現場事務所は坂祝町黒岩字宮前(加茂山団地駐車場内)にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

2

平成26年度 21号坂祝BP大針黒岩地区道路建設工事



業者名	(株) 栗山組
現場代理人	林 浩
現場事務所	0574-42-8585
進捗率(6月末)	17.0%

8月からのお知らせ

引き続き、道路土工・調整池(C)・排水工の工事を行う予定です。

7月の作業予定

道路土工(路体盛土・路床盛土)調整池(C・E・F)の施工に伴い、材料等の搬入のためダンプトラック、生コン車が通行します。ご迷惑をお掛けしますが、ご協力よろしくお願い致します。



※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。



工事用車両の表示は白色です。

平成27年 7月（予定）

3 平成26年度 21号坂祝BP北部舗装工事



業者名	福田道路(株)
現場代理人	高木 大輔
現場事務所	0574-49-6351
進捗率（6月末）	3.0%

8月からのお知らせ

関係機関との調整が完了次第、国道248号と21号坂祝バイパスが接続される交差点付近での作業を予定しております。軟弱な地盤のセメント改良やアスファルト舗装がメインとなります。交通規制等が発生する場合は、現地に案内看板を設置し近隣の皆様や道路利用者の皆様に周知致します。

7月の作業予定

6月に引き続き、事前の測量作業や各種調査（埋設物・架空線等）、現場事務所開設等の準備工を実施予定です。



【作業内容】

- ①1号トンネルから国道248号までの舗装工事
- ②21号坂祝バイパスと国道248号が交わる交差点整備

工事用車両の表示は黄緑色です。



※現場事務所は6/22（月）より開設致します。
場所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)です。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。



4 平成26年度 21号坂祝BPトンネル舗装工事




業者名	㈱ガイアートT・K
現場代理人	田中 直巳
現場事務所	0574-49-6031
進捗率（6月末）	8.0%

8月からのお知らせ

8月は、引き続き排水工・情報管路工・電線管路工を予定しております。

7月の作業予定

6月より引き続き、2号トンネルから1号トンネルに向かって、排水工（円形水路）の作業を行います。
また、7月中旬より情報管路・電線管路の管路布設作業を行います。

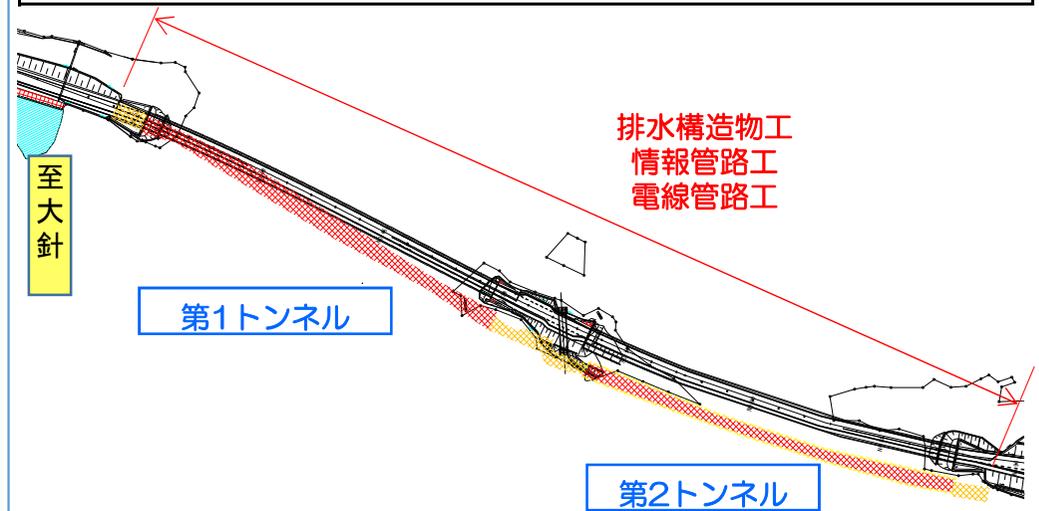

工事用車両の表示は水色です。



※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)に設置しました。
お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。

至勝山

平成27年 7月 (予定)


5

平成26年度 21号坂祝BPトンネル照明工事



業者名	(株)関電工事
現場代理人	永島 裕樹
現場事務所	未定
進捗率(6月末)	3.0%
8月からのお知らせ	
8月は7月に引き続きトンネルの測量と照明灯基礎工事を行う予定です。	
7月の作業予定	
7月はトンネルの測量と照明灯基礎工事を行う予定です。	

本工事は道路照明及びトンネル照明を設置する工事です。安全には十分配慮し工事をを行います。ご理解ご協力よろしくお願いします。

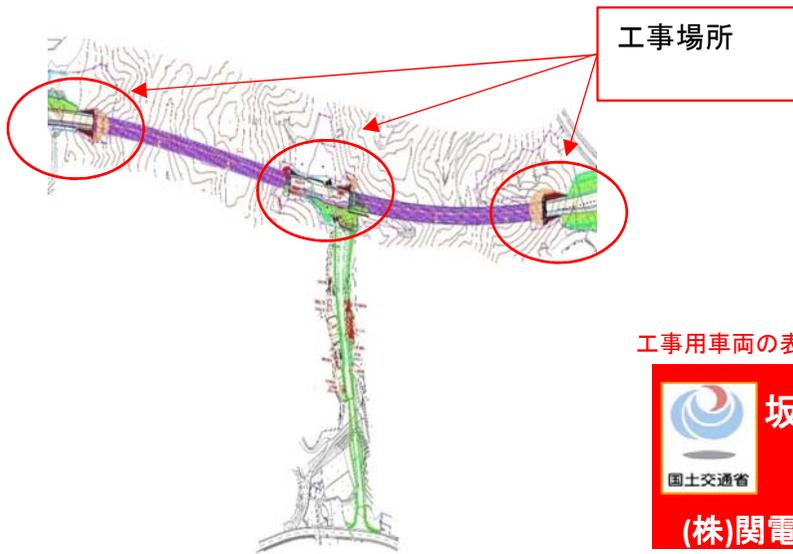

工事用車両の表示は赤色です。

6

平成26年度 21号坂祝BPトンネル防災設備工事



業者名	末永電気(株)
現場代理人	成宮 義人
現場事務所	0585-22-2148 (会社)
進捗率(6月末)	15.8%
8月からのお知らせ	
準備工(工場にて機器製作を行っています)	
7月の作業予定	
準備工(工場にて機器製作を行っています)	

本工事は道路トンネル内における災害発生時に通報及び警報表示させる設備を工事します。安全には十分配慮し工事をを行います。ご理解ご協力よろしくお願いします。



工事用車両の表示は黄色です。



平成27年 7月 (予定)

7

平成26年度 21号坂祝BP勝山深萱地区道路建設工



業者名	㈱市川工務店
現場代理人	高木 広志
現場事務所	0574-28-3209
進捗率(6月末)	17.4%

8月からのお知らせ
擁壁工、床版工、路体盛土工、地盤改良工を行う予定です。

7月の作業予定
擁壁工、床版工、路体盛土工を行います。工事に伴い、町道(深萱取組線)を片側交互通行にて切廻しています。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力をよろしくお願い致します。



工事用車両の表示はピンク色です。

※現場事務所は現場の西側(坂祝町深萱79-6)にあります。お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。



8

平成27年度21号坂祝BP道路建設工事



業者名	北川工務㈱
現場代理人	北川 豊将
現場事務所	決定次第記載します。
進捗率(6月末)	—

8月からのお知らせ
準備工

7月の作業予定
準備工

本工事は坂祝バイパス全線にて土工、擁壁工、道路付属施設工等を行う工事です。工期は6月16日から来年の2月29日までとなります。工事中ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ご理解、ご協力の程お願い致します。

工事用車両の表示は紫色です。

