



国道21号線 坂祝バイパス工事のお知らせ

うだるような暑さが続いておりますが、如何お過ごしでしょうか。

地域の皆様には日頃から、坂祝バイパス工事にご理解とご協力を頂きありがとうございます。工事中ご迷惑をお掛けしますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工いたしますので、ひきつづきご理解、ご協力の程お願い致します。

又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解賜りますようお願い致します。

尚、なにかお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく申し付け下さい。**平成27年8月の工事予定**をお知らせ致します。

発注者



工務第二課 0572-25-8025

中央公民館にご意見箱を設置しています。
各工事についてお気づきの点がございましたら、
ご意見箱に投函していただくか、各現場事務所
にてご意見を承ります。




お知らせ

国土交通省多治見砂防国道事務所HPを
是非ご覧ください。


[http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/
r21/sakahogibp/](http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/road/progress/r21/sakahogibp/)

多治見砂防国道事務所

検索



各工事範囲

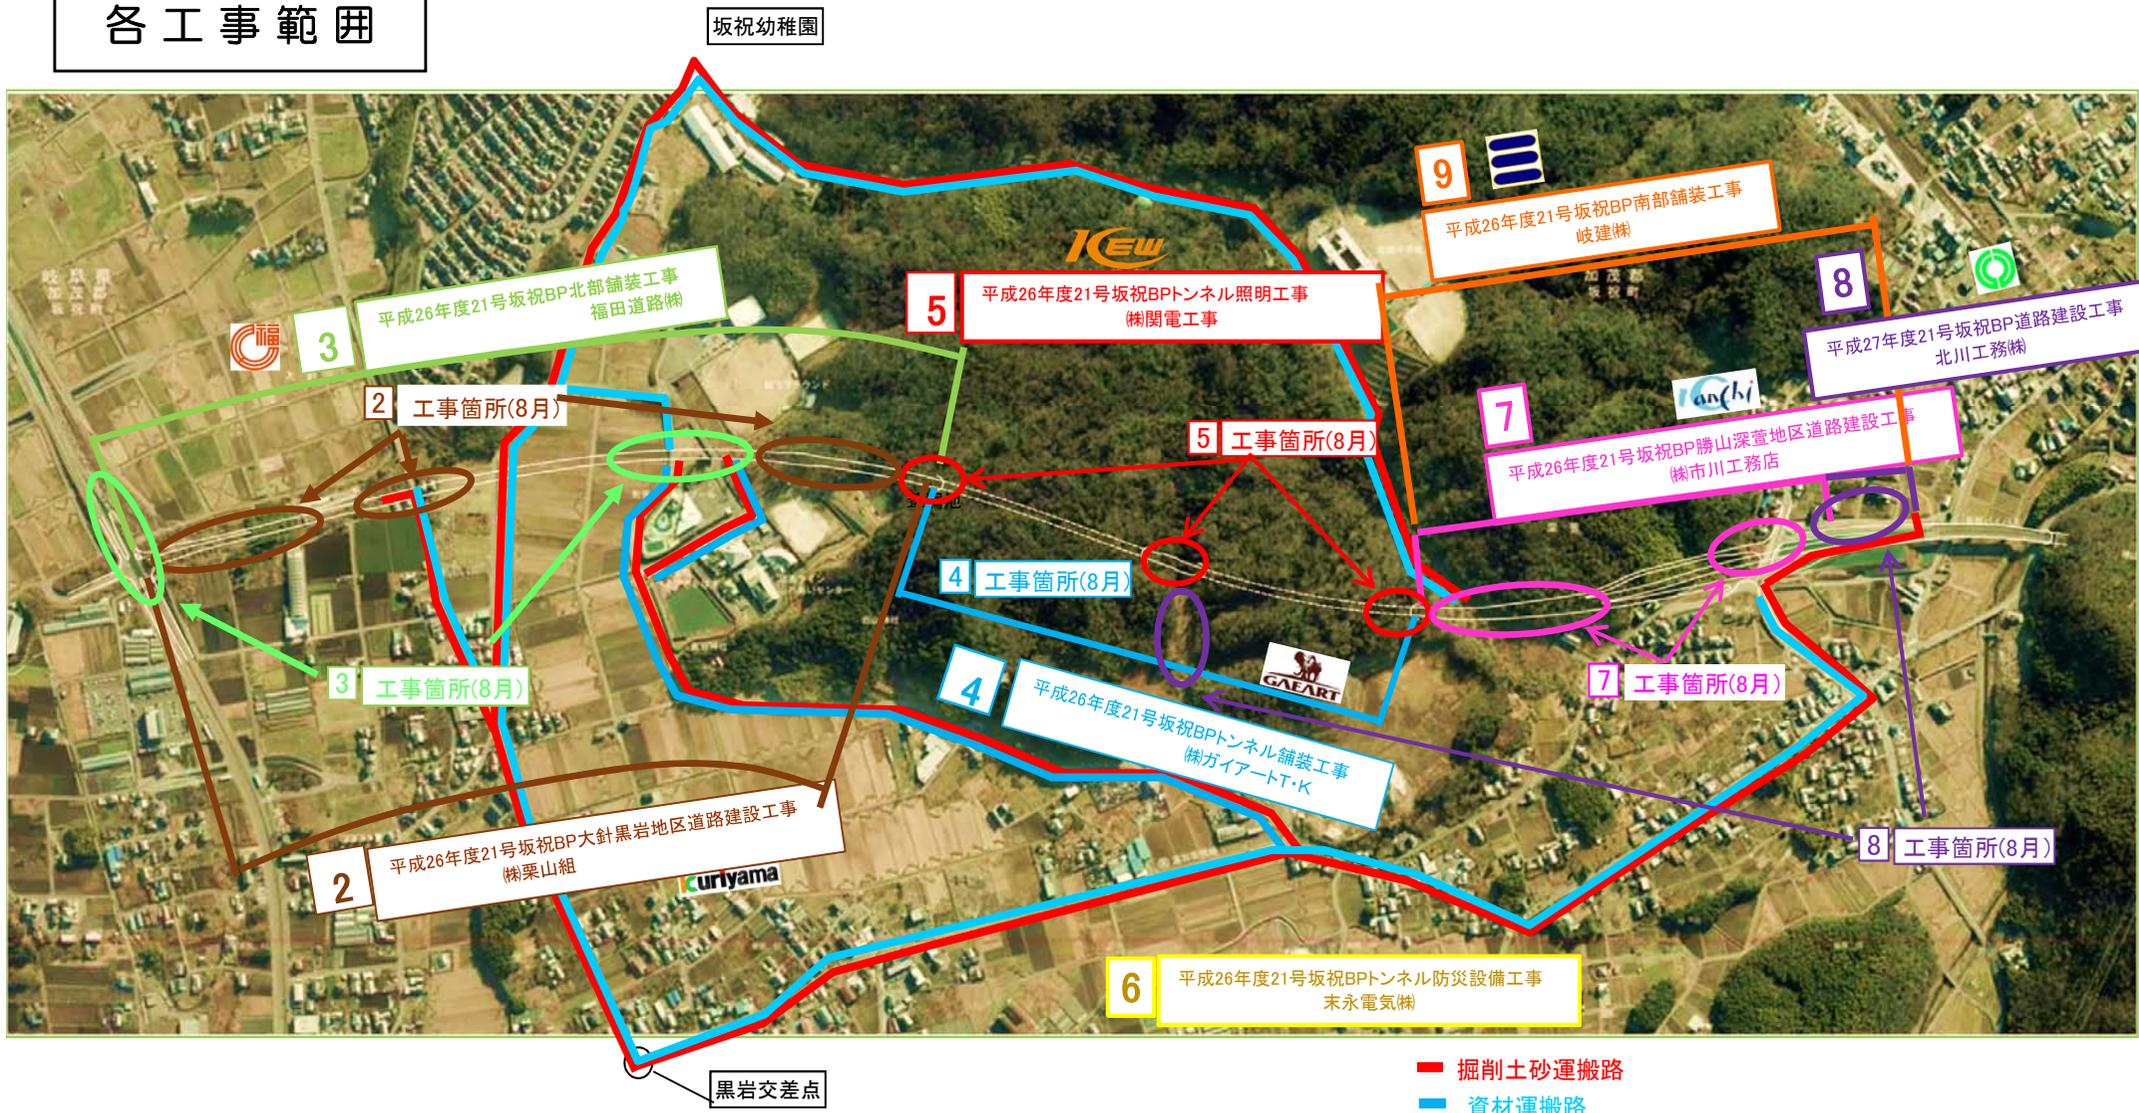

※各現場責任者のヘルメットには『現場代理人』・『監理技術者』と赤いシールが貼ってありますので、
お気軽にお声をおかけください。

現場代理人

監理技術者

平成27年 8月 (予定)

1

平成25年度 21号坂祝BP大針地区道路建設工事



業者名	青協建設㈱
現場代理人	後藤 光幸
現場事務所	0574-42-8056
進捗率 (7月末)	100.0%

お知らせ
 おかげさまで7月をもちまして当現場の工事が無事完了しました。地域の皆様方のご理解、ご協力ありがとうございました。

完了



黒岩橋
全景

2

平成26年度 21号坂祝BP大針黒岩地区道路建設工事



業者名	(株) 栗山組
現場代理人	林 浩
現場事務所	0574-42-8585
進捗率 (7月末)	37.6%

9月からのお知らせ
 引き続き、道路土工（坂祝プール南側の丘陵地から橋台部付近へ土砂運搬）・擁壁工・調整池(C)・排水工の工事を行う予定です。

8月の作業予定
 道路土工（路床盛土）地盤改良・擁壁工 排水工 調整池（C）の施工に伴い、材料等の搬入のためダンプトラック、生コン車が通行します。ご迷惑をお掛けしますが、ご協力よろしくお願いいたします。
 ※ 町道黒岩72号線は、8月より3か月間一部全面通行止を予定しています。



※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。
 お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。



工事用車両の表示は白色です。

平成27年 8月（予定）

3 平成26年度 21号坂祝BP北部舗装工事



業者名	福田道路(株)
現場代理人	高木 大輔
現場事務所	0574-49-6351
進捗率（7月末）	4.0%

9月からのお知らせ

9月は引き続き、国道248号での交差点整備と21号坂祝バイパス本線の作業を予定しています。特に国道248号の作業に伴い交通の切り回しを行います。現地での案内看板に従い、注意して通行願います。

8月の作業予定

21号坂祝バイパスと国道248号が交わる交差点整備と21号坂祝バイパスの本線部分の排水構造物等の施工を行います。作業に伴って交通の切り回しを行います。現地での案内看板に従い、注意して通行願います。



【作業内容】

- ①21号坂祝バイパス本線において情報管路と排水構造物の設置
- ②国道248号交差点整備において地盤の改良と舗装工事

工事用車両の表示は黄緑色です。



4 平成26年度 21号坂祝BPTunnel舗装工事




業者名	㈱ガイアートT・K
現場代理人	田中 直巳
現場事務所	0574-49-6031
進捗率（7月末）	20.0%

9月からのお知らせ

情報管路・電線管路の作業完了後、トンネル内のコンクリート舗装準備作業を行います。また、1号トンネル大針側におきまして、沈澱槽設置作業を予定しています。

8月の作業予定

1号トンネルから2号トンネル間の排水構造物完了後、縁石工の作業を行います。7月中旬より作業開始した、情報管路・電線管路の作業を引き続き行います。

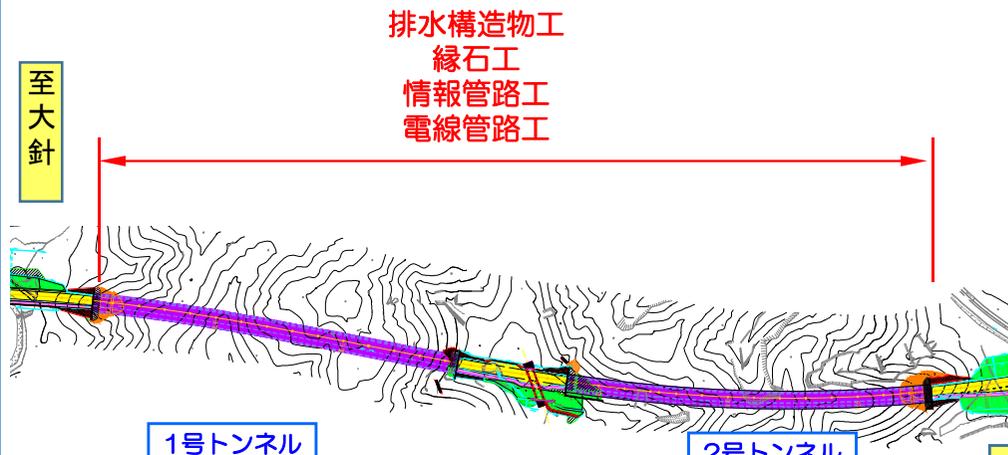

工事用車両の表示は水色です



※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)にあります。お気づきの点ございましたら御連絡お願い申し上げます。

平成27年 8月（予定）


5

平成26年度 21号坂祝BPTンネル照明工事



業者名	㈱関電工事
現場代理人	永島 裕樹
現場事務所	0561-84-3022（会社）
進捗率（7月末）	6.1%
9月からのお知らせ	
9月は照明灯基礎工事を行う予定です。	
8月の作業予定	
8月はトンネルの測量と照明灯基礎工事を行う予定です。	

本工事は道路照明及びトンネル照明を設置する工事です。安全には十分配慮し工事をを行います。ご理解ご協力よろしくお願いします。

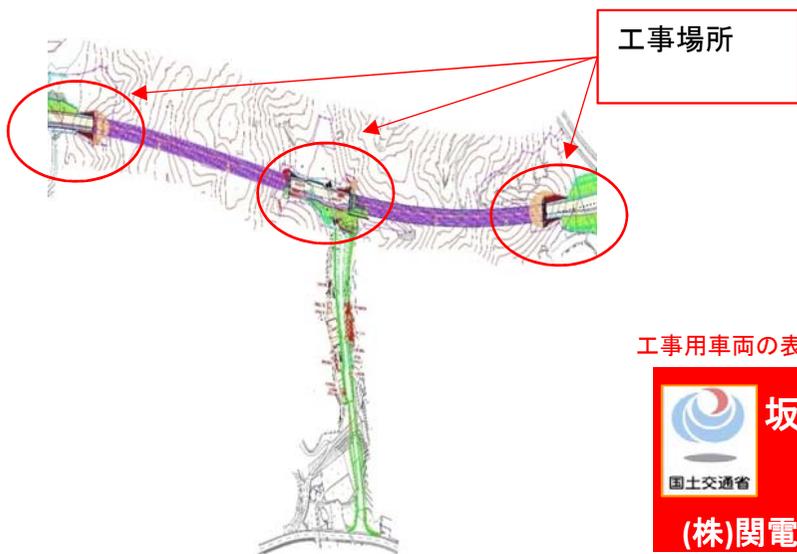

工事用車両の表示は赤色です。


6

平成26年度 21号坂祝BPTンネル防災設備工事



業者名	末永電気㈱
現場代理人	成宮 義人
現場事務所	0585-22-2148（会社）
進捗率（7月末）	29.2%
9月からのお知らせ	
準備工（工場にて機器製作を行っています）	
8月の作業予定	
準備工（工場にて機器製作を行っています）	

本工事は道路トンネル内における災害発生時に通報及び警報表示させる設備を工事します。安全には十分配慮し工事をを行います。ご理解ご協力よろしくお願いします。

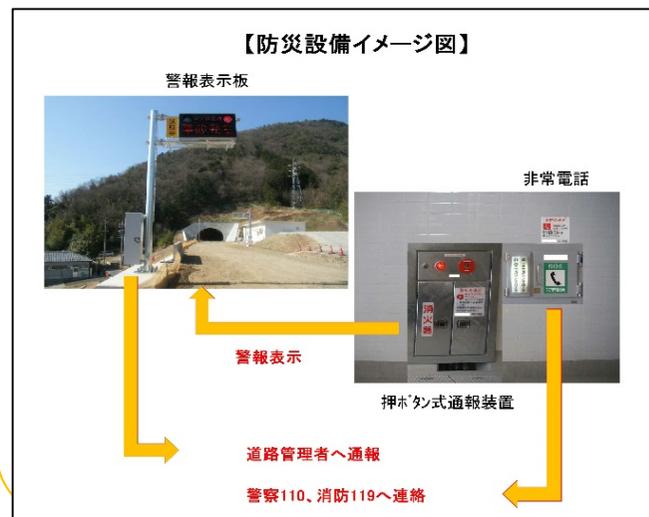

工事用車両の表示は黄色です。



平成27年 8月（予定）

7

平成26年度 21号坂祝BP勝山深萱地区道路建設工



業者名	(株)市川工務店
現場代理人	高木 広志
現場事務所	0574-28-3209
進捗率（7月末）	33.0%

9月からのお知らせ

擁壁工、床版工、路体盛土工、路床盛土工を行う予定です。

8月の作業予定

擁壁工、床版工、路体盛土工、地盤改良工を行います。工事に伴い、町道(深萱取組線)を片側交互通行にて切廻しています。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力をよろしくお願い致します。



工事用車両の表示はピンク色です。

※現場事務所は現場の西側(坂祝町深萱79-6)にあります。お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。



8

平成27年度21号坂祝BP道路建設工事



業者名	北川工務(株)
現場代理人	北川 豊将
現場事務所	0574-49-6223
進捗率（7月末）	2.0%

9月からのお知らせ

引続き擁壁工の施工、新たに法面工、盛土工を行う予定です。

8月の作業予定

工事用道路の撤去、益明けより擁壁工の掘削を予定します。



工事用車両の表示は紫色です。

※現場事務所は町営住宅の南側(坂祝町勝山306-3)にあります。お気づきの点がございましたら御連絡お願い申し上げます。



平成27年 8月 (予定)

9

平成27年度 21号坂祝BP南部舗装工事



業者名	岐建(株)
現場代理人	星野 智早
現場事務所	0584-81-2126 (会社)
進捗率 (7月末)	0.0%
9月からのお知らせ 9月上旬から第2トンネル～鶴沼方面へ200m程度の工区を着工予定です。	
8月の作業予定 事前の測量作業や各種調査、現場事務所開設等の準備工を実施予定です。	



※現場事務所は坂祝町黒岩字前山(坂祝産業跡地)に設置予定です。
